



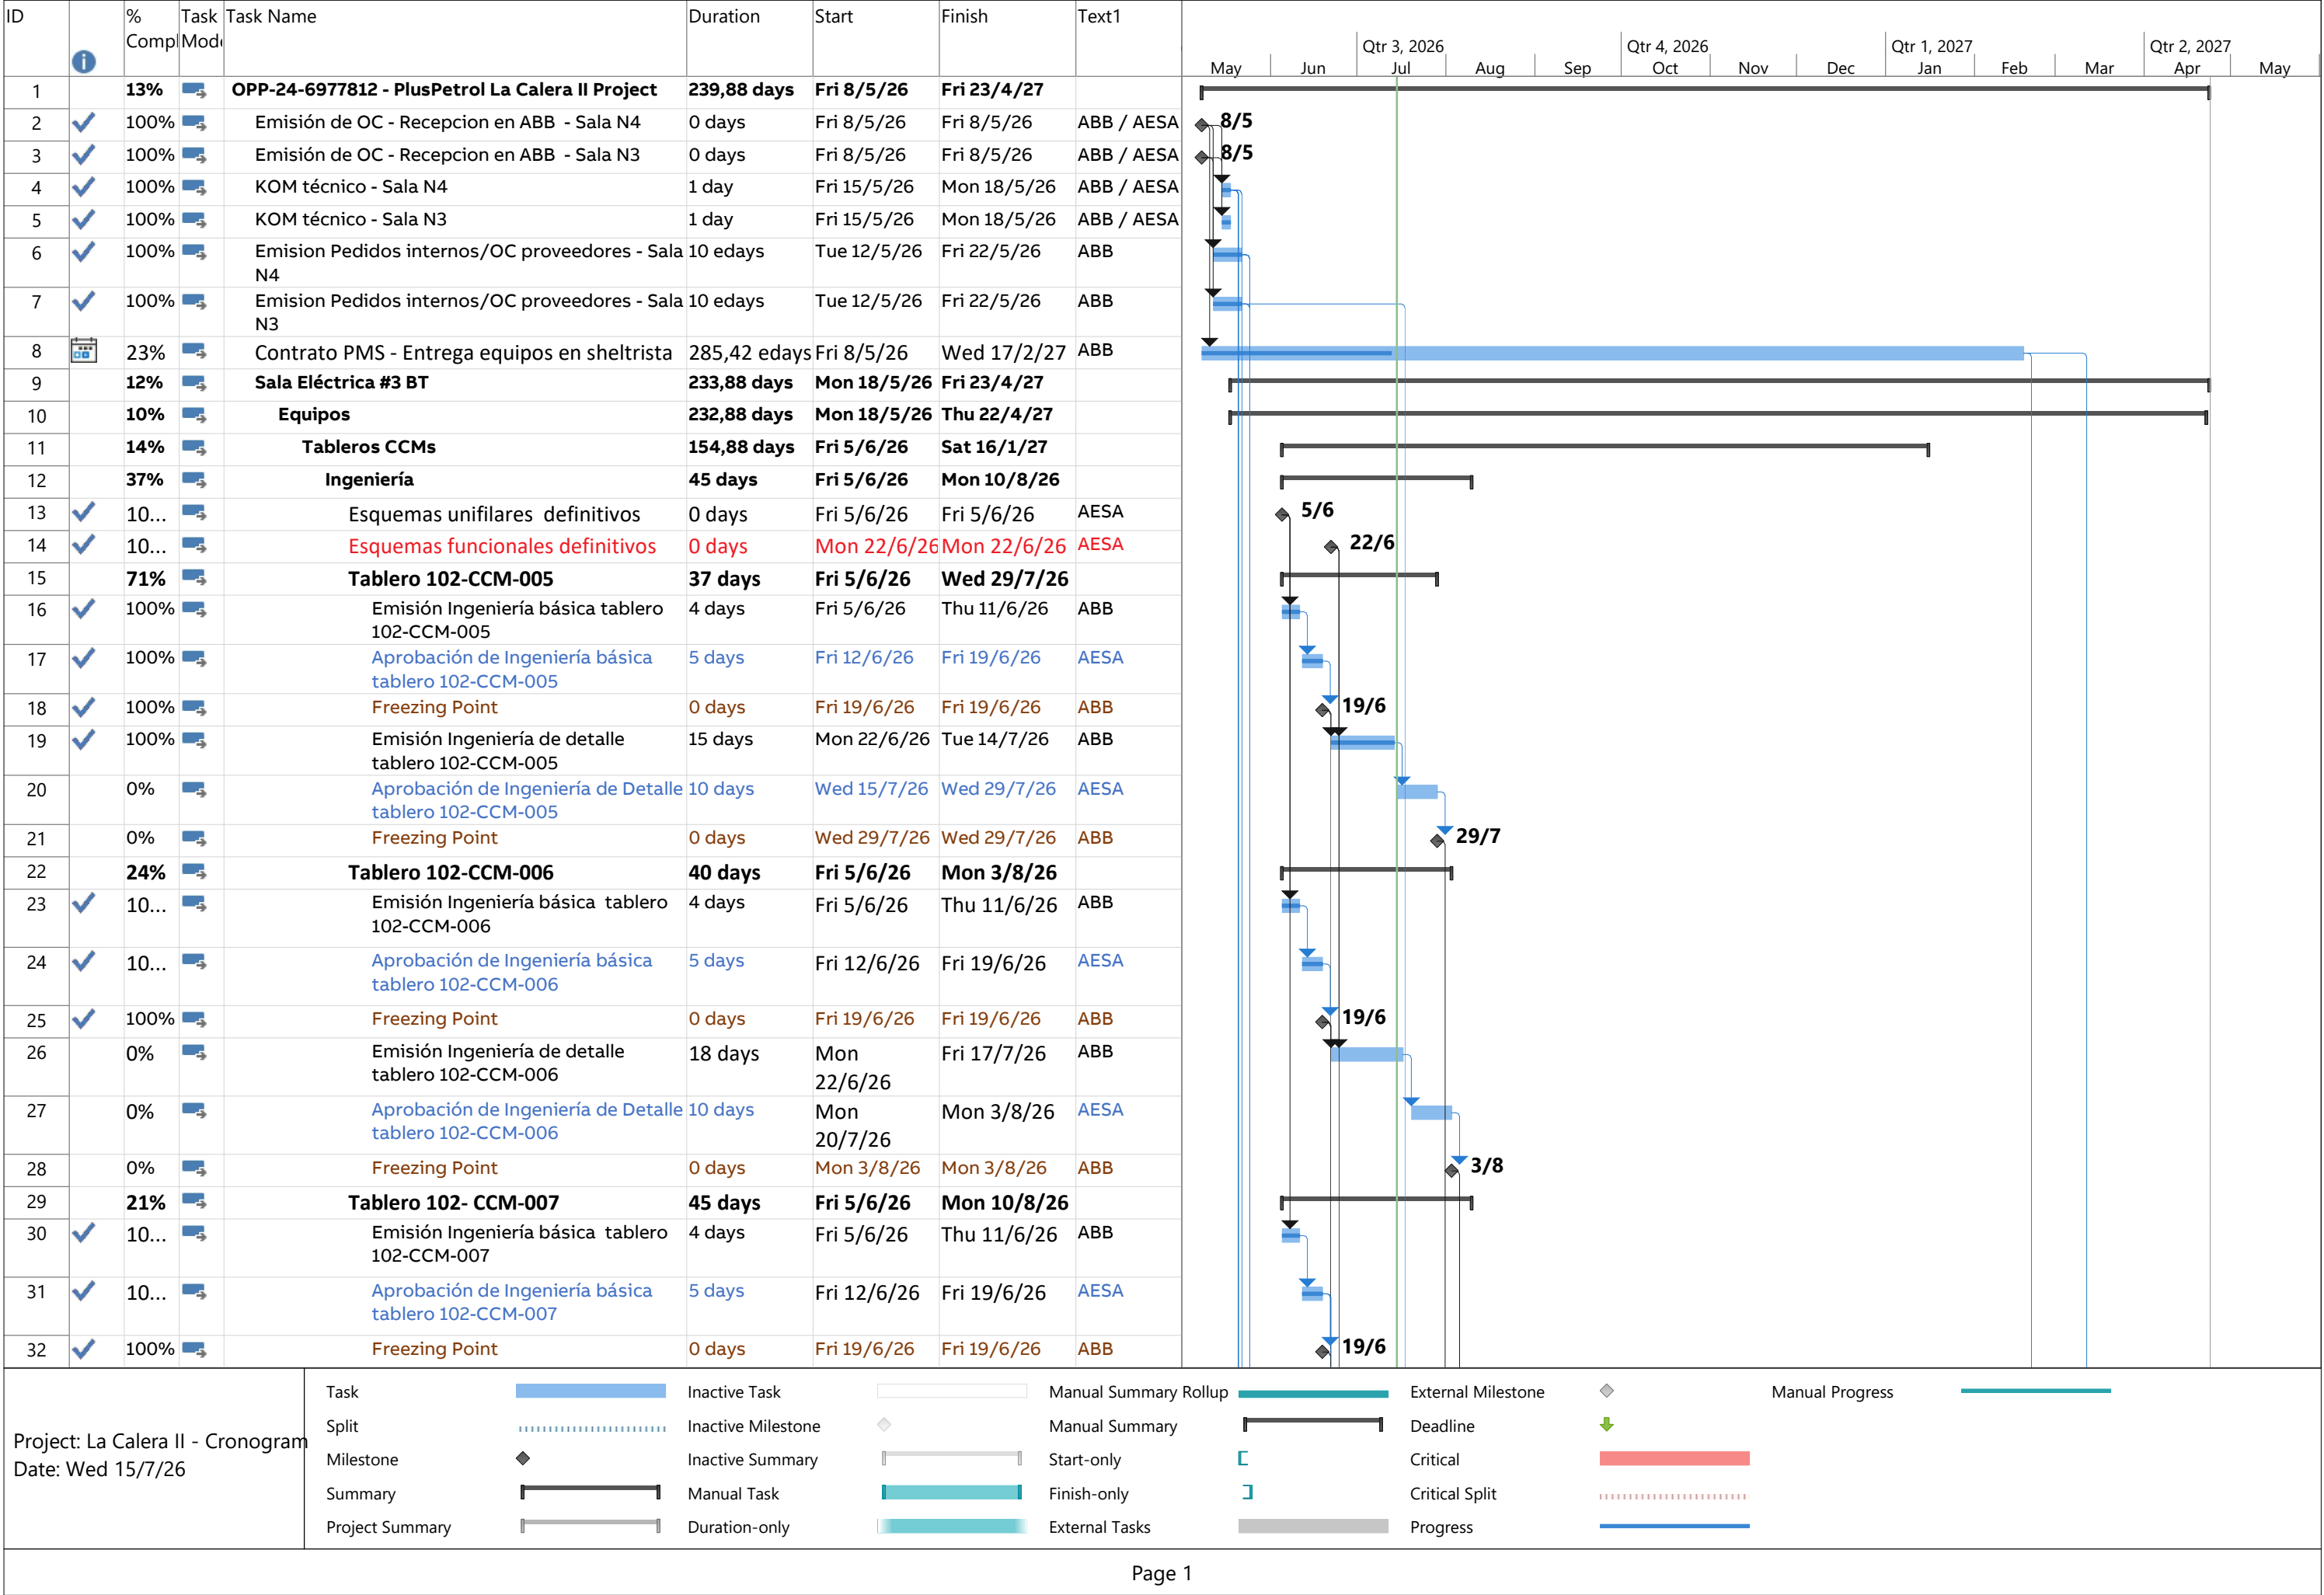

Page 1

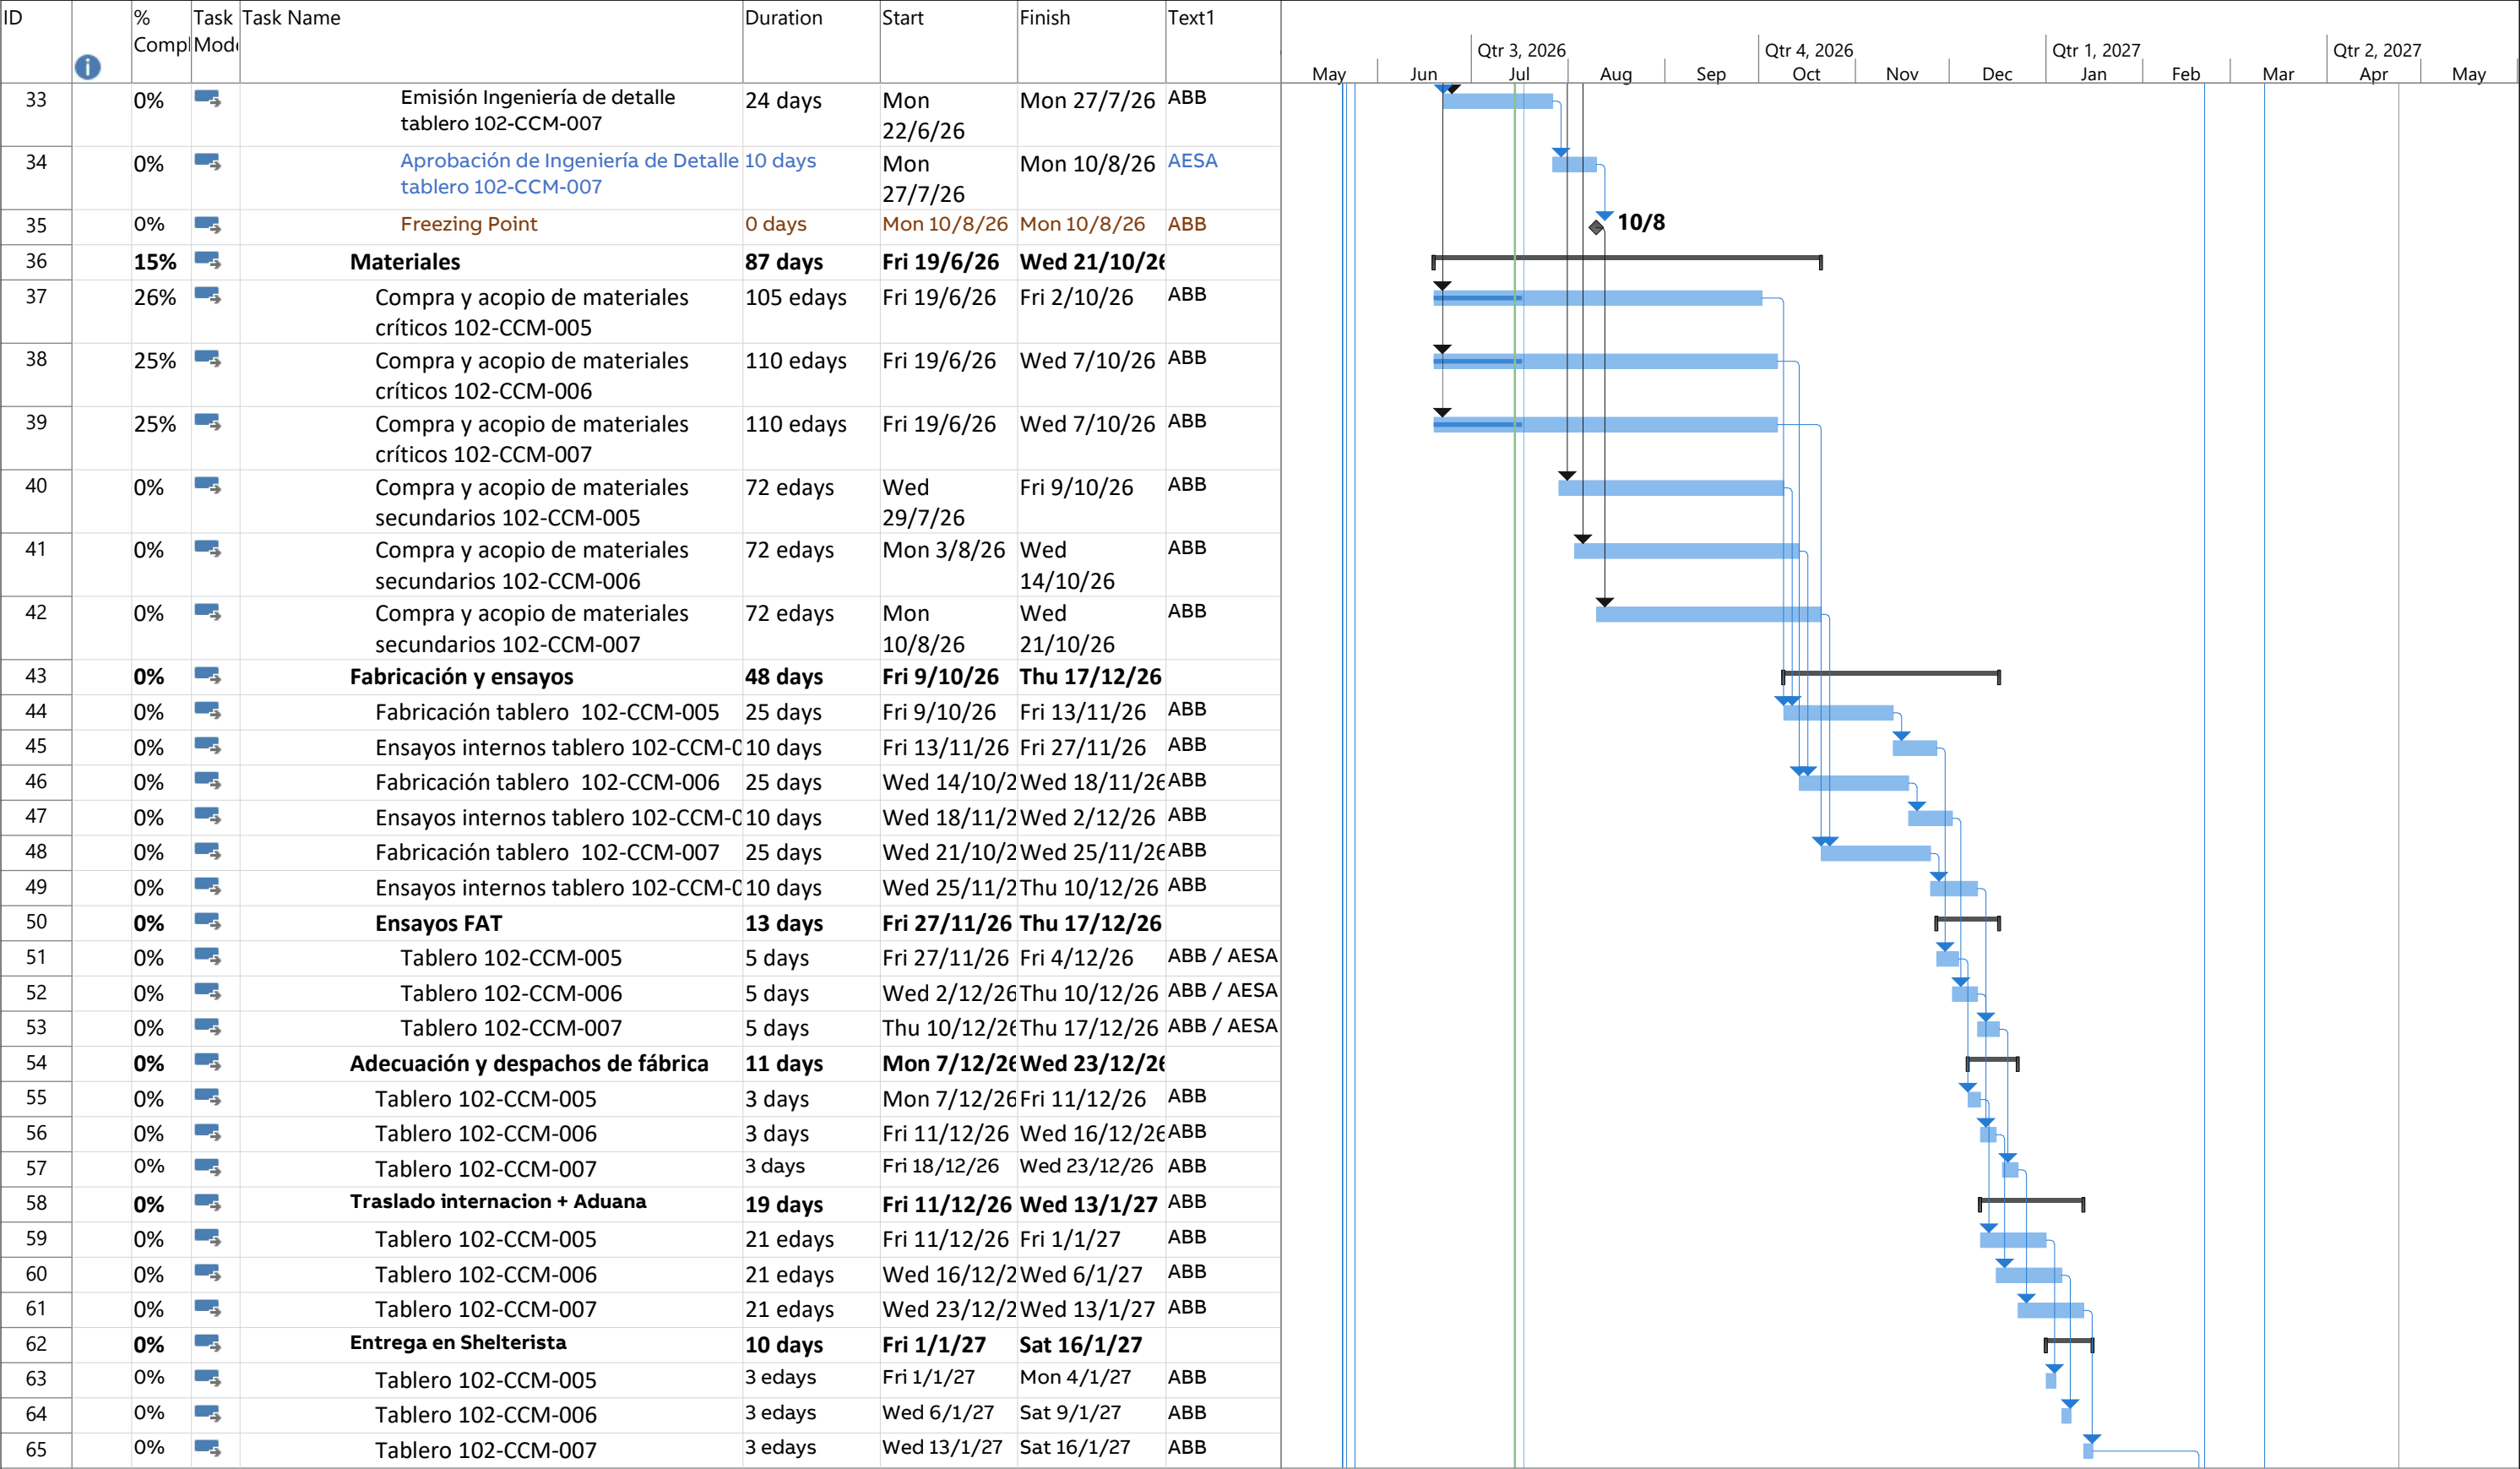

Project: La Calera II - Cronogram

Date: Wed 15/7/26

Task

Inactive Task

Manual Summary Rollup

External Milestone

Manual Progress

Split

Inactive Milestone

Manual Summary

Deadline

Milestone

Inactive Summary

Start-only

Critical

Summary

Manual Task

Finish-only

Critical Split


Project Summary

Duration-only

External Tasks


Progress

Page 2

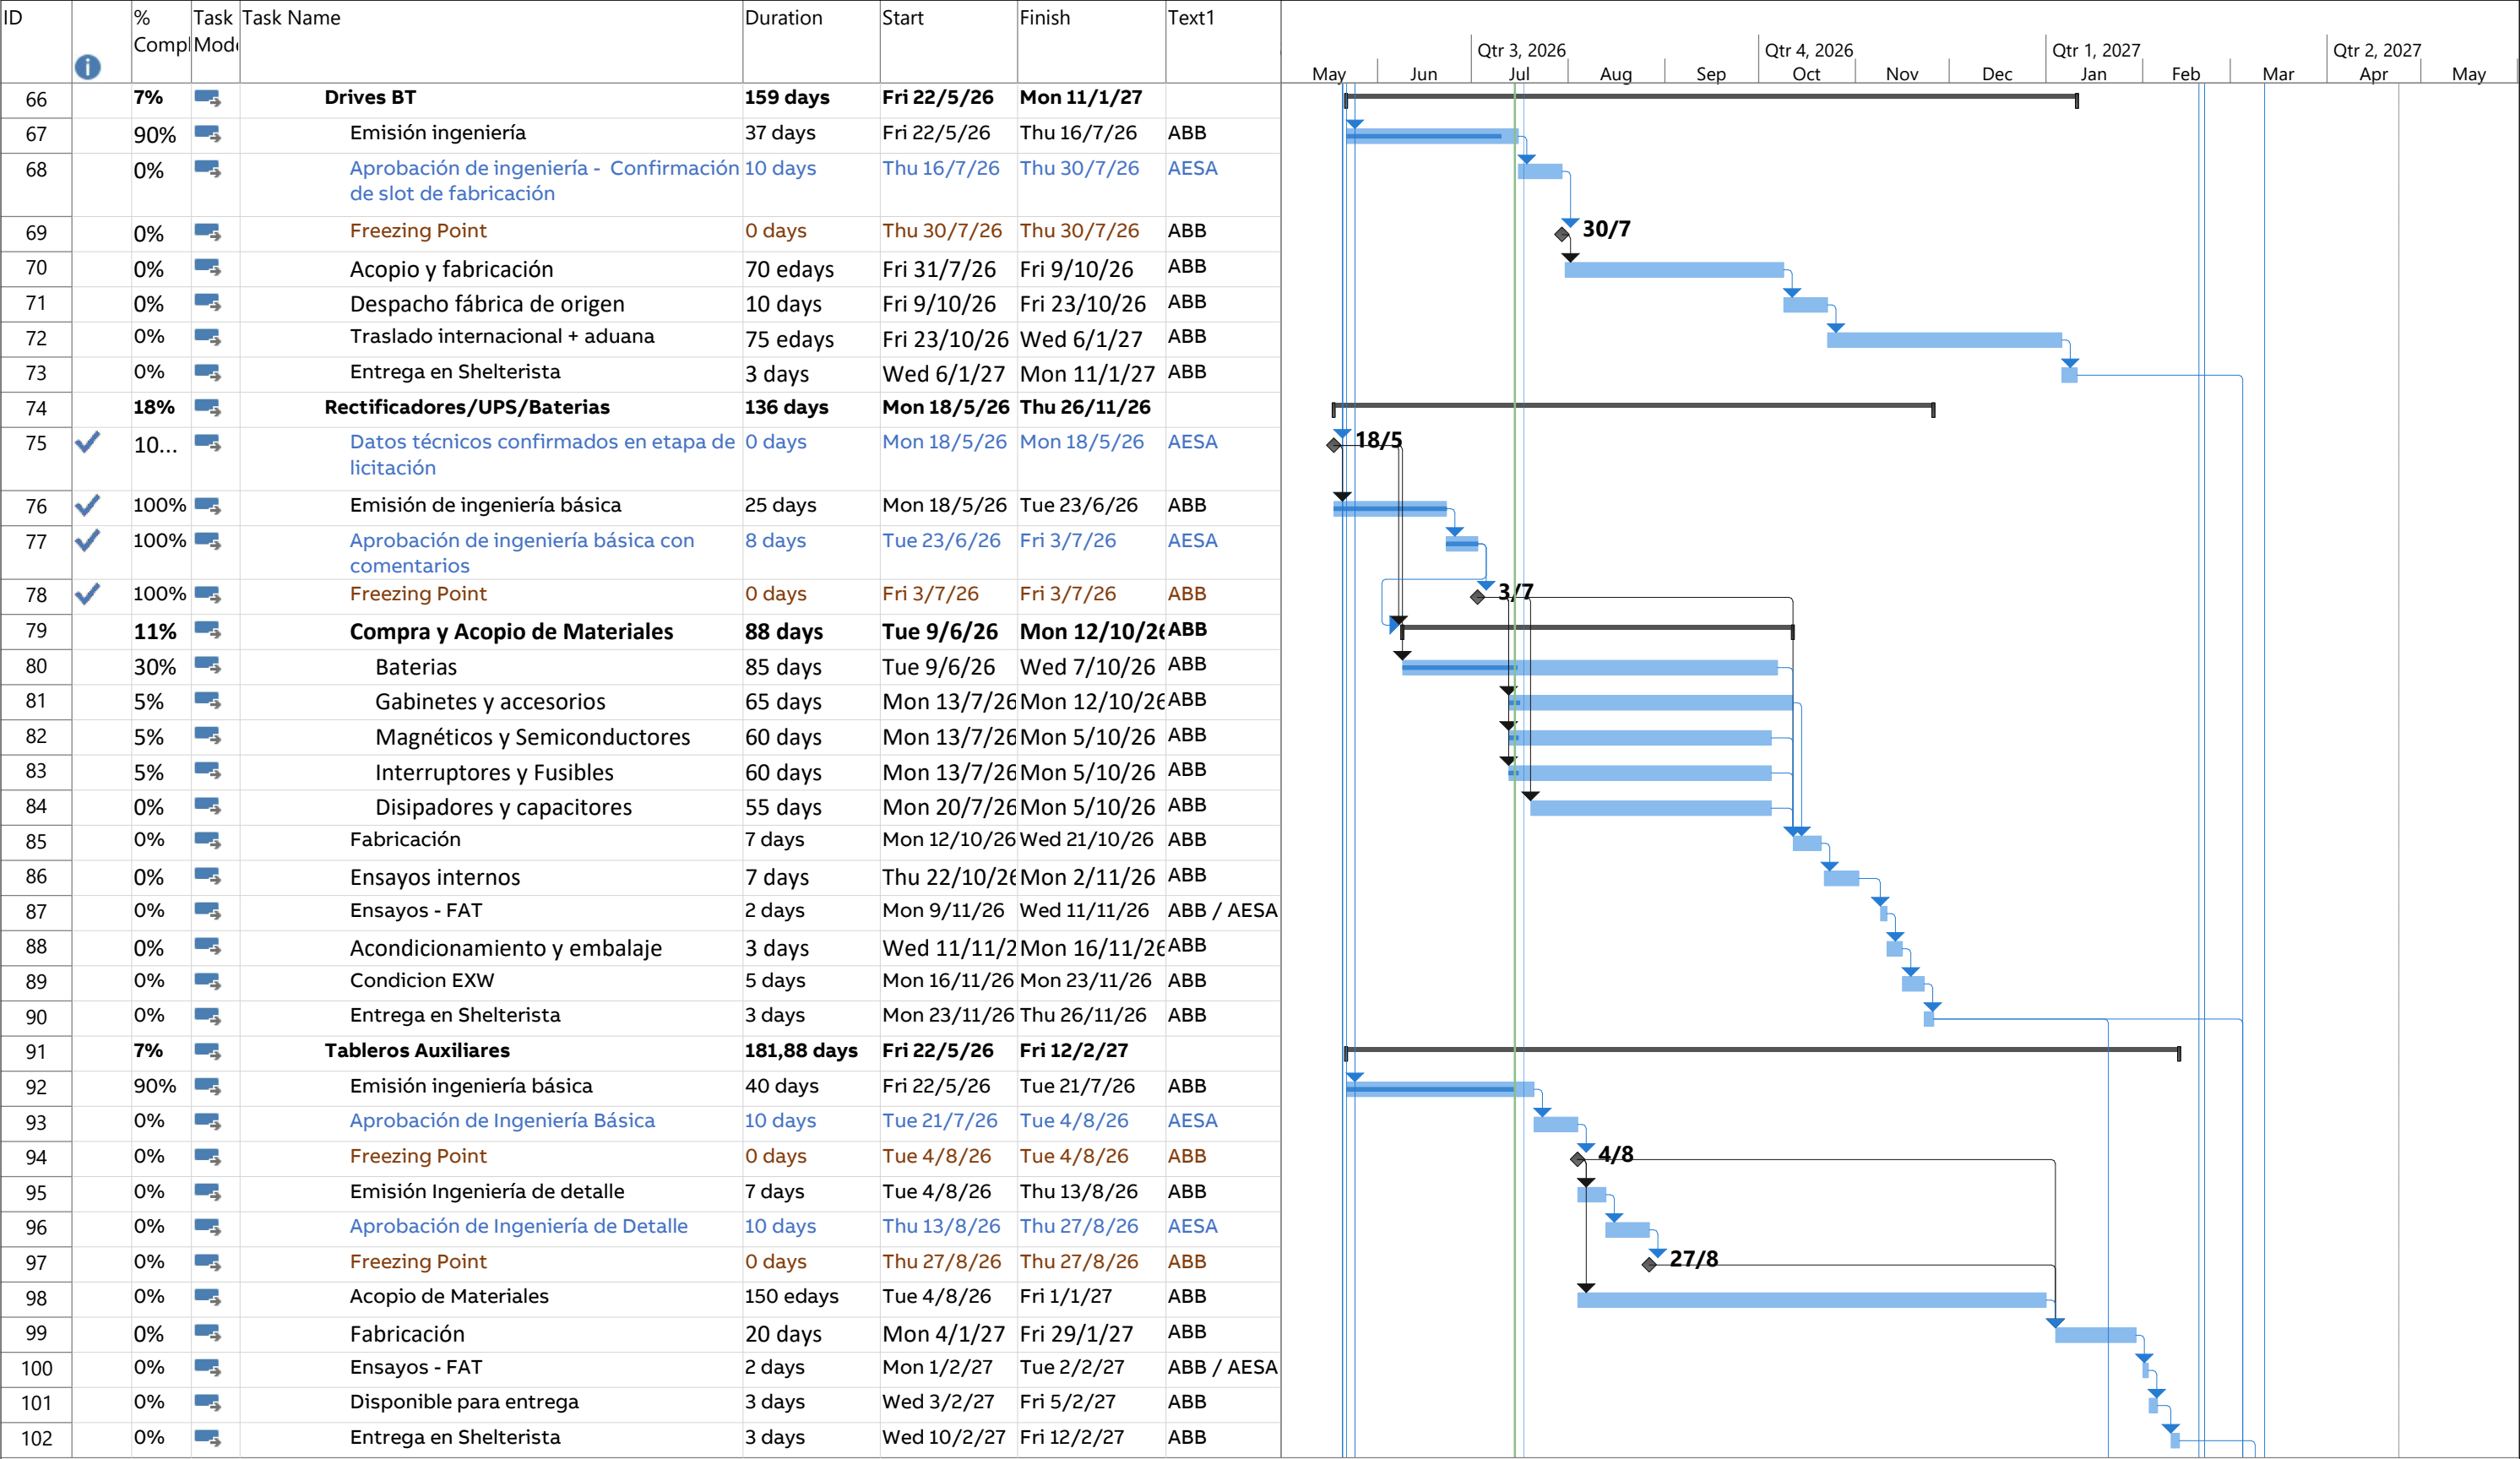

Project: La Calera II - Cronogram
Date: Wed 15/7/26

Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone		Manual Progress	
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline			
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Critical			
Summary		Manual Task		Finish-only		Critical Split			
Project Summary		Duration-only		External Tasks		Progress			

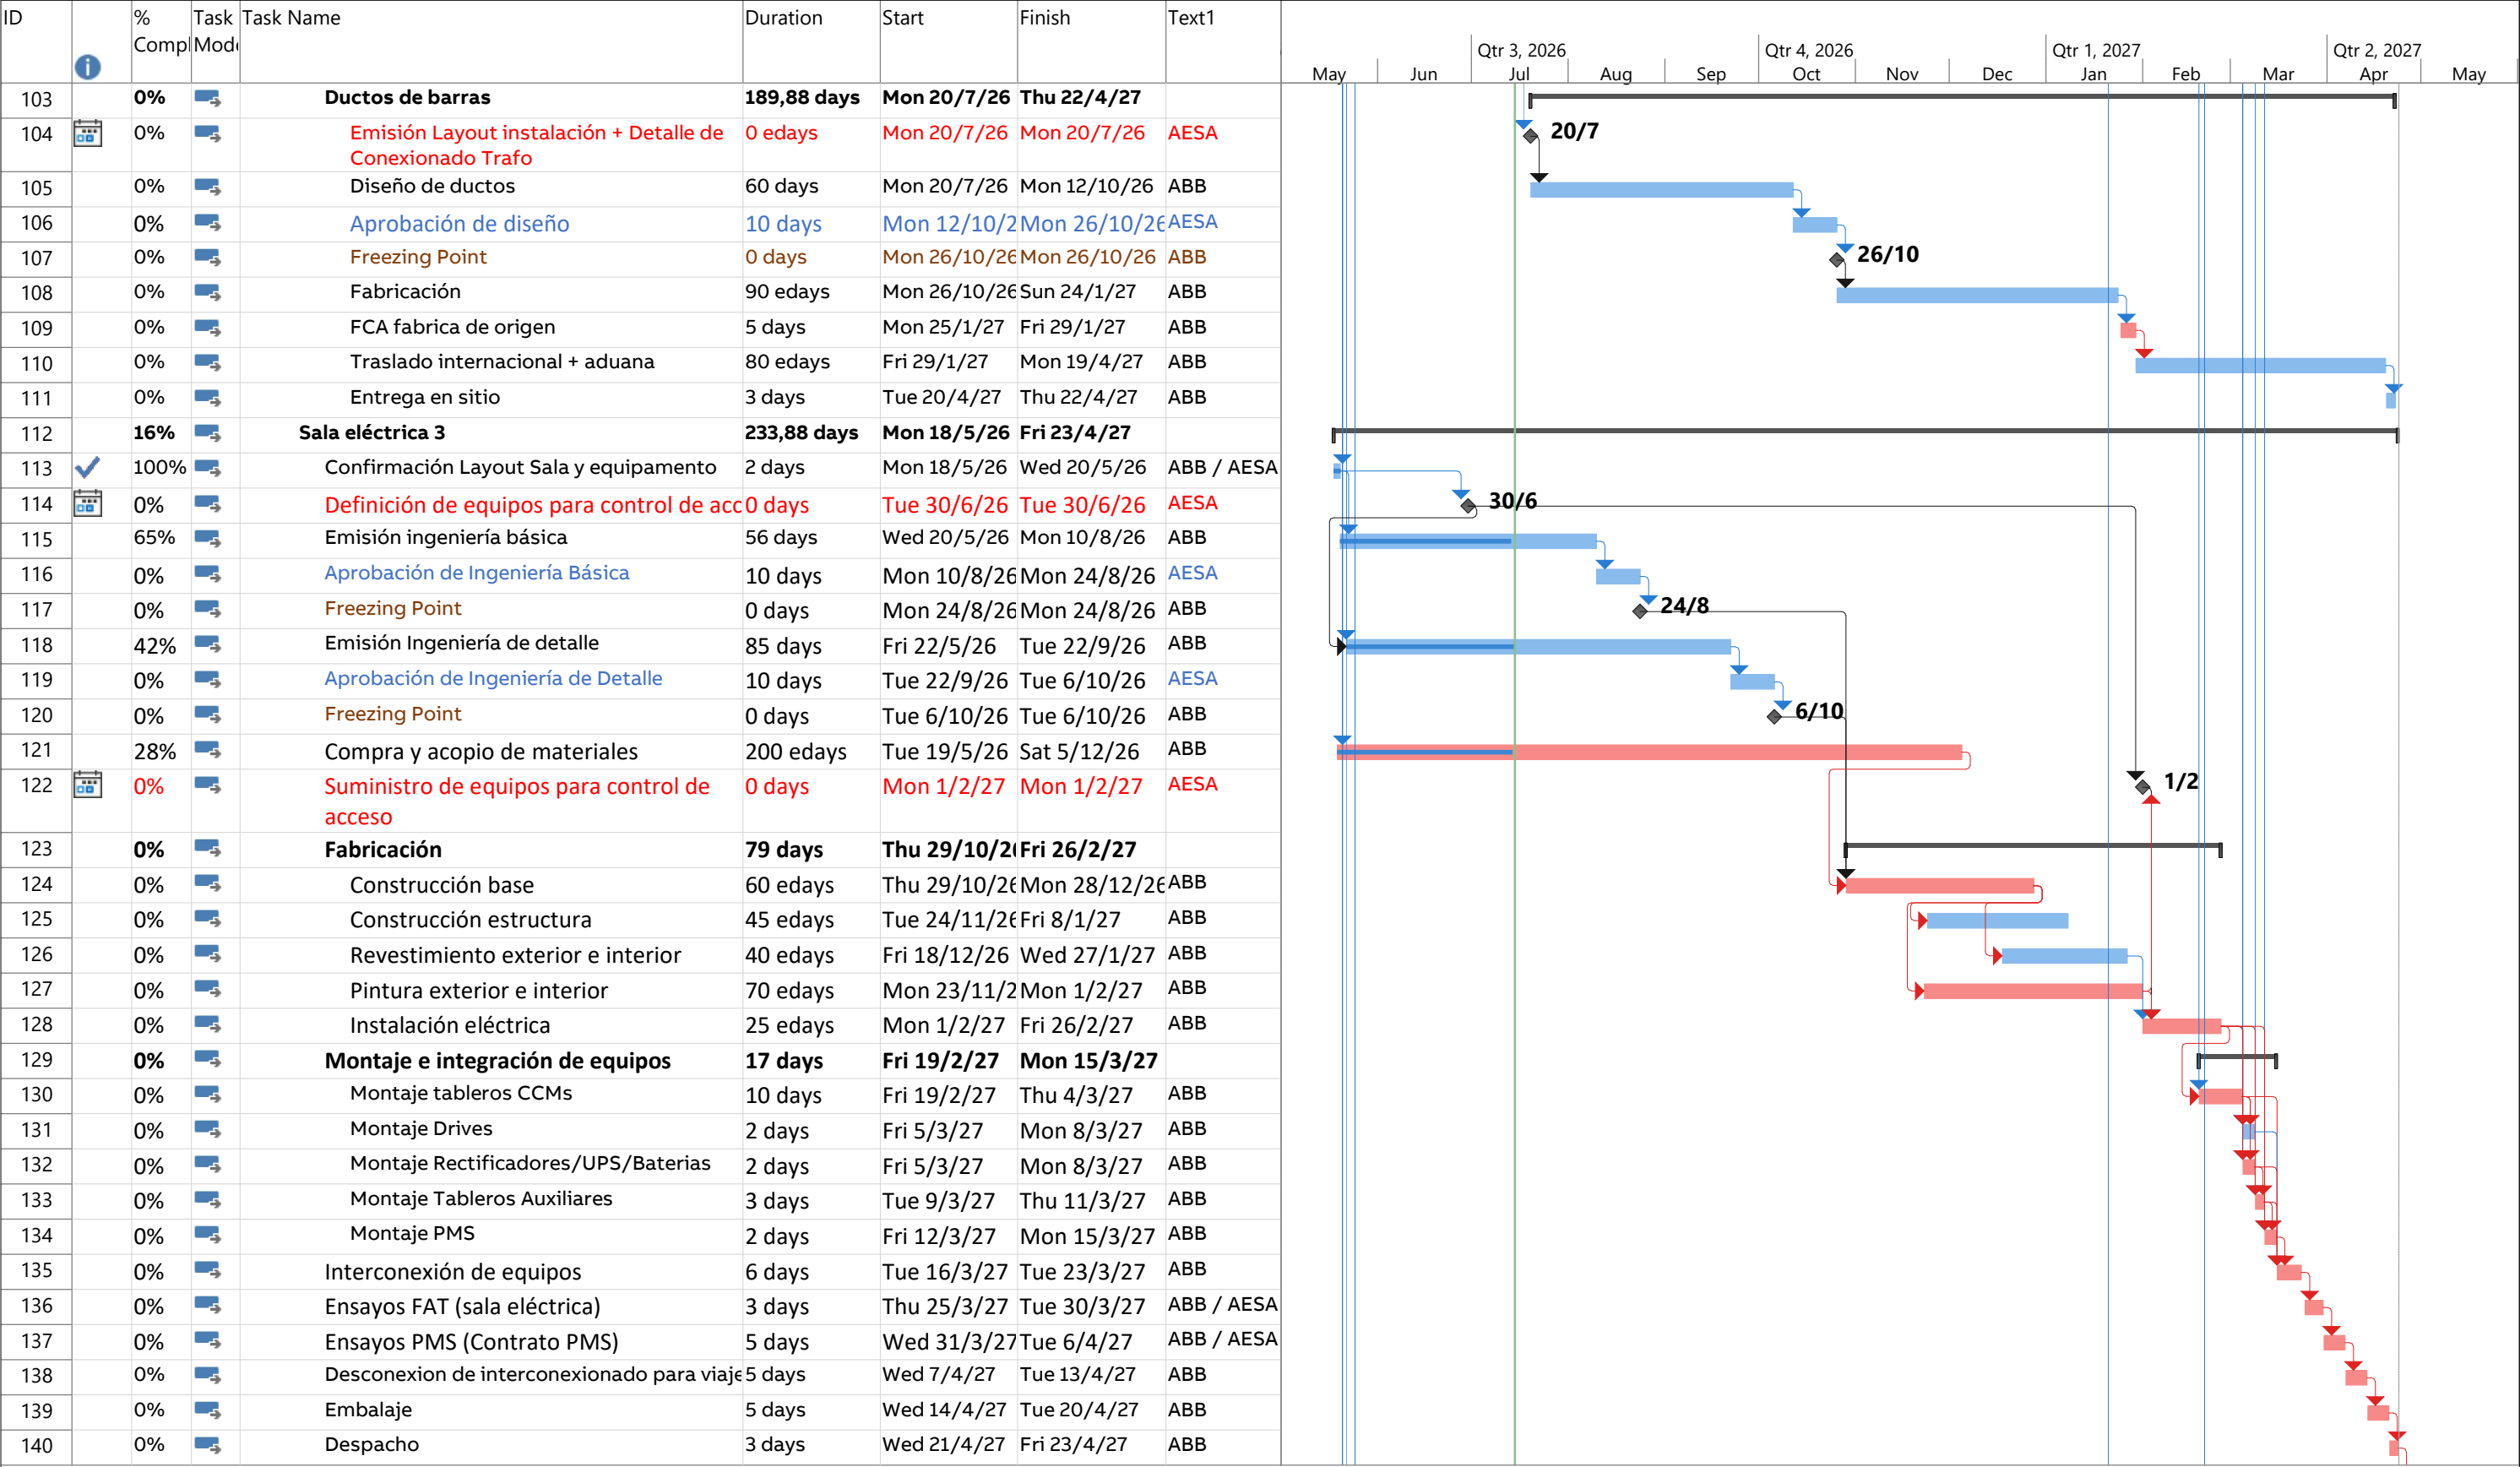

Project: La Calera II - Cronogram

Date: Wed 15/7/26

Task

Inactive Task

Manual Summary Rollup

External Milestone

Manual Progress

Split

Inactive Milestone

Manual Summary

Deadline

Milestone

Inactive Summary

Start-only

Critical

Summary

Manual Task

Finish-only

Critical Split


Project Summary

Duration-only

External Tasks

Progress

Page 4

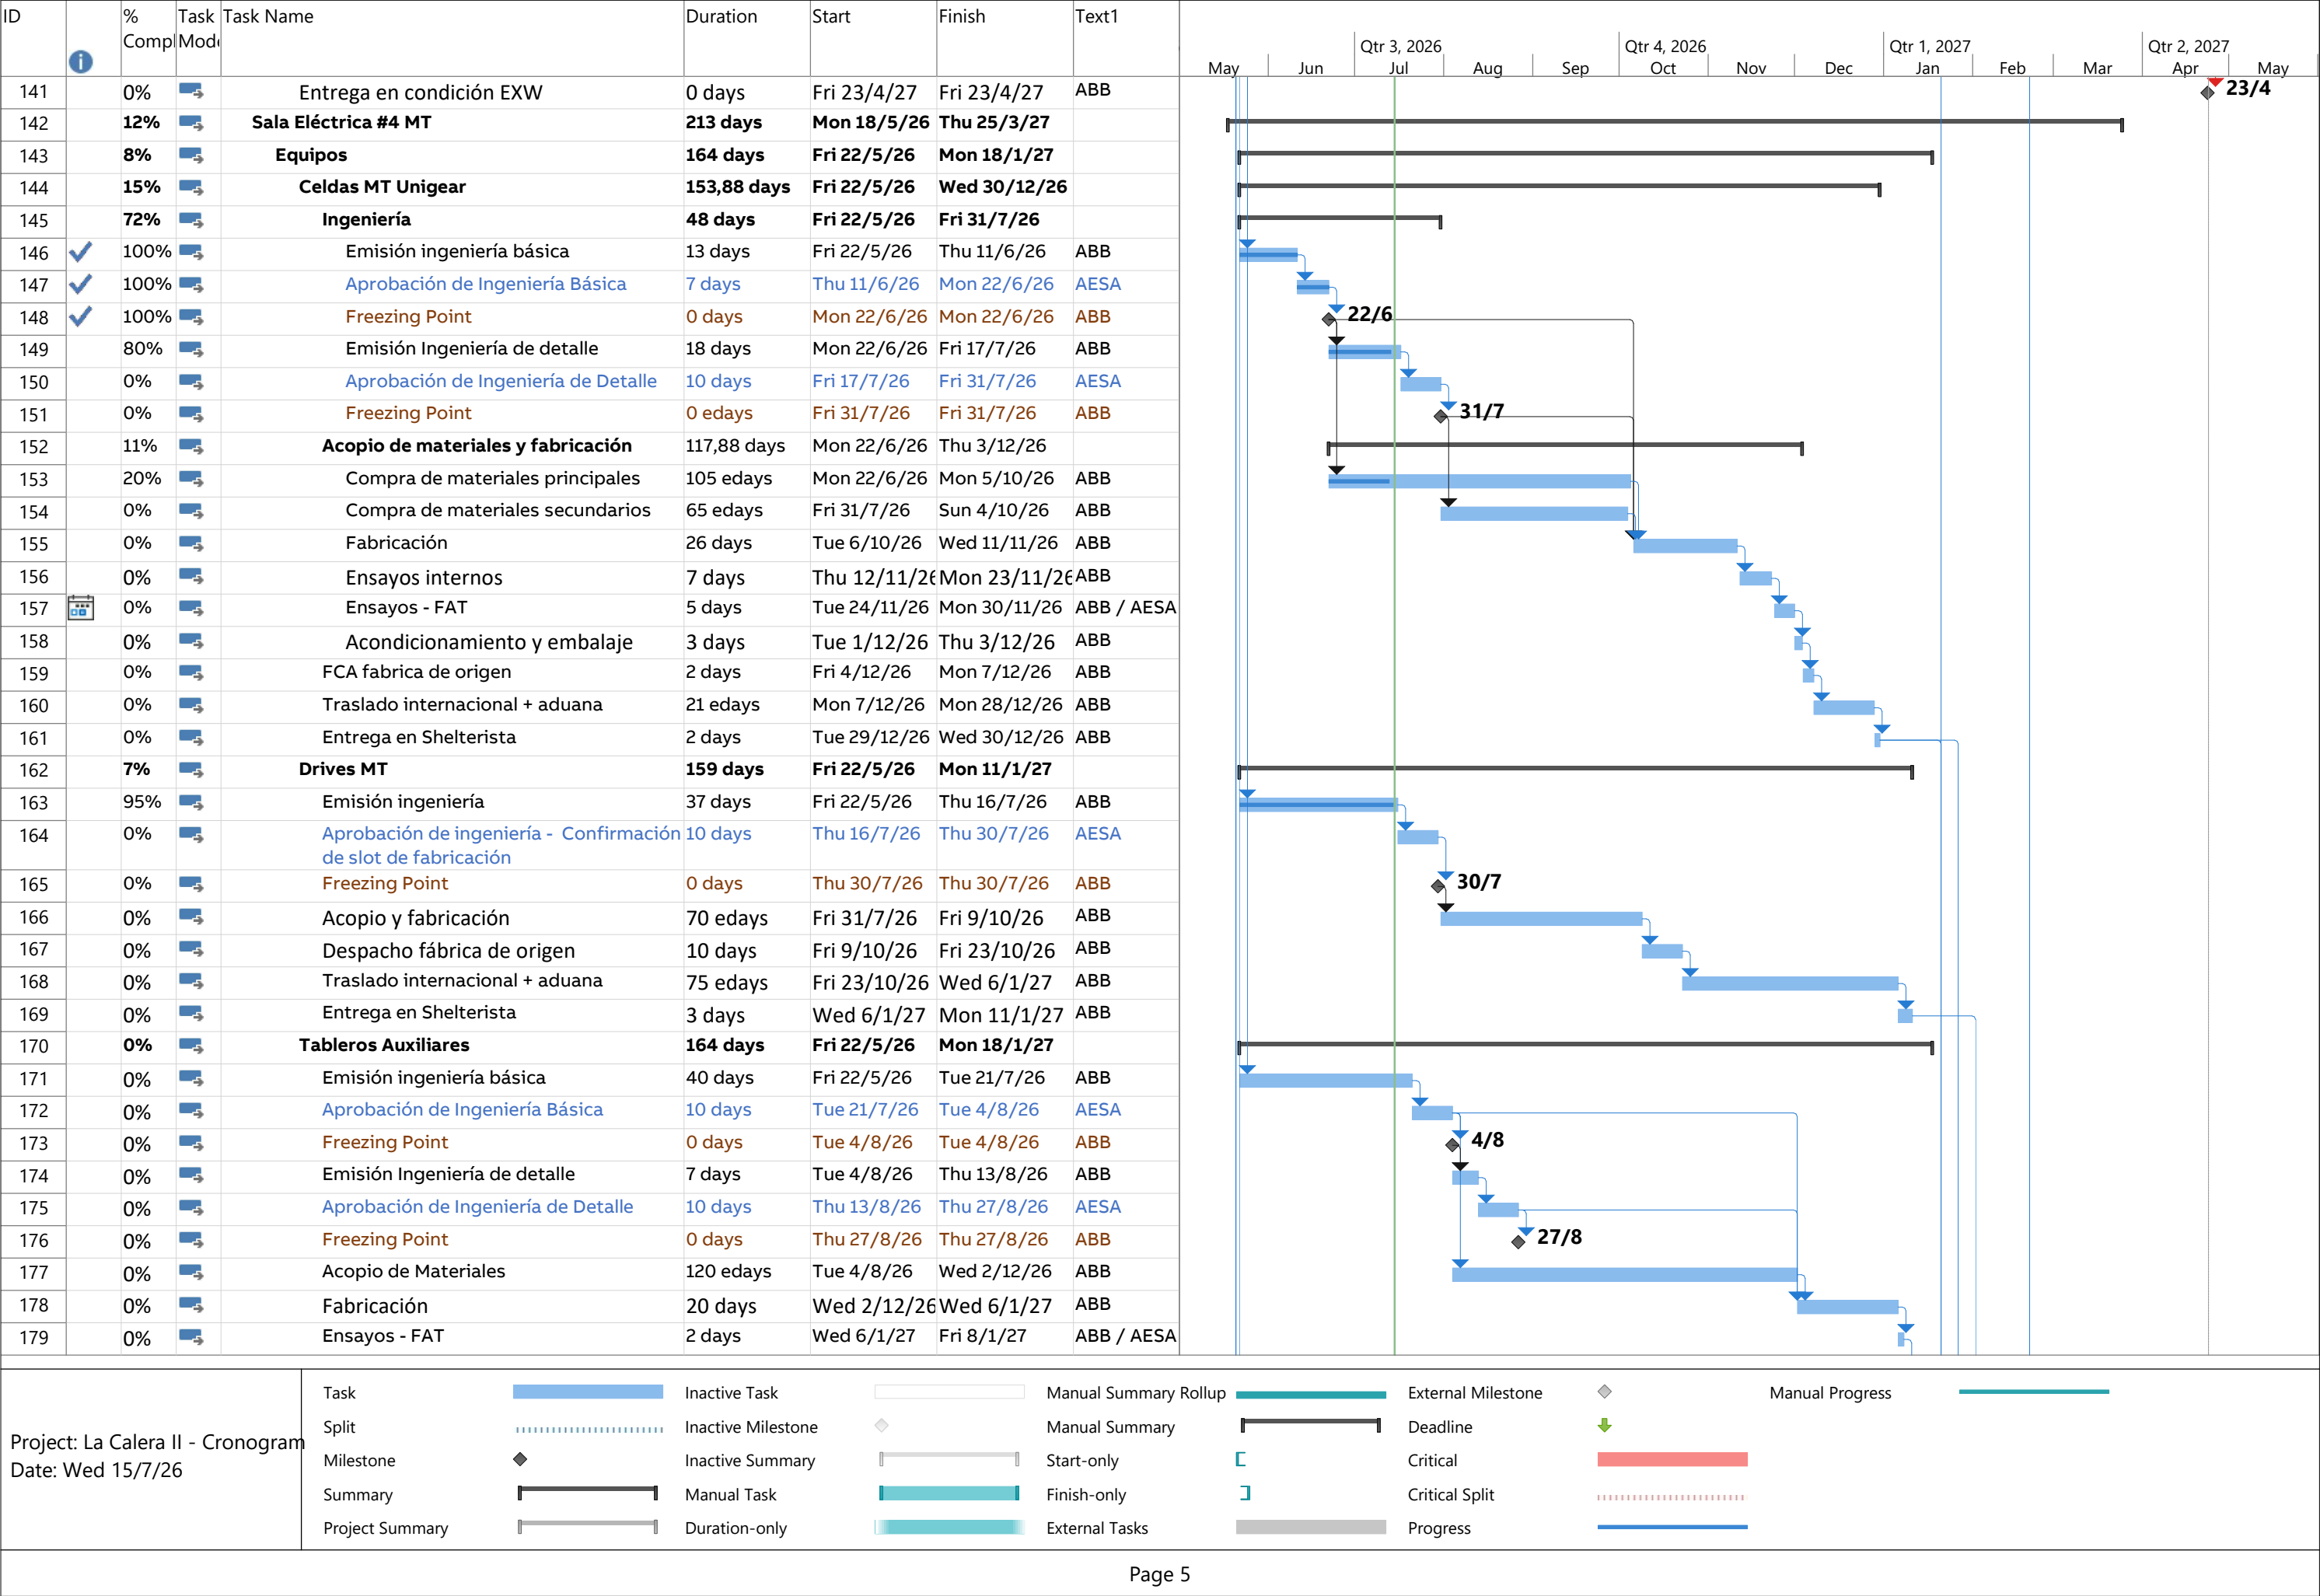

Page 5

ID		% Compl	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Text1																								
									May	Jun	Qtr 3, 2026	Jul	Aug	Sep	Qtr 4, 2026	Oct	Nov	Dec	Qtr 1, 2027	Jan	Feb	Mar	Qtr 2, 2027	Apr	May							
180		0%		Disponible para entrega	3 days	Fri 8/1/27	Wed 13/1/27	ABB																								
181		0%		Entrega en Shelterista	3 days	Wed 13/1/27	Mon 18/1/27	ABB																								
182		16%		Sala eléctrica 4	213 days	Mon 18/5/26	Thu 25/3/27																									
183		100%		Confirmación Layout Sala y equipamento	2 days	Mon 18/5/26	Wed 20/5/26	ABB / AESA																								
184		0%		Definición de equipos para control de acceso	0 days	Tue 30/6/26	Tue 30/6/26	AESA																								
185		65%		Emisión ingeniería básica	56 days	Wed 20/5/26	Mon 10/8/26	ABB																								
186		0%		Aprobación de Ingeniería Básica	10 days	Mon 10/8/26	Mon 24/8/26	AESA																								
187		0%		Freezing Point	0 days	Mon 24/8/26	Mon 24/8/26	ABB																								
188		40%		Emisión Ingeniería de detalle	84 days	Fri 22/5/26	Mon 21/9/26	ABB																								
189		0%		Aprobación de Ingeniería de Detalle	10 days	Mon 21/9/26	Mon 5/10/26	AESA																								
190		0%		Freezing Point	0 days	Mon 5/10/26	Mon 5/10/26	ABB																								
191		27%		Compra y acopio de materiales	205 edays	Tue 19/5/26	Thu 10/12/26	ABB																								
192		0%		Suministro de equipos para control de acceso	0 days	Fri 1/1/27	Fri 1/1/27	AESA																								
193		0%		Fabricación	73 days	Mon 5/10/26	Thu 21/1/27																									
194		0%		Construcción base	60 edays	Mon 5/10/26	Fri 4/12/26	ABB																								
195		0%		Construcción estructura	45 edays	Thu 29/10/26	Sun 13/12/26	ABB																								
196		0%		Revestimiento exterior e interior	40 edays	Fri 20/11/26	Wed 30/12/26	ABB																								
197		0%		Pintura exterior e interior	70 edays	Fri 23/10/26	Fri 1/1/27	ABB																								
198		0%		Instalación eléctrica	20 edays	Fri 1/1/27	Thu 21/1/27	ABB																								
199		0%		Montaje e integración de equipos	20,88 days	Thu 21/1/27	Mon 22/2/27																									
200		0%		Montaje Tableros Auxiliares UPS	3 days	Thu 21/1/27	Tue 26/1/27	ABB																								
201		0%		Montaje Tableros Auxiliares	4 days	Thu 21/1/27	Wed 27/1/27	ABB																								
202		0%		Montaje Tablero MT	4 days	Wed 27/1/27	Tue 2/2/27	ABB																								
203		0%		Montaje Drives	5 days	Tue 2/2/27	Thu 11/2/27	ABB																								
204		0%		Montaje PMS	3 days	Thu 18/2/27	Mon 22/2/27	ABB																								
205		0%		Interconexión de equipos	8 days	Thu 11/2/27	Tue 23/2/27	ABB																								
206		0%		Ensayos FAT (sala eléctrica)	3 days	Wed 24/2/27	Mon 1/3/27	ABB / AESA																								
207		0%		Ensayos PMS (Contrato PMS)	5 days	Tue 2/3/27	Tue 9/3/27	ABB / AESA																								
208		0%		Desconexión de interconexionado para viaje	5 days	Tue 9/3/27	Tue 16/3/27	ABB																								
209		0%		Embalaje	3 days	Tue 16/3/27	Fri 19/3/27	ABB																								
210		0%		Despacho	3 days	Fri 19/3/27	Thu 25/3/27	ABB																								
211		0%		Entrega en condición EXW	0 days	Thu 25/3/27	Thu 25/3/27	ABB																								

Project: La Calera II - Cronogram

Date: Wed 15/7/26

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Critical

Critical Split

Progress

Manual Progress

Page 6
