


Flujo Realista de Ejecución — EL + IN (anclado en suministros)

CPF2 La Calera II · escala temporal · ruta crítica en rojo · RFSU base 31-ENE-28 → realista 31-MAY-28

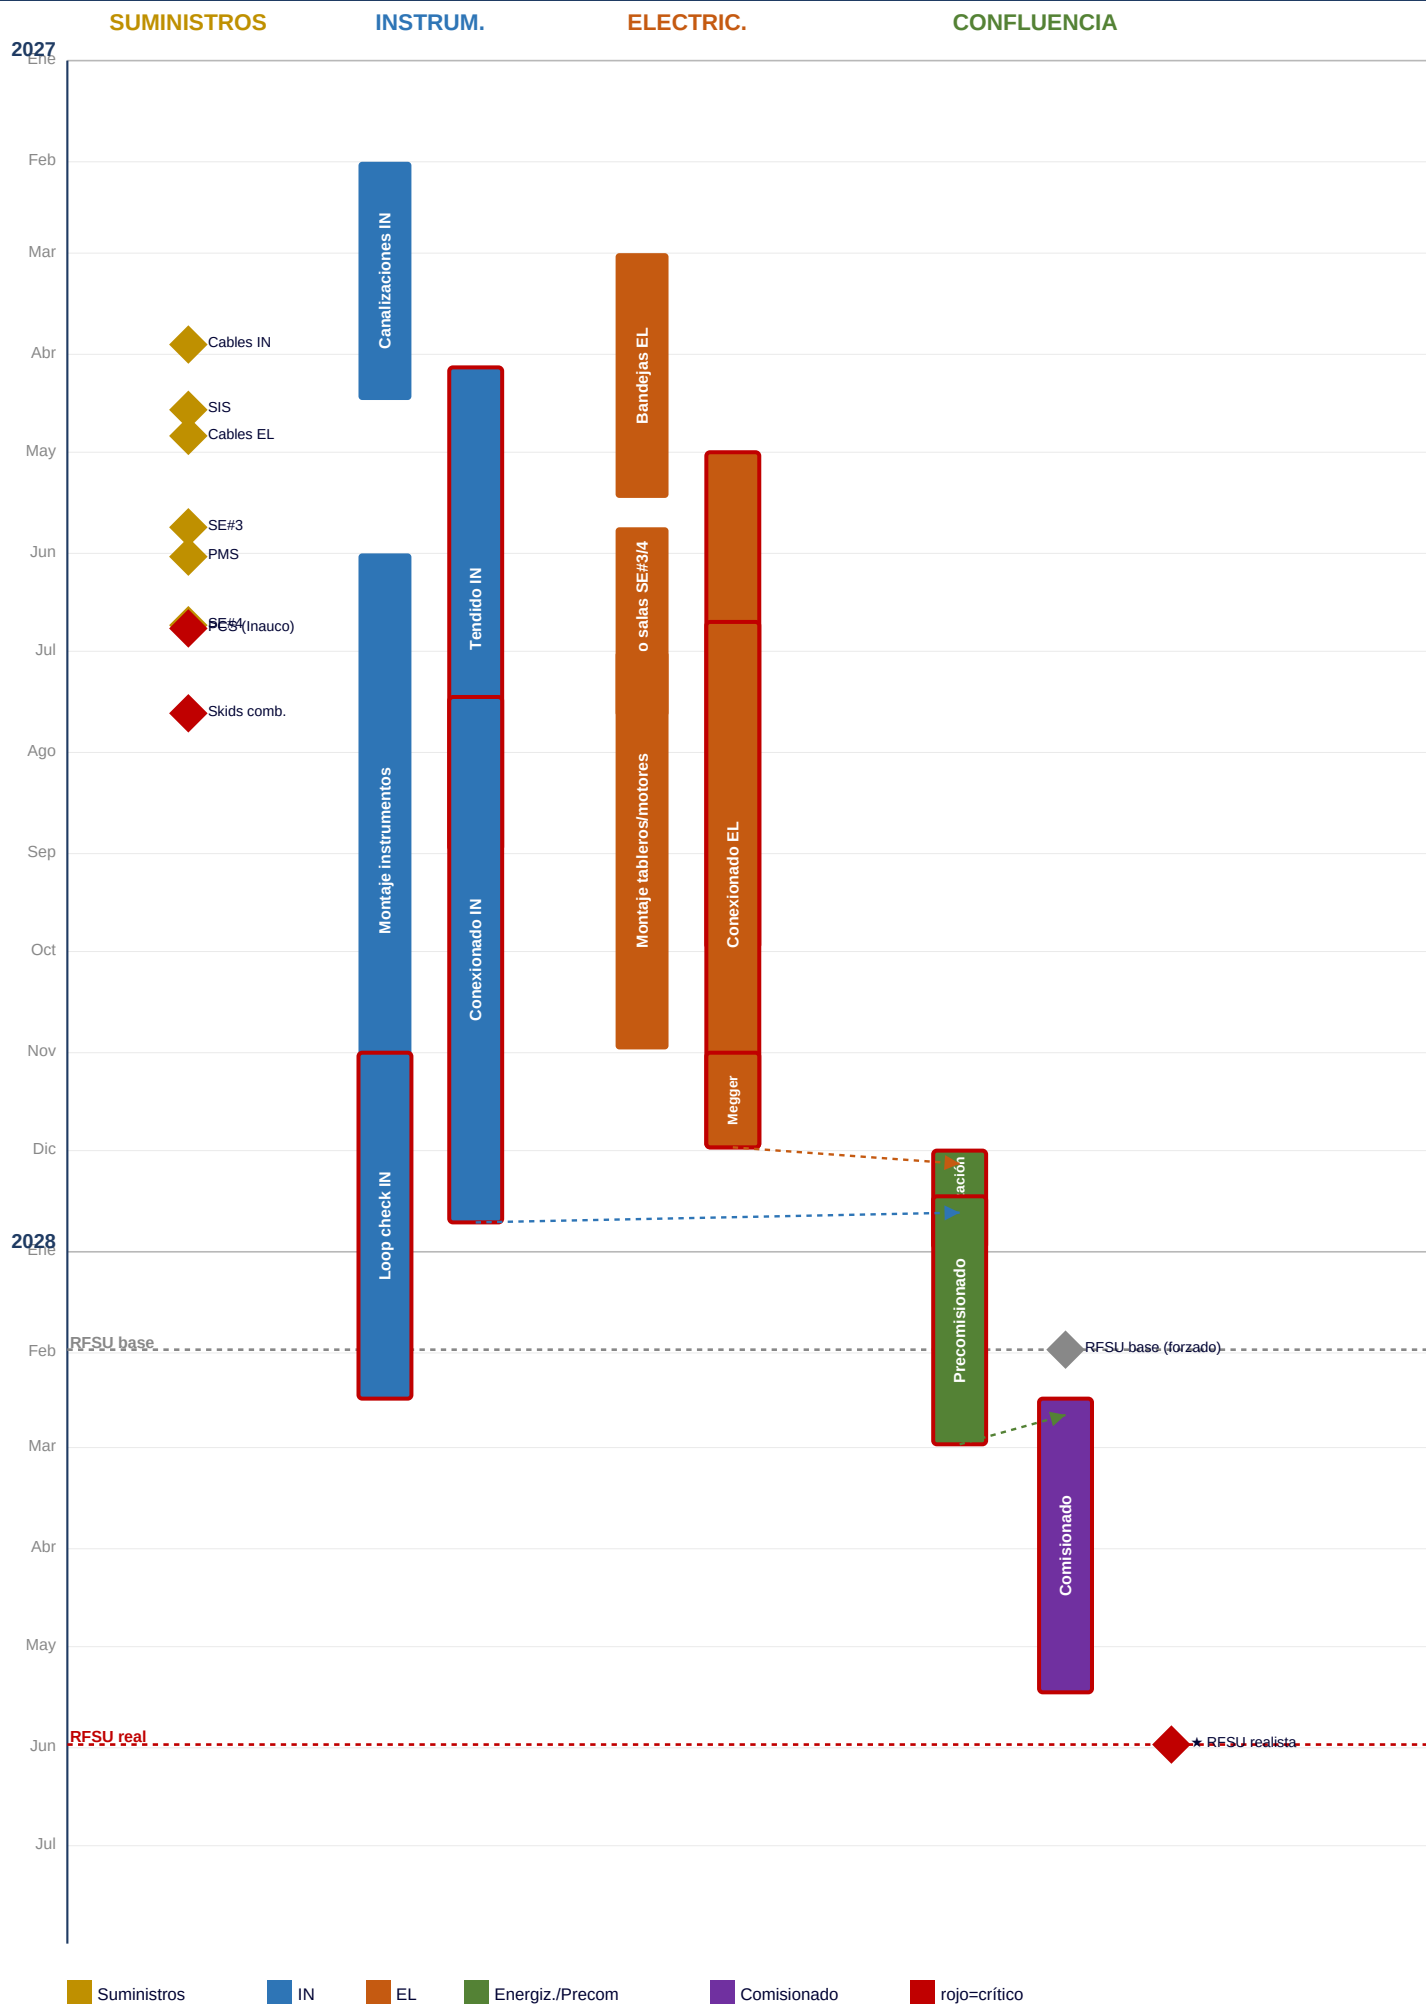

Suministros

IN

EL

Energiz./Precom

Comisionado

rojo=crítico

Última entrega crítica skids 20-jul-27 → montaje → conexionado → energización (dic-27) → precom (dic-27/feb-28) → comisionado (feb/may-28) → RFSU.

El RFSU base 31-ENE-28 sólo se cumple forzando el solapamiento precom+comisionado. Realista ≈ 31-MAY-28 (~+4 meses). Preliminar para depuración.
