


Cronograma OPTIMIZADO — Instrumentación y Electricidad

CPF2 La Calera II · palancas: cables progresivos (inicio c/20%) · 6 d/sem · conexionado salas y Sala INS a doble turno · solapamiento parcial precom-comisionado · **RFSU optimizado ≈ 31-MAR-2028** (base 31-ENE · conservador 31-MAY)

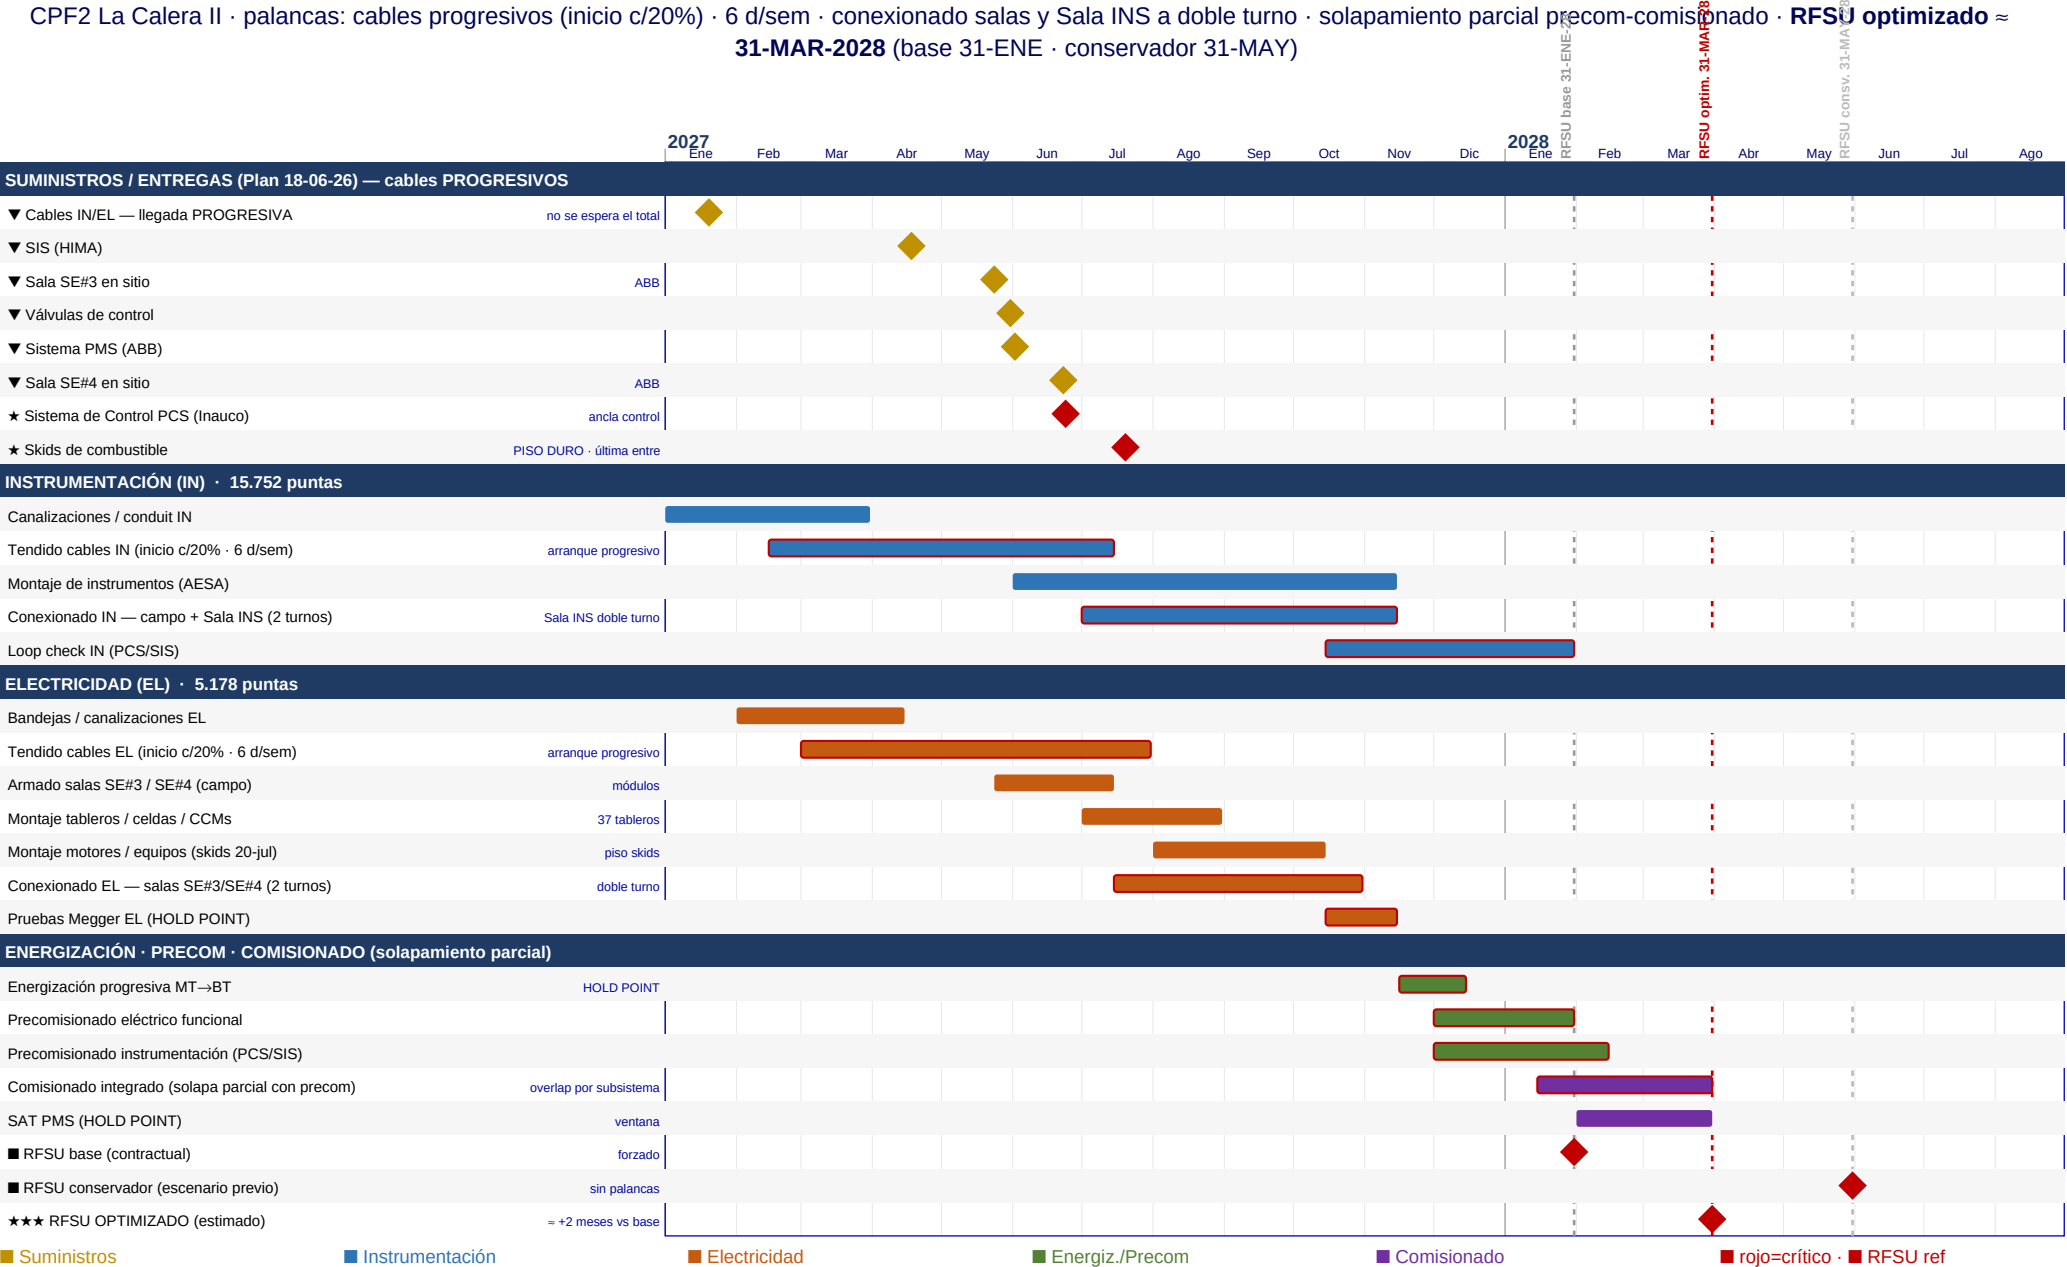

Detalle de tareas e hitos

Bloque	ID	Tarea / Hito	Inicio	Fin	Días	Nota
		SUMINISTROS / ENTREGAS (Plan 18-06-26) — cables PROGRESIVOS				
Suministro	S0	▼ Cables IN/EL — llegada PROGRESIVA	20-01-27		hito	no se espera el total
Suministro	S2	▼ SIS (HIMA)	18-04-27		hito	
Suministro	S4	▼ Sala SE#3 en sitio	24-05-27		hito	ABB
Suministro	S5	▼ Válvulas de control	31-05-27		hito	
Suministro	S6	▼ Sistema PMS (ABB)	02-06-27		hito	
Suministro	S7	▼ Sala SE#4 en sitio	23-06-27		hito	ABB
Suministro	S8	★ Sistema de Control PCS (Inauco)	24-06-27		hito	ancla control
Suministro	S10	★ Skids de combustible	20-07-27		hito	PISO DURO · última entrega
		INSTRUMENTACIÓN (IN) · 15.752 puntas				
Instrum.	I1	Canalizaciones / conduit IN	01-01-27	31-03-27	90	
Instrum.	I2	Tendido cables IN (inicio c/20% · 6 d/sem) ■ crítico	15-02-27	15-07-27	151	arranque progresivo
Instrum.	I3	Montaje de instrumentos (AESA)	01-06-27	15-11-27	168	
Instrum.	I4	Conexionado IN — campo + Sala INS (2 turnos) ■ crítico	01-07-27	15-11-27	138	Sala INS doble turno
Instrum.	I5	Loop check IN (PCS/SIS) ■ crítico	15-10-27	31-01-28	109	
		ELECTRICIDAD (EL) · 5.178 puntas				
Electric.	E1	Bandejas / canalizaciones EL	01-02-27	15-04-27	74	
Electric.	E2	Tendido cables EL (inicio c/20% · 6 d/sem) ■ crítico	01-03-27	31-07-27	153	arranque progresivo
Electric.	E3	Armado salas SE#3 / SE#4 (campo)	24-05-27	15-07-27	53	módulos
Electric.	E4	Montaje tableros / celdas / CCMs	01-07-27	31-08-27	62	37 tableros
Electric.	E5	Montaje motores / equipos (skids 20-jul)	01-08-27	15-10-27	76	piso skids
Electric.	E6	Conexionado EL — salas SE#3/SE#4 (2 turnos) ■ crítico	15-07-27	31-10-27	109	doble turno
Electric.	E7	Pruebas Megger EL (HOLD POINT) ■ crítico	15-10-27	15-11-27	32	
		ENERGIZACIÓN · PRECOM · COMISIONADO (solapamiento parcial)				
Energy/Comis	P1	Energización progresiva MT→BT ■ crítico	16-11-27	15-12-27	30	HOLD POINT
Energy/Comis	P2	Precomisionado eléctrico funcional ■ crítico	01-12-27	31-01-28	62	

Bloque	ID	Tarea / Hito	Inicio	Fin	Días	Nota
Energy/Comis	P3	Precomisionado instrumentación (PCS/SIS) ■ crítico	01-12-27	15-02-28	77	
Energy/Comis	P4	Comisionado integrado (solapa parcial con precom) ■ crítico	15-01-28	31-03-28	77	overlap por subsistema
Energy/Comis	P5	SAT PMS (HOLD POINT)	01-02-28	31-03-28	60	ventana
Energy/Comis	RBASE	■ RFSU base (contractual)	31-01-28		hito	forzado
Energy/Comis	RCONS	■ RFSU conservador (escenario previo)	31-05-28		hito	sin palancas
Energy/Comis	RFSU	★★★ RFSU OPTIMIZADO (estimado)	31-03-28		hito	≈ +2 meses vs base

Palancas aplicadas, comparación y conclusión

PALANCAS DE ACELERACIÓN APLICADAS	
Cables progresivos	La entrega de cables es progresiva; el tendido arranca sin esperar el total (inicio c/20%). Tendido IN desde feb-27, EL desde mar-27 (vs abr/may en el conservador).
6 días/semana	Se trabaja sábados → ~+20% de avance semanal en todos los frentes (durations x0,83).
Doble turno en conexionado	Conexionado en salas eléctricas (SE#3/SE#4) y Sala INS a doble turno → conexionado EL y la porción en Sala INS del IN se comprimen ~40%.
Solapamiento precom-comisionado	El comisionado integrado arranca al completar el precom de los primeros subsistemas (no espera el 100%).
Dimensionado por puntas	EL ~5.178 puntas · IN 15.752 puntas como base de los conexionados.

COMPARACIÓN Y CONCLUSIÓN	
RFSU optimizado	≈ 31-MAR-2028. Recupera ~2 meses respecto del escenario conservador (31-MAY-2028).
Brecha residual vs base	~2 meses por encima de la base contractual 31-ENE-2028.
Por qué no llega al 31-ENE	Las entregas de equipo crítico son un PISO DURO que la mano de obra no acelera: PCS 24-jun, bombas/calentadores ~29-jun y SKIDS DE COMBUSTIBLE 20-jul-2027. Su montaje→conexionado→precom empuja el comisionado de planta completa a 2028.
Palancas adicionales para cerrar la brecha	(1) adelantar OC/entrega de skids y PCS; (2) RFSU por fases (arrancar generación/área lista antes); (3) más cuadrillas / 2 turnos también en tendido; (4) comisionado por subsistemas en paralelo.
Estado	Preliminar. Sensible a la confirmación de entregas firmes y a la productividad real de doble turno.
