



CPF – LA CALERA II

# FACILIDADES DESARROLLO CPF LA CALERA

## INFORME DE AVANCE

ABB

INFORME Nº 5

5/10/2026

| Revisión | Fecha     | Realizado | Aprobado |
|----------|-----------|-----------|----------|
| A        | 5/10/2026 | R. MACK   | M. PUGA  |
|          |           |           |          |
|          |           |           |          |

## SUMARIO EJECUTIVO

Este informe, detalla las acciones ejecutadas por el Contratista durante el mes de: Septiembre 26.

### 1 Reseña

El presente informe tiene como objetivo detallar las actividades relacionadas con la provisión de los equipos de las OCs 45089944971 y 4508944973 a ser suministrados por ABB.

### 2 Alcance de los Trabajos

- Sala Eléctrica n° 3, compuesta de los siguientes equipos:
  - Sala eléctrica modular, con dimensiones 37.000x9.000x3.700mm (Largo x Ancho x Alto) – Con instalaciones auxiliares completas
  - Tableros 102-CCM-005/6/7
  - Variadores de velocidad de BT stand alone 102-DP-VFD-24210A/B/C
  - Ducto de barras 102-DB-005A/B , 102-DB-006A/B y 102-DB-007A/B
  - Tableros auxiliares de distribución 102-DP-001 , 102-LP-001, 102-LP-002, 102-DP-001-TRA
  - Sistema UPS/Cargador de baterías/Baterías
  - Gabinete para CCTV y CA
  - Repuestos
- Sala Eléctrica n° 4, compuesta de los siguientes equipos:
  - Sala eléctrica modular, con dimensiones 28.000x5.000x3.500mm (Largo x Ancho x Alto) – Con instalaciones auxiliares completas
  - Tableros de media tensión 102-TGMT-001/002
  - Variadores de media tensión 102-DP-VFD-23310A/B/C
  - Tablero auxiliar 102-DP-101
  - Tableros auxiliare de distribución para sistema UPS 102-DP-101UPS y 102-DP-101VCC
  - Repuestos

### 3 General

En el presente período, se ha conseguido a aprobación de la ingeniería de detalle de todos los equipos en las salas eléctricas logrando llegar a un hito importante.

En cuanto a certificaciones, se avanzó con la certificación parcial del hito 1 (contra emisión de ingenierías básicas de los variadores de velocidad e ingeniería básica de las salas eléctricas).

### 4 Situación Contractual

Pólizas de fiel cumplimiento y fondo de reparo para ambas OCs (45089944971 y 4508944973) emitidas por ABB y aprobadas por AESA.

Se ha presentado y acordado las aclaraciones solicitadas por AESA con respecto a los hitos de certificación para ambas órdenes de compra. Los documentos de compra han sido revisados de acuerdo con esto.

## CPF – LA CALERA II

Se ha presentado la nota de cambio número uno (documento R-2631036 - NC1\_A) el cual ha sido aprobado por AESA y por lo tanto, ABB ha avanzado en la implementación técnica. La nota de pedido por éste ítem ha sido recibido correctamente en el mes de agosto.

Se ha presentado la versión optimista del cronograma de ejecución en el cual se evidencia una mejora en los plazos contractuales de la provisión de ambas salas.

**Sala Eléctrica 3:** fecha contractual 14/5/2027, fecha objetivo 23/4/2027. Mejora de plazo de 21 días.

**Sala Eléctrica 4:** fecha contractual 8/4/2027, fecha objetivo 25/3/2027. Mejora de plazo de 14 días.

Al día de la fecha de confección del informe, se verifica un corrimiento en la fecha contractual de entrega de los ductos de barras de la sala #3, los cuales no han podido ser diseñados debido a que no se dispone de información suficiente sobre los gabinetes de los transformadores de media tensión y posiciones relativas de los mismos. Se iniciaron las tareas de diseño el día 21/9 a partir de la confirmación de la información mencionada. ABB se encuentra trabajando en la confirmación del plazo de entrega y el posible impacto económico.

AESA deberá adecuar la fecha de entrega contractual de las posiciones 120, 130 y 140 del documento de compras 45089944971, con el fin de evitar penalidades para ABB, por incumplimiento en el plazo de entrega de las posiciones mencionadas.

## 5 Principales Eventos Cumplidos en Septiembre

### ➤ En el área de Ingeniería se destacan lo siguiente:

#### **Tableros Auxiliares**

- Aprobación de ingeniería básica y de detalle. Emisiones en revisión numérica.

#### **Tableros CCMs**

- Aprobación de ingeniería básica y de detalle. Emisiones en revisión numérica.

#### **Tableros de MT**

- Aprobación de ingeniería básica y de detalle. Emisiones en revisión numérica

#### **Sistema UPS y baterías**

- Aprobación de ingeniería básica y de detalle. Emisiones en revisión numérica.

#### **Variadores de media y baja tensión**

- Aprobación de ingeniería básica y de detalle.

#### **Salas eléctricas**

- Emisión de ingeniería básica
- Emisión de ingeniería de detalle

## CPF – LA CALERA II

### ➤ Detalle de materiales comprados:

| SHELTER SALA ELECTRICA - SALA #3                                                                                                             |              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>SISTEMA HVAC - SALA ELECTRICA (TABLEROS)</b>                                                                                              | <b>Cant.</b> | <b>N° Pedido</b> |
| EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO AM-010 CSS1BPS - 30.000 FRIG/H - FRÍO/CALOR (TRIFÁSICO) - WESTRIC                                               | 7            | 87956            |
| SITOP PSU4200 1AC 24 V/5 A fuente de alimentación estabilizada PSU4200 entrada: 120/240 V AC salida: 24 V DC/5 A - 6EP3333S8000AX0 - SIEMENS | 1            | Of. Siemens      |
| S71200, CPU S71214C, 110220VAC (14DI en 24VDC, 10DO Relé, 2AI) Profinet FW4 - 6ES72141BG400XB0 - SIEMENS                                     | 1            | Of. Siemens      |
| S71200, Módulo de Entradas Digitales, SM 1221, 8DI en 24VDC - 6ES72211BF320XB0 - SIEMENS                                                     | 2            | Of. Siemens      |
| S71200, Módulo de Salidas Digitales, SM 1222, 8DO Relé 220VAC (2A) - 6ES72221HF320XB0 - SIEMENS                                              | 1            | Of. Siemens      |
| MTP700 Unified Basic Panel 7.0" - 6AV21233GB320AW0 - SIEMENS                                                                                 | 1            | Of. Siemens      |
| <b>SISTEMA HVAC - SALA BATERÍA</b>                                                                                                           | <b>Cant.</b> | <b>N° Pedido</b> |
| EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO AM-010 CSS1BPS - 30.000 FRIG/H - FRÍO/CALOR (TRIFÁSICO) - WESTRIC                                               | 2            | 87956            |
| EXTRACTOR CON MOTOR ANTIEXPLOSIVO - LPP 500/30.00-U - CIARRAPICO AEROTÉCNICA                                                                 | 2            | 88098            |
| <b>SISTEMA DE PRESURIZACIÓN</b>                                                                                                              | <b>Cant.</b> | <b>N° Pedido</b> |
| PRESURIZADOR RA330 TRIFÁSICO 3HP 1420 RPM SASE DM4 H270 - GATTI                                                                              | 5            | 88087            |
| FILTRO METÁLICO LAVABLE 25x25x2"                                                                                                             | 5            | 88084            |
| PREFILTRO DESECHABLE MARK 80-2 25x25x2"                                                                                                      | 5            | 88084            |
| <b>SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO - SALA TABLEROS</b>                                                                                      | <b>Cant.</b> | <b>N° Pedido</b> |
| CENTRAL DE INCENDIO - NFS-320E-SP-NOTIFIER                                                                                                   | 1            | 86096            |
| BATERÍA DE GEL DE LIBRE MANTENIMIENTO DE 12V / 17A - BAT 12/17                                                                               | 2            | 86096            |
| DETECTOR ÓPTICO DE HUMO DIRECCIONABLE Y ANALÓGICO DE BAJO PERFIL - FSP-951 - NOTIFIER                                                        | 12           | 86096            |
| BASE UNIVERSAL P/DETECTORES DIRECCIONABLES Y ANALÓGICOS DE BAJO PERFIL - B501-WHITE - NOTIFIER                                               | 12           | 86096            |
| AVISADOR MANUAL DE DOBLE ACCIÓN C/REGISTRO DE OPERACIÓN - NBG-12LSP - NOTIFIER (IP-44 INTERIOR)                                              | 6            | 86096            |
| MINI MÓDULO DIRECCIONABLE PARA MONITOREO DE AVISADOR MANUAL - FMM-101 - NOTIFIER                                                             | 6            | 86096            |
| SIRENA CON LUX ESTROBOSCÓPICA 12/24 VOLTS - 2HILOS ROJA - MONTAJE A PARED - INTERPERIE - P2GRKLED - NOTIFIER                                 | 2            | 86096            |
| SIRENA CON LUX ESTROBOSCÓPICA 12/24 VOLTS - 2HILOS ROJA - MONTAJE A PARED - INTERIOR - P2RLED-SP - NOTIFIER                                  | 1            | 86096            |
| MÓDULO DIRECCIONABLE PARA COMANDO MEDIANTE CONTACTO SECO - FRM-1 - NOTIFIER                                                                  | 5            | 86096            |
| INTERFASE INTELIGENTE SALIDA PROTOCOLO MODBUS PARA INTEGRACIÓN CON CLSS - MODBUS-CGW - NOTIFIER                                              | 1            | 86096            |
| PUERTA DE ENLACE CLSS - CON CARCASA - HON-CGW-MBB - NOTIFIER                                                                                 | 1            | 86096            |
| KIT DE PUERTA DE ENLACE CLSS - 50160636-001 - NOTIFIER                                                                                       | 1            | 86096            |
| <b>SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO - SALA BATERÍA</b>                                                                                       | <b>Cant.</b> | <b>N° Pedido</b> |
| DETECTOR ÓPTICO DE HUMO DIRECCIONABLE Y ANALÓGICO DE BAJO PERFIL - FSP-951 - NOTIFIER                                                        | 3            | 86096            |
| BASE UNIVERSAL P/DETECTORES DIRECCIONABLES Y ANALÓGICOS DE BAJO PERFIL - B501-WHITE - NOTIFIER                                               | 3            | 86096            |
| AVISADOR MANUAL DE DOBLE ACCIÓN C/REGISTRO DE OPERACIÓN - NBG-12LSP - NOTIFIER (IP-44 INTERIOR)                                              | 2            | 86096            |
| MINI MÓDULO DIRECCIONABLE PARA MONITOREO DE AVISADOR MANUAL - FMM-101 - NOTIFIER                                                             | 2            | 86096            |
| SIRENA CON LUX ESTROBOSCÓPICA 12/24 VOLTS - 2HILOS ROJA - MONTAJE A PARED - INTERIOR - P2RLED-SP - NOTIFIER                                  | 1            | 86096            |
| <b>ESTRUCTURA</b>                                                                                                                            |              | 88086            |
| ESTRUCTURA - SECCIÓN N° 1 - 14.000x3.500x3.700mm (Largo x Ancho x Alto)                                                                      | 1            | 88086            |
| ESTRUCTURA - SECCIÓN N° 2 - 14.200x3.500x3.700mm (Largo x Ancho x Alto)                                                                      | 1            | 88086            |
| ESTRUCTURA - SECCIÓN N° 3 - 8.800x3.500x3.700mm (Largo x Ancho x Alto)                                                                       | 1            | 88086            |
| ESTRUCTURA - SECCIÓN N° 4 - 14.000x2.500x3.700mm (Largo x Ancho x Alto)                                                                      | 1            | 88086            |
| ESTRUCTURA - SECCIÓN N° 5 - 14.200x2.500x3.700mm (Largo x Ancho x Alto)                                                                      | 1            | 88086            |
| ESTRUCTURA - SECCIÓN N° 6 - 8.800x2.500x3.700mm (Largo x Ancho x Alto)                                                                       | 1            | 88086            |
| ESTRUCTURA - SECCIÓN N° 7 - 10.500x3.000x3.700mm (Largo x Ancho x Alto)                                                                      | 1            | 88086            |

| SHELTER SALA ELECTRICA SALA #4                                                                                                               |              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>SISTEMA HVAC - SALA ELECTRICA (TABLEROS)</b>                                                                                              | <b>Cant.</b> | <b>N° Pedido</b> |
| EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO AM-010 CSS1BPS - 30.000 FRIG/H - FRÍO/CALOR (TRIFÁSICO) - WESTRIC                                               | 5            | 87956            |
| SITOP PSU4200 1AC 24 V/5 A fuente de alimentación estabilizada PSU4200 entrada: 120/240 V AC salida: 24 V DC/5 A - 6EP3333S8000AX0 - SIEMENS | 1            | Of. Siemens      |
| S71200, CPU S71214C, 110220VAC (14DI en 24VDC, 10DO Relé, 2AI) Profinet FW4 - 6ES72141BG400XB0 - SIEMENS                                     | 1            | Of. Siemens      |
| S71200, Módulo de Entradas Digitales, SM 1221, 8DI en 24VDC - 6ES72211BF320XB0 - SIEMENS                                                     | 2            | Of. Siemens      |
| S71200, Módulo de Salidas Digitales, SM 1222, 8DO Relé 220VAC (2A) - 6ES72221HF320XB0 - SIEMENS                                              | 1            | Of. Siemens      |
| MTP700 Unified Basic Panel 7.0" - 6AV21233GB320AW0 - SIEMENS                                                                                 | 1            | Of. Siemens      |
| <b>SISTEMA DE PRESURIZACIÓN</b>                                                                                                              | <b>Cant.</b> | <b>N° Pedido</b> |
| PRESURIZADOR RA330 TRIFÁSICO 3HP 1420 RPM SASE DM4 H270 - GATTI                                                                              | 4            | 88087            |
| FILTRO METÁLICO LAVABLE 25x25x2"                                                                                                             | 4            | 88084            |
| PREFILTRO DESECHABLE MARK 80-2 25x25x2"                                                                                                      | 4            | 88084            |
| <b>SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO - SALA TABLEROS</b>                                                                                      | <b>Cant.</b> | <b>N° Pedido</b> |
| CENTRAL DE INCENDIO - NFS-320E-SP-NOTIFIER                                                                                                   | 1            | 86096            |
| BATERÍA DE GEL DE LIBRE MANTENIMIENTO DE 12V / 17A - BAT 12/17                                                                               | 2            | 86096            |
| DETECTOR ÓPTICO DE HUMO DIRECCIONABLE Y ANALÓGICO DE BAJO PERFIL - FSP-951 - NOTIFIER                                                        | 8            | 86096            |
| BASE UNIVERSAL P/DETECTORES DIRECCIONABLES Y ANALÓGICOS DE BAJO PERFIL - B501-WHITE - NOTIFIER                                               | 8            | 86096            |
| AVISADOR MANUAL DE DOBLE ACCIÓN C/REGISTRO DE OPERACIÓN - NBG-12LSP - NOTIFIER (IP-44 INTERIOR)                                              | 4            | 86096            |
| MINI MÓDULO DIRECCIONABLE PARA MONITOREO DE AVISADOR MANUAL - FMM-101 - NOTIFIER                                                             | 4            | 86096            |
| SIRENA CON LUX ESTROBOSCÓPICA 12/24 VOLTS - 2HILOS ROJA - MONTAJE A PARED - INTERPERIE - P2GRKLED - NOTIFIER                                 | 2            | 86096            |
| SIRENA CON LUX ESTROBOSCÓPICA 12/24 VOLTS - 2HILOS ROJA - MONTAJE A PARED - INTERIOR - P2RLED-SP - NOTIFIER                                  | 1            | 86096            |
| MÓDULO DIRECCIONABLE PARA COMANDO MEDIANTE CONTACTO SECO - FRM-1 - NOTIFIER                                                                  | 7            | 86096            |
| INTERFASE INTELIGENTE SALIDA PROTOCOLO MODBUS PARA INTEGRACIÓN CON CLSS - MODBUS-CGW - NOTIFIER                                              | 1            | 86096            |
| PUERTA DE ENLACE CLSS - CON CARCASA - HON-CGW-MBB - NOTIFIER                                                                                 | 1            | 86096            |
| KIT DE PUERTA DE ENLACE CLSS - 50160636-001 - NOTIFIER                                                                                       | 1            | 86096            |
| <b>ESTRUCTURA</b>                                                                                                                            | <b>Cant.</b> | <b>N° Pedido</b> |
| ESTRUCTURA - SECCIÓN N° 1 - 14.000x3.500x3.500mm (Largo x Ancho x Alto)                                                                      | 2            | 88086            |
| ESTRUCTURA - SECCIÓN N° 2 - 14.000x1.500x3.500mm (Largo x Ancho x Alto)                                                                      | 2            | 88086            |

## CPF – LA CALERA II

### Ductos de barras

- Diseño 3D avanzado. Se avanza con la definición del detalles de tramos y soportes y piezas de acople para diseño final.

### ➤ En el área de Suministros se destacan los siguientes:

Detalles de OC emitidas a subproveedores

| Documento de Compra | Descripción                 | Fecha de Emisión | Proveedor | Origen    | Fecha de entrega en origen |
|---------------------|-----------------------------|------------------|-----------|-----------|----------------------------|
| 4500407392          | Salas eléctricas 3 y 4      | 18/5/2026        | Bottino   | Argentina | 14/5/27 y 8/4/27           |
| 4500407396          | Tableros Auxiliares         | 18/5/2026        | Mehcco    | Argentina | 28/1/2027                  |
| 4500407468          | KMT                         | 19/5/2026        | KMT       | Argentina | 27/11/2026                 |
| 4700201354          | EAE                         | 16/5/2026        | EAE       | Turquía   | tbd                        |
| 4700201355          | Tableros de Media tensión   | 16/5/2026        | BRABB     | Brasil    | 27/11/2026                 |
| 4700201478          | Tableros CCMs               | 19/5/2026        | BRABB     | Brasil    | 25/1/2027                  |
| 4700201819          | Variadores de baja tensión  | 26/5/2026        | FIABB     | Finlandia | 6/11/2026                  |
| 4700201626          | Variadores de Media Tensión | 22/5/2026        | CNABB     | China     | 6/11/2026                  |

### Tableros auxiliares

- Acopio parcial de equipamiento mecánico y eléctrico



## CPF – LA CALERA II

### Sistema UPS y baterías

- Acopio parcial de equipamiento mecánico y eléctrico
  - BREAKERS – 80%
  - FUSIBLES – 100%
  - VENTILADORES – 100%
  - TI: 75%
  - PLACAS ELECTRONICAS – 75%
  - SEMICONDUCTORES – 63%



- En el área de Calidad/Inspección se destacan los siguientes:
  - Emisión de documentación de Calidad

| CODIFICACIÓN AESA         | DESCRIPCION DEL DOCUMENTO                                                    | CALIFICACIÓN |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 5155-00-0009-VE-CA-IN-001 | SALA ELÉCTRICA N° 3 - PROTOCOLOS FAT                                         | APR          |
| 5155-00-0009-VE-CA-IN-002 | SALA ELÉCTRICA N° 4 - PROTOCOLOS FAT                                         | APR          |
| 5155-00-0009-VE-CA-IN-003 | 102-CCM-005 - CCM 380/220V - PROTOCOLOS FAT                                  | APR          |
| 5155-00-0009-VE-CA-IN-004 | 102-CCM-006 - CCM 380/220V - PROTOCOLOS FAT                                  | APR          |
| 5155-00-0009-VE-CA-IN-005 | 102-CCM-007 - CCM 380/220V - PROTOCOLOS FAT                                  | APR          |
| 5155-00-0009-VE-CA-IN-006 | 102-TGMT-001 - SWG MT 13,2kV - PROTOCOLOS FAT                                | APR          |
| 5155-00-0009-VE-CA-IN-007 | 102-TGMT-002 - SWG MT 6,6kV - PROTOCOLOS FAT                                 | APR          |
| 5155-00-0009-VE-CA-IN-008 | 102-DP-101VCC - TAB DISTRIB PARA SISTEMA CORRIENTE CONTINUA - PROTOCOLOS FAT | APR          |
| 5155-00-0009-VE-CA-IN-009 | 102-DP-101UPS - TAB DISTRIB PARA SISTEMA UPS - PROTOCOLOS FAT                | APR          |
| 5155-00-0009-VE-CA-IN-010 | 102-VCC-001A/B - SISTEMA DE CC - PROTOCOLOS FAT                              | APR          |
| 5155-00-0009-VE-CA-IN-011 | 102-UPS-001A/B - SISTEMA DE UPS - PROTOCOLOS FAT                             | APR          |

## CPF – LA CALERA II

|                           |                                                                                      |      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 5155-00-0009-VE-CA-IN-012 | 102-DP-001-TRA - TAB DISTRIBUCIÓN DE TRACING - PROTOCOLOS FAT                        | APR  |
| 5155-00-0009-VE-CA-IN-013 | 102-LP-001 - TAB DISTRIBUCIÓN SERV AUX S#3 - PROTOCOLOS FAT                          | APR  |
| 5155-00-0009-VE-CA-IN-014 | 102-LP-002 - TAB DISTRIB PARA SISTEMA UPS - PROTOCOLOS FAT                           | APR  |
| 5155-00-0009-VE-CA-IN-015 | 102-DP-001 - TAB DE SERVICIOS AUXILIARES SE#3 - PROTOCOLOS FAT                       | APR  |
| 5155-00-0009-VE-CA-IN-016 | 102-DP-101 - TAB DE SERVICIOS AUXILIARES SE#4 - PROTOCOLOS FAT                       | APR  |
| 5155-00-0009-VE-CA-PE-001 | PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS (ITP/PIE) - SALA ELÉCTRICA N°3                          | ACOM |
| 5155-00-0009-VE-CA-PE-002 | PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS (ITP/PIE) - TABLEROS CCM                                | APR  |
| 5155-00-0009-VE-CA-PE-003 | PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS (ITP/PIE) - TABLEROS TGMT                               | ACOM |
| 5155-00-0009-VE-CA-PE-004 | PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS (ITP/PIE) - SISTEMA CC                                  | APR  |
| 5155-00-0009-VE-CA-PE-005 | PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS (ITP/PIE) - SISTEMA UPS                                 | APR  |
| 5155-00-0009-VE-CA-PE-006 | PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS (ITP/PIE) - TABLEROS ELÉCTRICOS DE SERVICIOS AUXILIARES | APR  |
| 5155-00-0009-VE-CA-PR-001 | Procedimiento de END's                                                               | APR  |
| 5155-00-0009-VE-CA-PR-002 | Procedimiento de pintura + Ficha técnica de productos aplicados.                     | ACO  |
| 5155-00-0009-VE-CA-PR-003 | PROCEDIMIENTO DE FAT - TABLEROS CCM                                                  | APR  |
| 5155-00-0009-VE-CA-PR-004 | PROCEDIMIENTO DE FAT - TABLEROS TGMT                                                 | ACO  |
| 5155-00-0009-VE-CA-PR-006 | PROCEDIMIENTO DE FAT - SISTEMA CC                                                    | APR  |
| 5155-00-0009-VE-CA-PR-007 | PROCEDIMIENTO DE FAT - SISTEMA UPS                                                   | APR  |
| 5155-00-0009-VE-CA-PR-008 | PROCEDIMIENTO DE FAT - TABLEROS ELÉCTRICOS DE SERVICIOS AUXILIARES                   | APR  |
| 5155-00-0009-VE-CA-WP-001 | Procedimientos de soldadura (WPS, WPQ, PQR)                                          | ACO  |
| 5155-00-0009-VE-CA-WP-003 | Welding MAP SE#3 Estructura de Shelter                                               | ACO  |

### ➤ Previsión de fechas FAT de los distintos equipos

| COMENTARIOS            | ORIGEN    | FECHA INICIO FAT | FECHA FIN FAT | Lugar de FAT         |
|------------------------|-----------|------------------|---------------|----------------------|
| Sistema UPS y baterías | Argentina | 12/11/2026       | 13/11/2026    | Santa Fe - Argentina |
| Tableros TGMT          | Brasil    | 27/11/2026       | 3/12/2026     | Sorocaba - Brasil    |
| Tableros CCMs          | Brasil    | 3/12/2026        | 11/12/2026    | Sorocaba - Brasil    |
| Tableros auxiliares    | Argentina | 14/12/2026       | 16/12/2026    | AMBA - Buenos Aires  |
| Sala eléctrica #4      | Argentina | 22/2/2027        | 26/2/2027     | Mendoza - Argentina  |
| Sala eléctrica #3      | Argentina | 29/3/2027        | 2/4/2027      | Mendoza - Argentina  |

## CPF – LA CALERA II


➤ **En el área de Fabricación se destacan los siguientes:**

- Variadores de Media Tensión: inicio y finalización de fabricación y ensayos



- Tableros CCMs: inicio temprano de fabricación de columna y módulos extraíbles

CPF – LA CALERA II

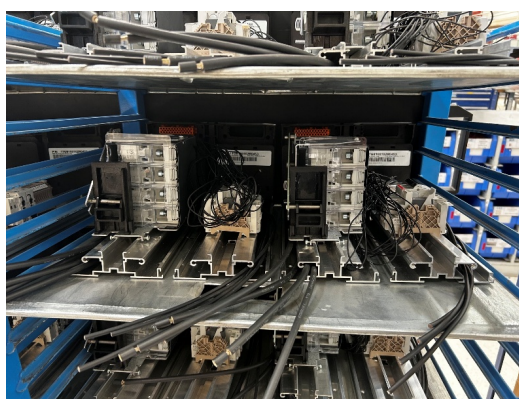

CPF – LA CALERA II





- Tableros de Media tensión: inicio de fabricación de gabinetes de comando

## 6 Principales Eventos a ser Cumplidos en el mes de Octubre

- **En el área de Temas Generales de la Ejecución del Proyecto:**
  - Emisión de certificación parcial correspondiente al hito 2 por aprobación de ingeniería básica de salas eléctricas.
  - Emisión de certificación correspondiente al hito 3 por acopio de materiales correspondiente al sistema UPS y baterías y Tableros Auxiliares.
  - Emisión y aprobación de nota de cambio por equipos adicionales para CCTV y Wifi.
- **En el área de Calidad/Inspección:**
  - Inspección a proveedor de salas eléctricas.
- **En el área de Fabricación:**
  - Avance en la fabricación de los tableros CCMs
  - Inicio de fabricación de los tableros de Media Tensión
  - Inicio de fabricación de la sala eléctrica 4.

## 7 Avances

➤ El avance resultante de las actividades ejecutadas es el que muestra los siguientes cuadros:

| <b>Tableros CCMs MNS III</b>                        |                       | MES PREVIO | AVANCE MENSUAL | MES PRÓXIMO |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------|-------------|
| 102-CCM-005/6/7                                     |                       | ago-26     | sept-26        | oct-26      |
| Especialidad                                        | Peso por Especialidad | Actual     | Previsto       | Previsto    |
| Ingeniería                                          | 19%                   | 100%       | 100%           | 100%        |
| Compra de Materiales                                | 4%                    | 80%        | 100%           | 100%        |
| Recepción de materiales                             | 53%                   | 55%        | 85%            | 100%        |
| Fabricación                                         | 9%                    | 0%         | 5%             | 85%         |
| Tests/Inspección                                    | 5%                    | 0%         | 0%             | 0%          |
| Despacho                                            | 10%                   | 0%         | 0%             | 0%          |
| <b>TOTAL GLOBAL</b>                                 | <b>100%</b>           | <b>0%</b>  | <b>69%</b>     | <b>84%</b>  |
| <b>Tableros de media tensión UNIGEAR</b>            |                       | MES PREVIO | AVANCE MENSUAL | MES PRÓXIMO |
| 102-TGMT-001/2                                      |                       | ago-26     | sept-26        | oct-26      |
| Especialidad                                        | Peso por Especialidad | Actual     | Previsto       | Previsto    |
| Ingeniería                                          | 20%                   | 100%       | 100%           | 100%        |
| Compra de Materiales                                | 10%                   | 85%        | 100%           | 100%        |
| Recepción de materiales                             | 12%                   | 40%        | 80%            | 100%        |
| Fabricación                                         | 20%                   | 0%         | 0%             | 30%         |
| Tests/Inspección                                    | 4%                    | 0%         | 0%             | 0%          |
| Despacho                                            | 1%                    | 0%         | 0%             | 0%          |
| <b>TOTAL GLOBAL</b>                                 | <b>67%</b>            | <b>0%</b>  | <b>40%</b>     | <b>48%</b>  |
| <b>Tableros Auxiliares de distribución</b>          |                       | MES PREVIO | AVANCE MENSUAL | MES PRÓXIMO |
| 102-DP-001 , 102-LP-001, 102-LP-002, 102-DP-001-TRA |                       | ago-26     | sept-26        | oct-26      |
| Especialidad                                        | Peso por Especialidad | Actual     | Previsto       | Previsto    |
| Ingeniería                                          | 20%                   | 100%       | 100%           | 100%        |
| Compra de Materiales                                | 10%                   | 100%       | 100%           | 100%        |
| Recepción de materiales                             | 45%                   | 30%        | 80%            | 100%        |
| Fabricación                                         | 20%                   | 0%         | 0%             | 0%          |
| Tests/Inspección                                    | 4%                    | 0%         | 0%             | 0%          |
| Despacho                                            | 1%                    | 0%         | 0%             | 0%          |
| <b>TOTAL GLOBAL</b>                                 | <b>100%</b>           | <b>0%</b>  | <b>66%</b>     | <b>75%</b>  |

## CPF – LA CALERA II

| Ductos de barras                                 |                       | MES PREVIO | AVANCE MENSUAL | MES PRÓXIMO |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------|-------------|
| 102-DB-0005A/B - 102-DB-0006A/B - 102-DB-0007A/B |                       | ago-26     | sept-26        | oct-26      |
| Especialidad                                     | Peso por Especialidad | Actual     | Previsto       | Previsto    |
| Ingeniería                                       | 30%                   | 0%         | 15%            | 100%        |
| Fabricación                                      | 35%                   | 0%         | 0%             | 0%          |
| Transporte Marítimo                              | 34%                   | 0%         | 0%             | 0%          |
| Despacho                                         | 1%                    | 0%         | 0%             | 0%          |
| <b>TOTAL GLOBAL</b>                              | <b>100%</b>           | <b>0%</b>  | <b>5%</b>      | <b>30%</b>  |
|                                                  |                       |            |                |             |
| Variadores de Velocidad de BT                    |                       | MES PREVIO | AVANCE MENSUAL | MES PRÓXIMO |
| 102-DP-VFD-24210A/B/C                            |                       | ago-26     | sept-26        | oct-26      |
| Especialidad                                     | Peso por Especialidad | Actual     | Previsto       | Previsto    |
| Ingeniería                                       | 10%                   | 50%        | 100%           | 100%        |
| Acopio y Fabricación                             | 58%                   | 20%        | 100%           | 100%        |
| Transporte Marítimo                              | 30%                   | 0%         | 0%             | 10%         |
| Despacho                                         | 2%                    | 0%         | 0%             | 0%          |
| <b>TOTAL GLOBAL</b>                              | <b>100%</b>           | <b>0%</b>  | <b>68%</b>     | <b>71%</b>  |
|                                                  |                       |            |                |             |
| Variadores de Velocidad de MT                    |                       | MES PREVIO | AVANCE MENSUAL | MES PRÓXIMO |
| 102-DP-VFD-23310A/B/C                            |                       | ago-26     | sept-26        | oct-26      |
| Especialidad                                     | Peso por Especialidad | Actual     | Previsto       | Previsto    |
| Ingeniería                                       | 10%                   | 100%       | 100%           | 100%        |
| Acopio y Fabricación                             | 58%                   | 20%        | 100%           | 100%        |
| Transporte Marítimo                              | 30%                   | 0%         | 0%             | 10%         |
| Despacho                                         | 2%                    | 0%         | 0%             | 0%          |
| <b>TOTAL GLOBAL</b>                              | <b>100%</b>           | <b>0%</b>  | <b>68%</b>     | <b>71%</b>  |
|                                                  |                       |            |                |             |
| Sistema UPS y baterías                           |                       | MES PREVIO | AVANCE MENSUAL | MES PRÓXIMO |
|                                                  |                       | ago-26     | sept-26        | oct-26      |
| Especialidad                                     | Peso por Especialidad | Actual     | Previsto       | Previsto    |
| Ingeniería                                       | 20%                   | 100%       | 100%           | 100%        |
| Colocación de Sub Ordenes                        | 5%                    | 100%       | 100%           | 100%        |
| Recepción de Materiales                          | 30%                   | 60%        | 80%            | 100%        |
| Fabricación                                      | 30%                   | 0%         | 0%             | 20%         |
| Tests/Inspección                                 | 5%                    | 0%         | 0%             | 0%          |
| Despacho                                         | 10%                   | 0%         | 0%             | 0%          |
| <b>TOTAL GLOBAL</b>                              | <b>100%</b>           | <b>0%</b>  | <b>49%</b>     | <b>61%</b>  |

## CPF – LA CALERA II

| Sala eléctrica 3          |                       | MES PREVIO | AVANCE MENSUAL | MES PRÓXIMO |
|---------------------------|-----------------------|------------|----------------|-------------|
|                           |                       | ago-26     | sept-26        | oct-26      |
| Especialidad              | Peso por Especialidad | Actual     | Previsto       | Previsto    |
| Ingeniería                | 20%                   | 80%        | 100%           | 100%        |
| Colocación de Sub Ordenes | 5%                    | 100%       | 100%           | 100%        |
| Recepción de Materiales   | 30%                   | 30%        | 35%            | 50%         |
| Fabricación               | 30%                   | 0%         | 0%             | 0%          |
| Tests/Inspección          | 5%                    | 0%         | 0%             | 0%          |
| Despacho                  | 10%                   | 0%         | 0%             | 0%          |
| <b>TOTAL GLOBAL</b>       | <b>100%</b>           | <b>0%</b>  | <b>36%</b>     | <b>40%</b>  |

| Sala eléctrica 4          |                       | MES PREVIO | AVANCE MENSUAL | MES PRÓXIMO |
|---------------------------|-----------------------|------------|----------------|-------------|
|                           |                       | ago-26     | sept-26        | oct-26      |
| Especialidad              | Peso por Especialidad | Actual     | Previsto       | Previsto    |
| Ingeniería                | 20%                   | 80%        | 100%           | 100%        |
| Colocación de Sub Ordenes | 5%                    | 100%       | 100%           | 100%        |
| Recepción de Materiales   | 30%                   | 30%        | 35%            | 50%         |
| Fabricación               | 30%                   | 0%         | 0%             | 10%         |
| Tests/Inspección          | 5%                    | 0%         | 0%             | 0%          |
| Despacho                  | 10%                   | 0%         | 0%             | 0%          |
| <b>TOTAL GLOBAL</b>       | <b>100%</b>           | <b>0%</b>  | <b>36%</b>     | <b>43%</b>  |

## 8 Factores potenciales de Retraso en el Proyecto

Cambios de alcance, indefiniciones y otros factores no detectados al momento de redacción del informe.

Verificar lo indicado en el inciso 4 del presente informe con respecto a los ductos de barras,

## 9 Principales tareas adicionales del Proyecto detectadas a la fecha

Se han modificado los listados de cargas en los tableros 102-CCM-006 y 102-CCM-007 por la cual se ha emitido y aprobado una nota de cambio durante el mes de Julio.

Se ha solicitado ampliar la provisión de los equipos CCTV y Wifi. A la fecha elaboración del presente informe ABB se encentra evaluando el impacto con sus subproveedores.

## 10 Temas Pendientes Prioritarios

-Listado de pendientes a resolver:

- Control de acceso. Suministro de equipos físicos de acuerdo con cronograma de cada sala – Resp. AESA

## 11 Detalle de estado de facturación y cobranzas

| OC 45089944971            | FACTURACIÓN                |                 | COBRANZA              |                     |
|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| PROYECTO                  | Fecha Presentación Factura | USD (monto+imp) | Fecha de Pago Factura | Fecha Real de Cobro |
| <b>Certificación nº 1</b> | 8/7/2026                   | 143.589         | 7/8/2026              | Pagado              |
| <b>Certificación nº 2</b> | 24/7/2026                  | 143.589         | 24/8/2026             | Pagado              |
| <b>Certificación nº 3</b> | 23/9/2026                  | 29.343          | 23/10/2026            |                     |
| <b>Certificación nº 4</b> | 28/9/2026                  | 376.804         | 28/10/2026            |                     |
| <b>TOTAL</b>              |                            | <b>693.326</b>  |                       |                     |

| OC 45089944973            | FACTURACIÓN                |                 | COBRANZA              |                     |
|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| PROYECTO                  | Fecha Presentación Factura | USD (monto+imp) | Fecha de Pago Factura | Fecha Real de Cobro |
| <b>Certificación nº 1</b> | 8/7/2026                   | 170.739         | 7/8/2026              | Pagado              |
| <b>Certificación nº 2</b> | 24/7/2026                  | 170.739         | 24/8/2026             | Pagado              |
| <b>Certificación nº 3</b> | 23/9/2026                  | 29.343          | 23/10/2026            |                     |
| <b>Certificación nº 4</b> | 28/9/2026                  | 48.031          | 28/10/2026            |                     |
| <b>TOTAL</b>              |                            | <b>418.853</b>  |                       |                     |

Rodrigo  
Mack

Digitally signed by Rodrigo Mack  
DN: cn=Rodrigo Mack, c=CH,  
o=ABB Asea Brown Boveri Ltd,  
ou=Intune Enrollment Policy  
Date: 2026.10.05 11:49:00 -03'00'

Firma  
Responsable del Proyecto
