

Planning de Provisiones · PMS (ABB) + PCS/SCADA/SIS (Inauco)

Constructibilidad CPF2 La Calera II · Encadenamiento, puntos en común (FAT · integración · iFAT) y convergencia a precom/comisionado · Rev. 0 · 13-06-2026 · RFSU 20-DIC-2027


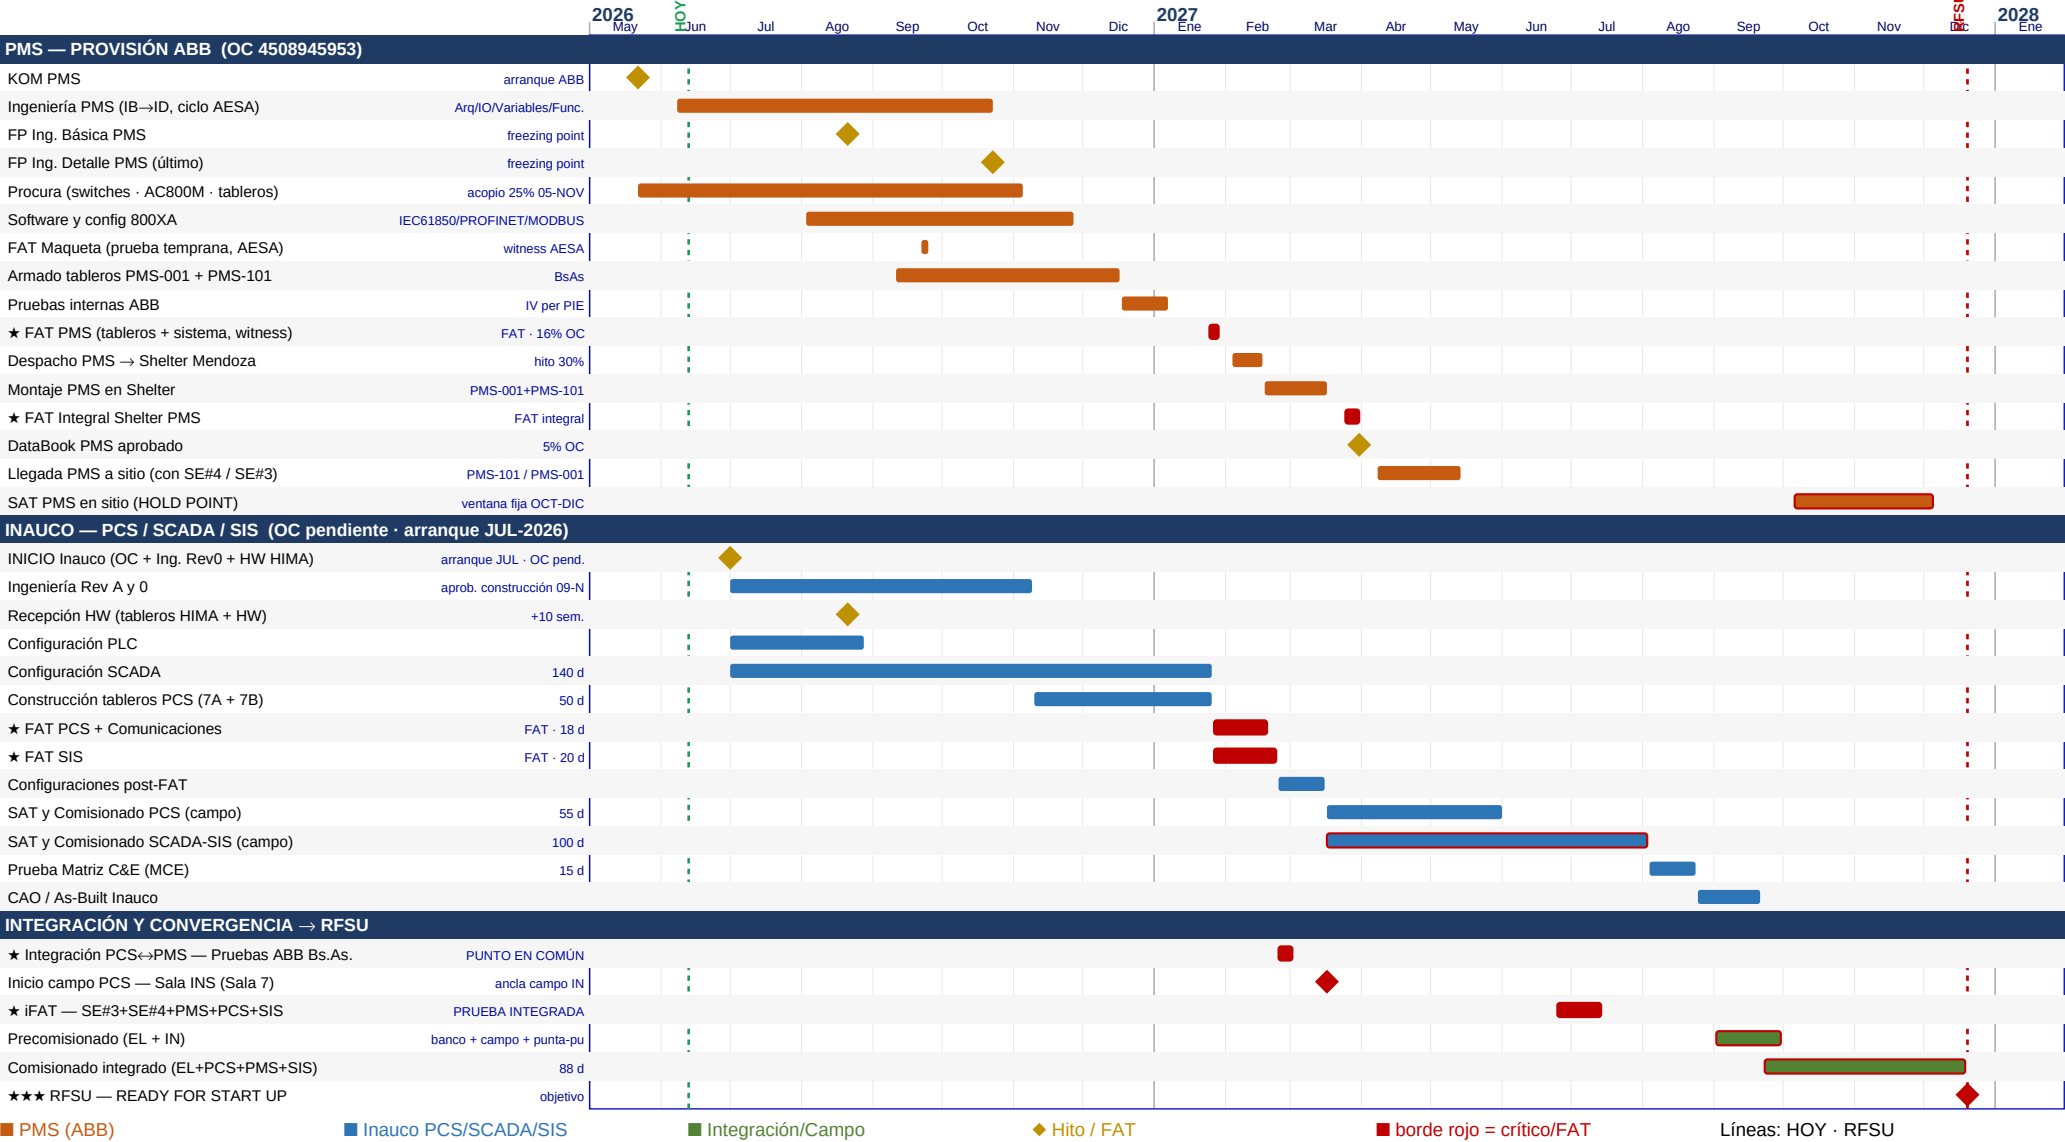


Diagrama de flujo — encadenamiento e integración de provisiones

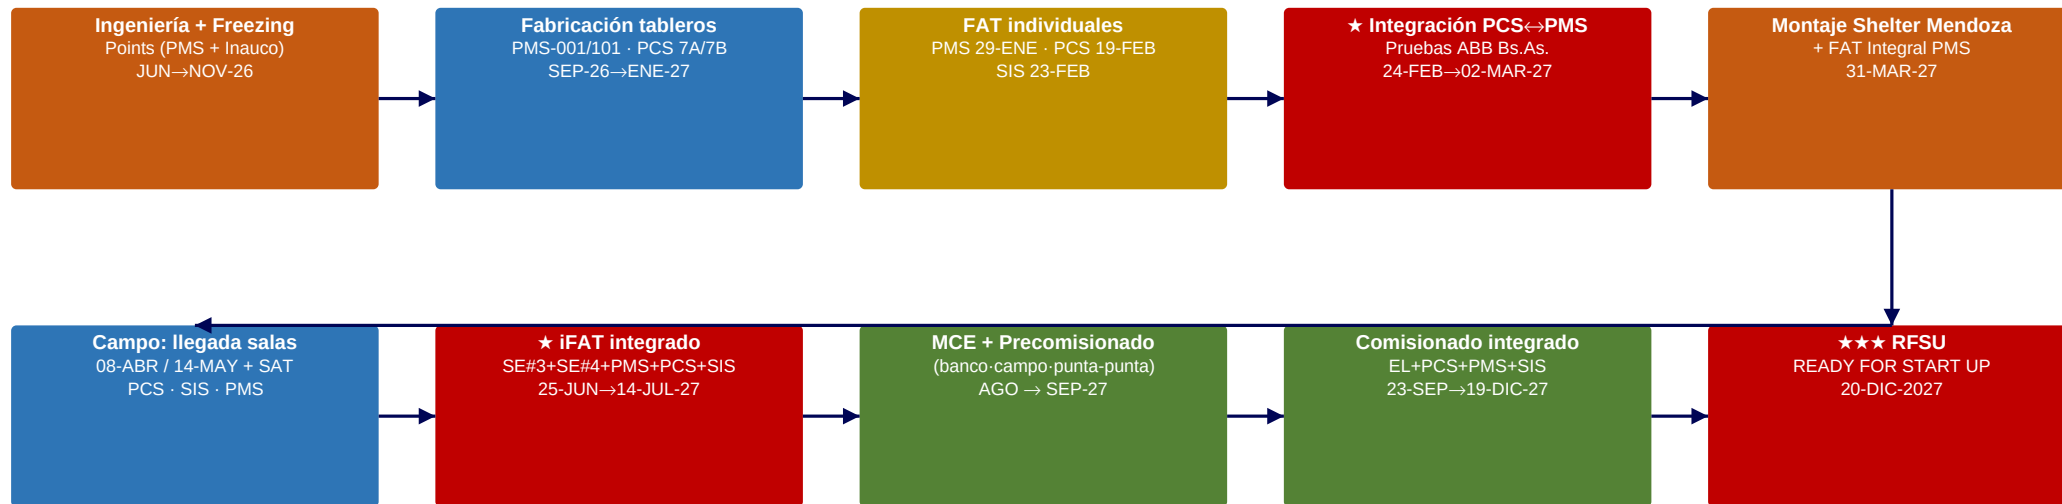

Puntos en común: FAT de cada provisión → Integración PCS↔PMS (Bs.As.) → iFAT integrado → comisionado. Convergen al RFSU 20-DIC-2027.

Planilla de tareas e hitos

Sist.	ID	Tarea / Hito	Inicio	Fin	Días	Nota
		PMS — PROVISIÓN ABB (OC 4508945953)				
PMS (ABB)	◆	KOM PMS	22-05-26		hito	arranque ABB
PMS (ABB)	PP-E	Ingeniería PMS (IB→ID, ciclo AESA)	08-06-26	23-10-26	138	Arq/IO/Variables/Func.
PMS (ABB)	◆	FP Ing. Básica PMS	21-08-26		hito	freezing point
PMS (ABB)	◆	FP Ing. Detalle PMS (último)	23-10-26		hito	freezing point
PMS (ABB)	PP-PR	Procura (switches · AC800M · tableros)	22-05-26	05-11-26	168	acopio 25% 05-NOV
PMS (ABB)	PP-SW	Software y config 800XA	03-08-26	27-11-26	117	IEC61850/PROFINET/MODBUS
PMS (ABB)	PP-MQ	FAT Maqueta (prueba temprana, AESA)	22-09-26	25-09-26	4	witness AESA
PMS (ABB)	PP-FAB	Armado tableros PMS-001 + PMS-101	11-09-26	17-12-26	98	BsAs
PMS (ABB)	PP-TI	Pruebas internas ABB	18-12-26	07-01-27	21	IV per PIE
PMS (ABB)	★FAT	★ FAT PMS (tableros + sistema, witness) ■ crítico	25-01-27	29-01-27	5	FAT · 16% OC
PMS (ABB)	PP-DES	Despacho PMS → Shelter Mendoza	04-02-27	17-02-27	14	hito 30%
PMS (ABB)	PP-SH	Montaje PMS en Shelter	18-02-27	17-03-27	28	PMS-001+PMS-101
PMS (ABB)	★FATi	★ FAT Integral Shelter PMS ■ crítico	25-03-27	31-03-27	7	FAT integral
PMS (ABB)	◆	DataBook PMS aprobado	31-03-27		hito	5% OC
PMS (ABB)	LLEG	Llegada PMS a sitio (con SE#4 / SE#3)	08-04-27	14-05-27	37	PMS-101 / PMS-001
PMS (ABB)	SATP	SAT PMS en sitio (HOLD POINT) ■ crítico	06-10-27	05-12-27	61	ventana fija OCT-DIC
		INAUCO — PCS / SCADA / SIS (OC pendiente · arranque JUL-2026)				
Inauco	◆	INICIO Inauco (OC + Ing. Rev0 + HW HIMA)	01-07-26		hito	arranque JUL · OC pend.
Inauco	ING	Ingeniería Rev A y 0	01-07-26	09-11-26	132	aprob. construcción 09-NOV
Inauco	◆	Recepción HW (tableros HIMA + HW)	21-08-26		hito	+10 sem.
Inauco	PLC	Configuración PLC	01-07-26	28-08-26	59	
Inauco	SCADA	Configuración SCADA	01-07-26	26-01-27	210	140 d
Inauco	TAB	Construcción tableros PCS (7A + 7B)	10-11-26	26-01-27	78	50 d
Inauco	★FATp	★ FAT PCS + Comunicaciones ■ crítico	27-01-27	19-02-27	24	FAT · 18 d
Inauco	★FATs	★ FAT SIS ■ crítico	27-01-27	23-02-27	28	FAT · 20 d

Sist.	ID	Tarea / Hito	Inicio	Fin	Días	Nota
Inauco	POST	Configuraciones post-FAT	24-02-27	16-03-27	21	
Inauco	SATpcs	SAT y Comisionado PCS (campo)	17-03-27	01-06-27	77	55 d
Inauco	SATsis	SAT y Comisionado SCADA-SIS (campo) ■ crítico	17-03-27	03-08-27	140	100 d
Inauco	MCE	Prueba Matriz C&E (MCE)	04-08-27	24-08-27	21	15 d
Inauco	CAO	CAO / As-Built Inauco	25-08-27	21-09-27	28	
		INTEGRACIÓN Y CONVERGENCIA → RFSU				
Integración	★INT	★ Integración PCS↔PMS — Pruebas ABB Bs.As. ■ crítico	24-02-27	02-03-27	7	PUNTO EN COMÚN
Integración	◆	Inicio campo PCS — Sala INS (Sala 7)	17-03-27		hito	ancla campo IN
Integración	★iFAT	★ iFAT — SE#3+SE#4+PMS+PCS+SIS ■ crítico	25-06-27	14-07-27	20	PRUEBA INTEGRADA
Integración	PREC	Precomisionado (EL + IN) ■ crítico	02-09-27	30-09-27	29	banco + campo + punta-punta
Integración	COM	Comisionado integrado (EL+PCS+PMS+SIS) ■ crítico	23-09-27	19-12-27	88	88 d
Integración	★RFSU	★★★ RFSU — READY FOR START UP	20-12-27		hito	objetivo

Puntos en común, supuestos y objetivo

PUNTOS EN COMÚN (deben comunicarse, probarse e integrarse)	
FAT individuales	FAT PMS (25-29-ENE-27) · FAT PCS+Comunicaciones (27-ENE→19-FEB) · FAT SIS (27-ENE→23-FEB). Cada provisión valida en fábrica antes de integrar.
Integración PCS↔PMS	Pruebas en ABB Bs.As. (24-FEB→02-MAR-27): se prueba la comunicación PCS (Inauco) ↔ PMS (ABB) por Modbus TCP/IP. Punto de convergencia temprano.
iFAT (prueba integrada)	Integración SE#3+SE#4+PMS+PCS+SIS (25-JUN→14-JUL-27) con todos los vendors (ABB+Inauco+HIMA+AESA). Valida el conjunto antes del comisionado.
Campo / convergencia	SAT PCS (17-MAR→01-JUN) · SAT SCADA-SIS (17-MAR→03-AGO) · MCE (04-24-AGO) · SAT PMS (06-OCT→05-DIC) → Comisionado integrado (23-SEP→19-DIC) → RFSU.

SUPUESTOS Y OBJETIVO	
Inauco — arranque JUL-2026	La OC Inauco aún no se emitió; el planning se ancla en INICIO 01-JUL-2026 (OC + ingeniería Rev0 + recepción tableros HIMA). Si la OC slipa, todo el encadenamiento Inauco se desplaza.
PMS — base	Cronograma ABB actualizado 09-JUN-2026 (OC 4508945953). FAT PMS 29-ENE-27, FAT Integral Shelter 31-MAR-27, SAT PMS en sitio OCT-DIC-27 (HOLD POINT).
RFSU objetivo	20-DIC-2027 (planning integrado). El cronograma ABB contempla RFSU contractual 31-ENE-2028 como respaldo (~6 semanas de margen).
Riesgo de convergencia	La integración PCS↔PMS depende de FAT PMS y FAT PCS/SIS completados; el iFAT depende de salas en sitio (SE#3 14-MAY) y PMS integrado. Cualquier atraso de una provisión arrastra a la otra.
