AESA	CALIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE TERCEROS
APROBADO	☐
APROBADO CON OBS.	☐
APROBADO CON OBS. MENORES	☐
VISTO	☐
RECHAZADO	☐

LA APROBACIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO EXIME AL PROVEEDOR DE SU RESPONSABILIDAD EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS ACORDADAS Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO A PROVEER.

REVISOR ..... FECHA .....

RESPONSABLE ..... FECHA .....

AESA	REVISIÓN MULTIDISCIPLINARIA	
ESPECIALIDAD	FIRMA	FECHA
CAÑERÍAS Y LAYOUT		
CIVIL Y ESTRUCTURAS METÁLICAS		
ELECTRICIDAD		
EQUIPOS MECÁNICOS Y CALDERERÍA		
INSPECCIÓN		
INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL		
PRECOM, COM Y PEM		
PROCESOS		
SEGURIDAD EN EL DISEÑO		
TRANSPORTE E IZAJES		

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	EJE.	REV.	APR.
0	PARA CONSTRUCCIÓN	23/10/2026	K.S	K.S	AESA
A	PARA APROBACIÓN	24/8/2026	K. Sedlarik	K. Sedlarik	M. Tournier

AESA

5155-00-0029-VE-CA-PG-001

INAUCO INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

pluspetrol

FACILITIES ENGINEERING & MAJOR PROJECTS

PROYECTO: LA CALERA CPF2 – FASE 2

TITULO:

INAUCO - Sistema de Control (DCS)

Cronograma de Ingeniería y Suministro

Toda la información contenida en la presente documentación es confidencial y de propiedad de Pluspetrol, siendo prohibida su reproducción o copia, total o parcial, sin autorización previa.


ESC: N/A

DOCUMENTO Nº: **P00001-D-AESA-ACAL-00102-INAU-SYC-PP-Q-0001**

REVISION: **0**


REEMPLAZA: -

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
1		**CPF2 FASE 2 LA CALERA. Sistema de Control (DCS). Obra Inauco 129-008. OC AESA 4509023773**	**334 días**	**mar 28/7/26**	**mar 7/12/27**	**6%**
2		**1. INICIO DEL PROYECTO**	**0 días**	**mar 28/7/26**	**mar 28/7/26**	**0%**
3		**2. REQUISITOS**	**190 días**	**mar 28/7/26**	**mar 11/5/27**	**0%**
4		REQUISITO 0A: Recepción de OC MO + MAT AESA	0 días	mar 28/7/26	mar 28/7/26	100%
5		REQUISITO 0B: Recepción de OC SEGUROS AESA	0 días	mar 28/7/26	mar 28/7/26	0%
6		REQUISITO 0C: Recepción de OC MO CAMPO AESA	0 días	mar 28/7/26	mar 28/7/26	0%
7		**REQUISITO 1: Recepción de ingeniería**	**80 días**	**vie 14/8/26**	**vie 11/12/26**	**0%**
8		Recepción de ingeniería 14/08/26: P&ID, Listado de señales del proyecto, Listado de señales existente, Listado de asignaciones existente, Diagrama de conexionado Remota 5 existente, Diagrama de conexionado Remota 6 existente	0 días	vie 14/8/26	vie 14/8/26	100%
9		Recepción de ingeniería 21/08/26: Diagrama de conexionado de JB, Diagrama de bloques (Arquitectura), Diagrama de patcheo de fibra óptica	0 días	vie 21/8/26	vie 21/8/26	66%
10		Recepción de ingeniería 09/10/26: Filosofía de Operación, Matriz Causa-Efecto	0 días	vie 9/10/26	vie 9/10/26	50%
11		Recepción de ingeniería 30/10/26: Databook Vendors, Documentación HIMA (tabla Modbus y print de configuración)	0 días	vie 30/10/26	vie 30/10/26	0%
12		Recepción de ingeniería 11/12/26: Listado de alarmas de SCADA del proyecto	0 días	vie 11/12/26	vie 11/12/26	0%
13		REQUISITO 2: Recepción de tableros HIMA (Marshallings finalizados) en base Inauco	0 días	lun 25/1/27	lun 25/1/27	0%
14		REQUISITO 3: Freezing point. Aprobación de ingeniería p/construcción	0 días	jue 19/11/26	jue 19/11/26	0%
15		REQUISITO 4: Aprobación de procedimientos FAT (Rev 0)	0 días	mié 24/2/27	mié 24/2/27	0%
16		REQUISITO 5: Requisitos para inicio de comisionado (ver Oferta)	0 días	mar 11/5/27	mar 11/5/27	0%
17		REQUISITO 6: Recepción de HW (materiales críticos: 10/12 semanas desde OC)	0 días	jue 26/11/26	jue 26/11/26	0%
18		**3. DESARROLLO**	**288 días**	**lun 24/8/26**	**mar 26/10/27**	**6%**
19		**3.1. INGENIERÍA**	**199 días**	**lun 24/8/26**	**vie 18/6/27**	**0%**
20		**3.1.1. Documentos de tableros**	**180 días**	**lun 24/8/26**	**vie 21/5/27**	**0%**
21		**3.1.1.1. Emisiones Rev A**	**139 días**	**lun 24/8/26**	**vie 19/3/27**	**0%**
22		Emisión Rev A 24/08/26: 3 documentos (IN-LD-001, CA-PG-001, CA-PE-001)	0 días	lun 24/8/26	lun 24/8/26	100%
23		Emisión Rev A 11/09/26: 2 documentos (CA-PG-002, IN-LS-001)	0 días	vie 11/9/26	vie 11/9/26	100%
24		Emisión Rev A 18/09/26: 4 documentos (IN-PL-001, IN-LY-001, EL-MC-001, IN-LR-001)	0 días	vie 18/9/26	vie 18/9/26	100%
25		Emisión Rev A 25/09/26: 12 documentos (IN-LY-002, IN-LY-003, EL-MC-002, EL-MC-003, IN-DC-001, IN-DC-002, IN-DC-003, IN-DC-004, IN-DC-005, IN-DC-006, IN-DC-007)	0 días	vie 25/9/26	vie 25/9/26	100%
26		Emisión Rev A 02/10/26: 6 documentos (IN-LY-004, IN-LY-005, IN-LY-006, EL-MC-004, EL-MC-005, EL-MC-006)	0 días	vie 2/10/26	vie 2/10/26	100%
27		Emisión Rev A 16/10/26: 13 documentos (CA-PR-001, CA-PR-002, CA-PR-003, CA-PR-004, CA-PR-005, CA-PR-007, CA-PR-008, CA-PR-009, CA-PR-010, CA-PR-011, CA-PR-012, CA-PR-013, CA-PR-014)	0 días	vie 16/10/26	vie 16/10/26	77%
28		Emisión Rev A 19/03/27: 3 documentos (CA-CE-001, CA-CE-002, CA-LP-001)	0 días	vie 19/3/27	vie 19/3/27	0%
29		**3.1.1.2. Emisiones Rev 0**	**135 días**	**lun 21/9/26**	**vie 16/4/27**	**0%**
30		Emisión Rev 0 21/09/26: 3 documentos (IN-LD-001, CA-PG-001, CA-PE-001)	0 días	lun 21/9/26	lun 21/9/26	67%
31		Emisión Rev 0 02/10/26: 1 documentos (CA-PG-002)	0 días	vie 2/10/26	vie 2/10/26	100%
32		Emisión Rev 0 09/10/26: 1 documentos (IN-LS-001)	0 días	vie 9/10/26	vie 9/10/26	100%
33		Emisión Rev 0 16/10/26: 6 documentos (IN-PL-001, IN-LY-001, EL-MC-001, IN-DC-001, IN-DC-005, IN-LR-001)	0 días	vie 16/10/26	vie 16/10/26	67%
34		Emisión Rev 0 23/10/26: 10 documentos (IN-LY-002, IN-LY-003, EL-MC-002, EL-MC-003, IN-DC-002, IN-DC-003, IN-DC-004, IN-DC-006, IN-DC-007, IN-DC-008)	0 días	vie 23/10/26	vie 23/10/26	0%
35		Emisión Rev 0 30/10/26: 6 documentos (IN-LY-004, IN-LY-005, IN-LY-006, EL-MC-004, EL-MC-005, EL-MC-006)	0 días	vie 30/10/26	vie 30/10/26	0%
36		Emisión Rev 0 13/11/26: 13 documentos (CA-PR-001, CA-PR-002, CA-PR-003, CA-PR-004, CA-PR-005, CA-PR-007, CA-PR-008, CA-PR-009, CA-PR-010, CA-PR-011, CA-PR-012, CA-PR-013, CA-PR-014)	0 días	vie 13/11/26	vie 13/11/26	0%
37		Emisión Rev 0 16/04/27: 3 documentos (CA-CE-001, CA-CE-002, CA-LP-001)	0 días	vie 16/4/27	vie 16/4/27	0%
38		**3.1.1.3. Emisiones Rev CAF**	**0 días**	**vie 21/5/27**	**vie 21/5/27**	**0%**
39		Emisión Rev CAF 21/05/27: 43 documentos (IN-LD-001, CA-PG-001, CA-PG-002, IN-PL-001, IN-LY-001, IN-LY-002, IN-LY-003, IN-LY-004, IN-LY-005, IN-LY-006, EL-MC-001, EL-MC-002, EL-MC-003, EL-MC-004, EL-MC-005, EL-MC-006, IN-LS-001, IN-DC-001, IN-DC-002, IN-DC	0 días	vie 21/5/27	vie 21/5/27	0%
40		**3.1.2. Documentos de configuración**	**61 días**	**vie 19/2/27**	**vie 21/5/27**	**0%**
41		**3.1.2.1. Emisiones Rev A**	**15 días**	**vie 19/2/27**	**vie 12/3/27**	**0%**
42		Emisión Rev A 19/02/27: 9 documentos (IN-ET-001, IN-ET-002, IN-MO-001, IN-MO-002, IN-LS-002, IN-LS-003, IN-LS-004, CA-PR-006, CA-PR-015)	0 días	vie 19/2/27	vie 19/2/27	0%
43		Emisión Rev A 12/03/27: 3 documentos (IN-PL-002, IN-PL-003, IN-MD-001)	0 días	vie 12/3/27	vie 12/3/27	0%
44		**3.1.2.2. Emisiones Rev 0**	**11 días**	**vie 19/3/27**	**vie 9/4/27**	**0%**
45		Emisión Rev 0 19/03/27: 10 documentos (IN-BD-001, IN-ET-001, IN-ET-002, IN-MO-001, IN-MO-002, IN-LS-002, IN-LS-003, IN-LS-004, CA-PR-006, CA-PR-015)	0 días	vie 19/3/27	vie 19/3/27	0%
46		Emisión Rev 0 09/04/27: 3 documentos (IN-PL-002, IN-PL-003, IN-MD-001)	0 días	vie 9/4/27	vie 9/4/27	0%
47		**3.1.2.3. Emisiones Rev CAF**	**0 días**	**vie 21/5/27**	**vie 21/5/27**	**0%**
48		Emisión Rev CAF 21/05/27: 13 documentos (IN-PL-002, IN-PL-003, IN-BD-001, IN-ET-001, IN-ET-002, IN-MO-001, IN-MO-002, IN-LS-002, IN-LS-003, IN-LS-004, IN-MD-001, CA-PR-006, CA-PR-015)	0 días	vie 21/5/27	vie 21/5/27	0%
49		**3.1.3. Data Book**	**19 días**	**vie 21/5/27**	**vie 18/6/27**	**0%**
50		Emisión Rev A Data Book 21/05/27	0 días	vie 21/5/27	vie 21/5/27	0%
51		Emisión Rev 0 Data Book 18/06/27	0 días	vie 18/6/27	vie 18/6/27	0%
52		**3.2. CONSTRUCCIÓN DE TABLEROS (según Cronograma de Fabricación PG-002 Rev 1)**	**49 días**	**vie 27/11/26**	**mar 16/2/27**	**0%**
53		Inicio de construcción de tableros	0 días	vie 27/11/26	vie 27/11/26	0%
54		**3.2.2. CPF2-PCS-SC-07a: Control de procesos + Marshalling (3 gabinetes 2000×1000×600)**	**40 días**	**vie 27/11/26**	**vie 29/1/27**	**0%**
55		Estudio y revisión de ingeniería	1 día	vie 27/11/26	vie 27/11/26	0%
56		Recepción y verificación de materiales	1 día	lun 30/11/26	lun 30/11/26	0%
57		Fabricación de tablero (adecuación de gabinetes, instalación de elementos, tendido de cables)	30 días	mar 1/12/26	mar 19/1/27	0%
58		Pruebas y verificación interna (PreFAT)	3 días	mié 20/1/27	vie 22/1/27	0%
59		Liberación de pendientes	5 días	lun 25/1/27	vie 29/1/27	0%
60		**3.2.3. CPF2-PCS-SC-07b: Control de procesos + Marshalling (2 gabinetes 2000×1000×600)**	**30 días**	**vie 27/11/26**	**vie 15/1/27**	**0%**
61		Estudio y revisión de ingeniería	1 día	vie 27/11/26	vie 27/11/26	0%
62		Recepción y verificación de materiales	1 día	lun 30/11/26	lun 30/11/26	0%
63		Fabricación de tablero (adecuación de gabinetes, instalación de elementos, tendido de cables)	20 días	mar 1/12/26	mar 5/1/27	0%
64		Pruebas y verificación interna (PreFAT)	3 días	mié 6/1/27	vie 8/1/27	0%
65		Liberación de pendientes	5 días	lun 11/1/27	vie 15/1/27	0%
66		**3.2.4. CPF-COM-07: Comunicaciones (rack 19" 40U)**	**9 días**	**vie 22/1/27**	**mié 3/2/27**	**0%**
67		Estudio y revisión de ingeniería	1 día	vie 22/1/27	vie 22/1/27	0%
68		Recepción y verificación de materiales	1 día	lun 25/1/27	lun 25/1/27	0%
69		Fabricación de tablero (adecuación de gabinetes, instalación de elementos, tendido de cables)	5 días	mar 26/1/27	lun 1/2/27	0%
70		Pruebas y verificación interna (PreFAT)	1 día	mar 2/2/27	mar 2/2/27	0%
71		Liberación de pendientes	1 día	mié 3/2/27	mié 3/2/27	0%
72		Cierre de construcción de tableros	0 días	mar 16/2/27	mar 16/2/27	0%
73		**3.3. CONFIGURACIÓN BASE**	**175 días**	**mié 26/8/26**	**lun 17/5/27**	**11%**
74		PLC y comunicaciones	140 días	mié 26/8/26	mar 23/3/27	12%
75		SCADA	140 días	mié 26/8/26	mar 23/3/27	12%
76		Configuraciones post FAT	15 días	mar 27/4/27	lun 17/5/27	0%
77		**3.4. ENSAYOS**	**98 días**	**mar 1/12/26**	**mar 4/5/27**	**0%**
78		Pruebas ABB en Buenos Aires	2 días	mar 1/12/26	mié 2/12/26	0%
79		Pre-iFAT interna (pruebas integradas en Inauco, previas a la FAT con el cliente)	26 días	mar 16/2/27	mar 23/3/27	0%
80		FAT PCS + Comunicaciones (Inauco Neuquén)	18 días	lun 29/3/27	jue 22/4/27	0%
81		FAT SIS (integración HIMA, Inauco Neuquén)	20 días	lun 29/3/27	lun 26/4/27	0%
82		Fin de FAT integral	0 días	lun 26/4/27	lun 26/4/27	0%
83		Liberación y entrega de tableros (sobre camión de AESA, Inauco Neuquén)	0 días	mar 4/5/27	mar 4/5/27	0%
84		**3.5. CAMPO (yacimiento La Calera)**	**111 días**	**mar 18/5/27**	**mar 26/10/27**	**0%**
85		SAT y comisionado PCS	53 días	mar 18/5/27	mar 3/8/27	0%
86		SAT y comisionado SCADA / SIS	97 días	mar 18/5/27	mar 5/10/27	0%
87		Prueba MCE (matriz causa-efecto)	14 días	mié 6/10/27	mar 26/10/27	0%
88		**4. FIN DEL PROYECTO (cierre de documentación)**	**0 días**	**mar 7/12/27**	**mar 7/12/27**	**0%**

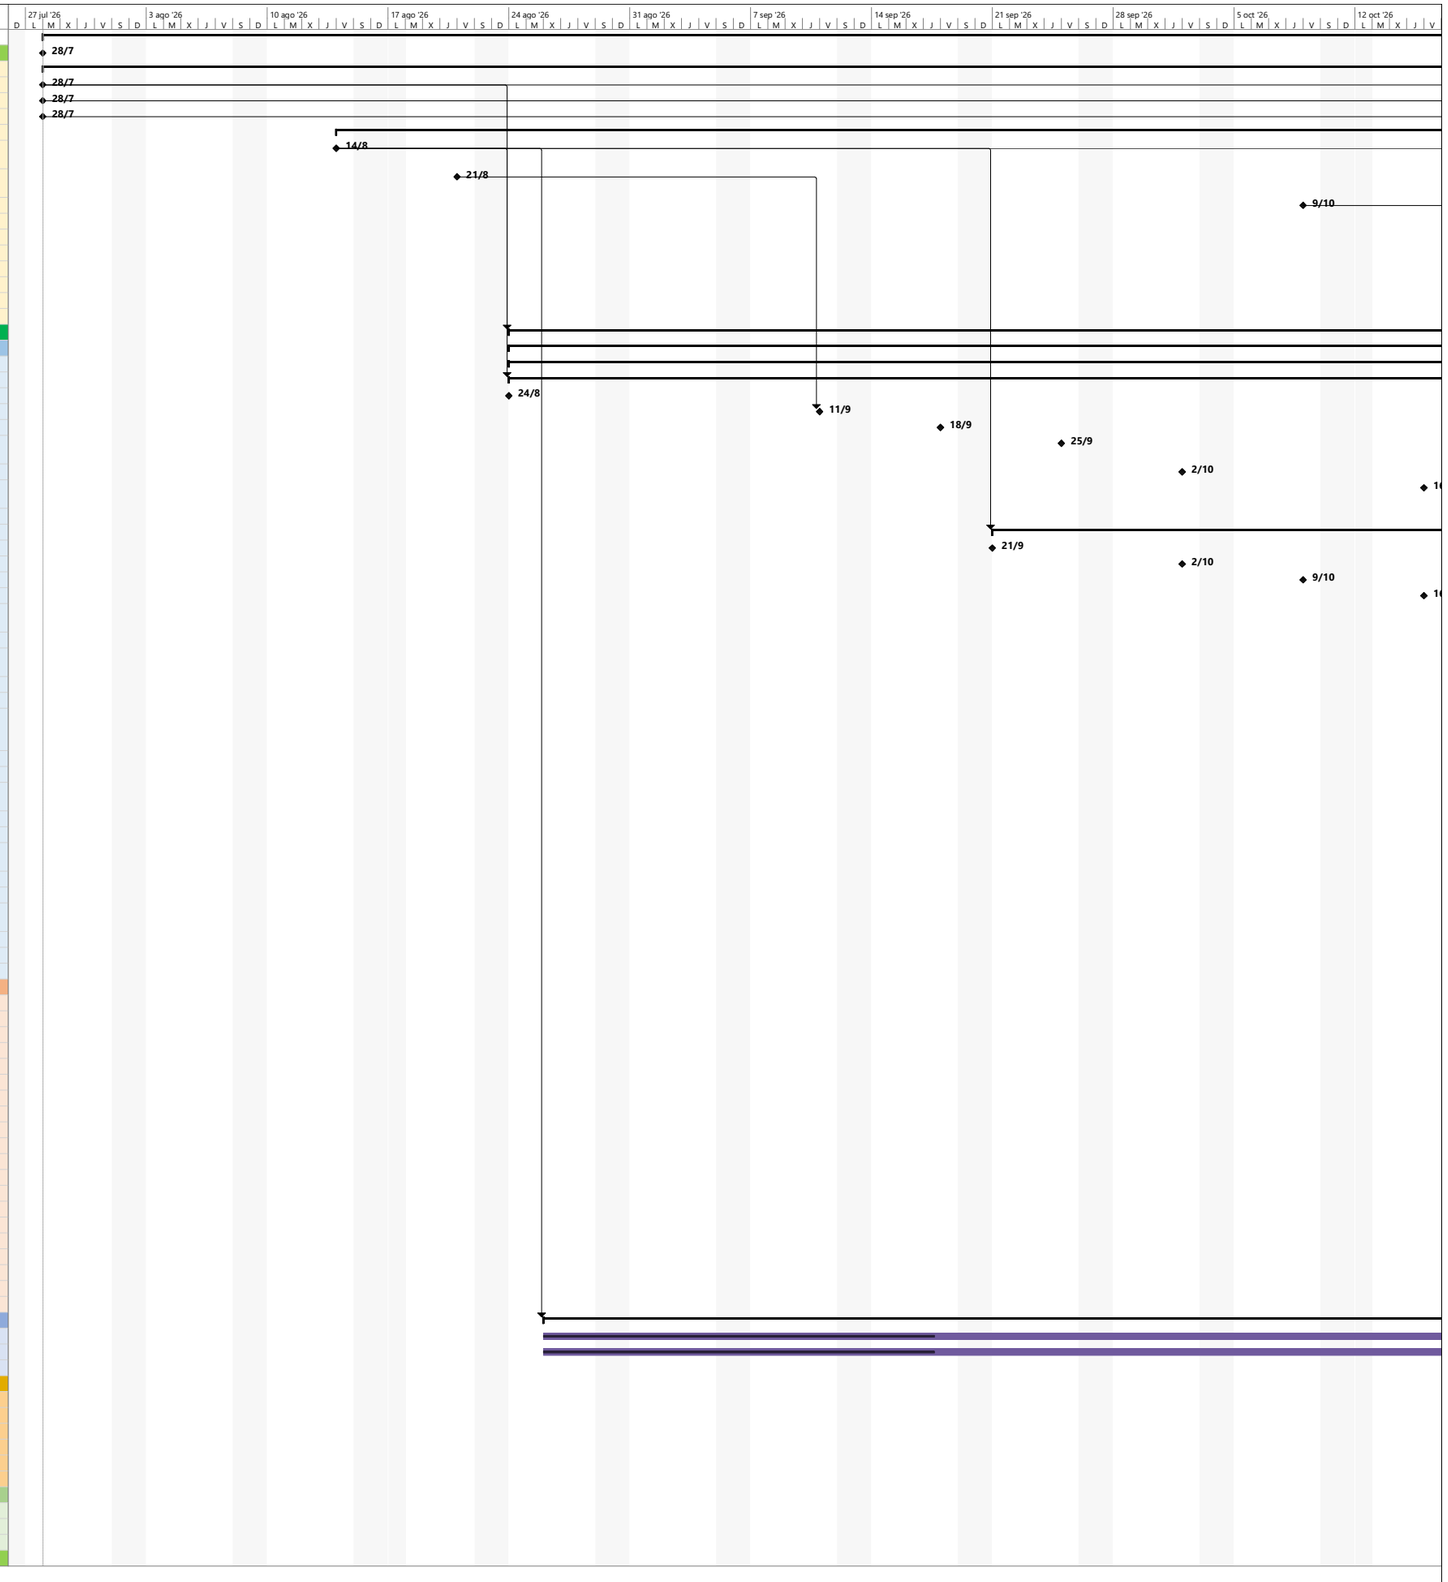


Proyecto: CPF2 FASE 2 - LA CAL
Fecha: vie 23/10/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso

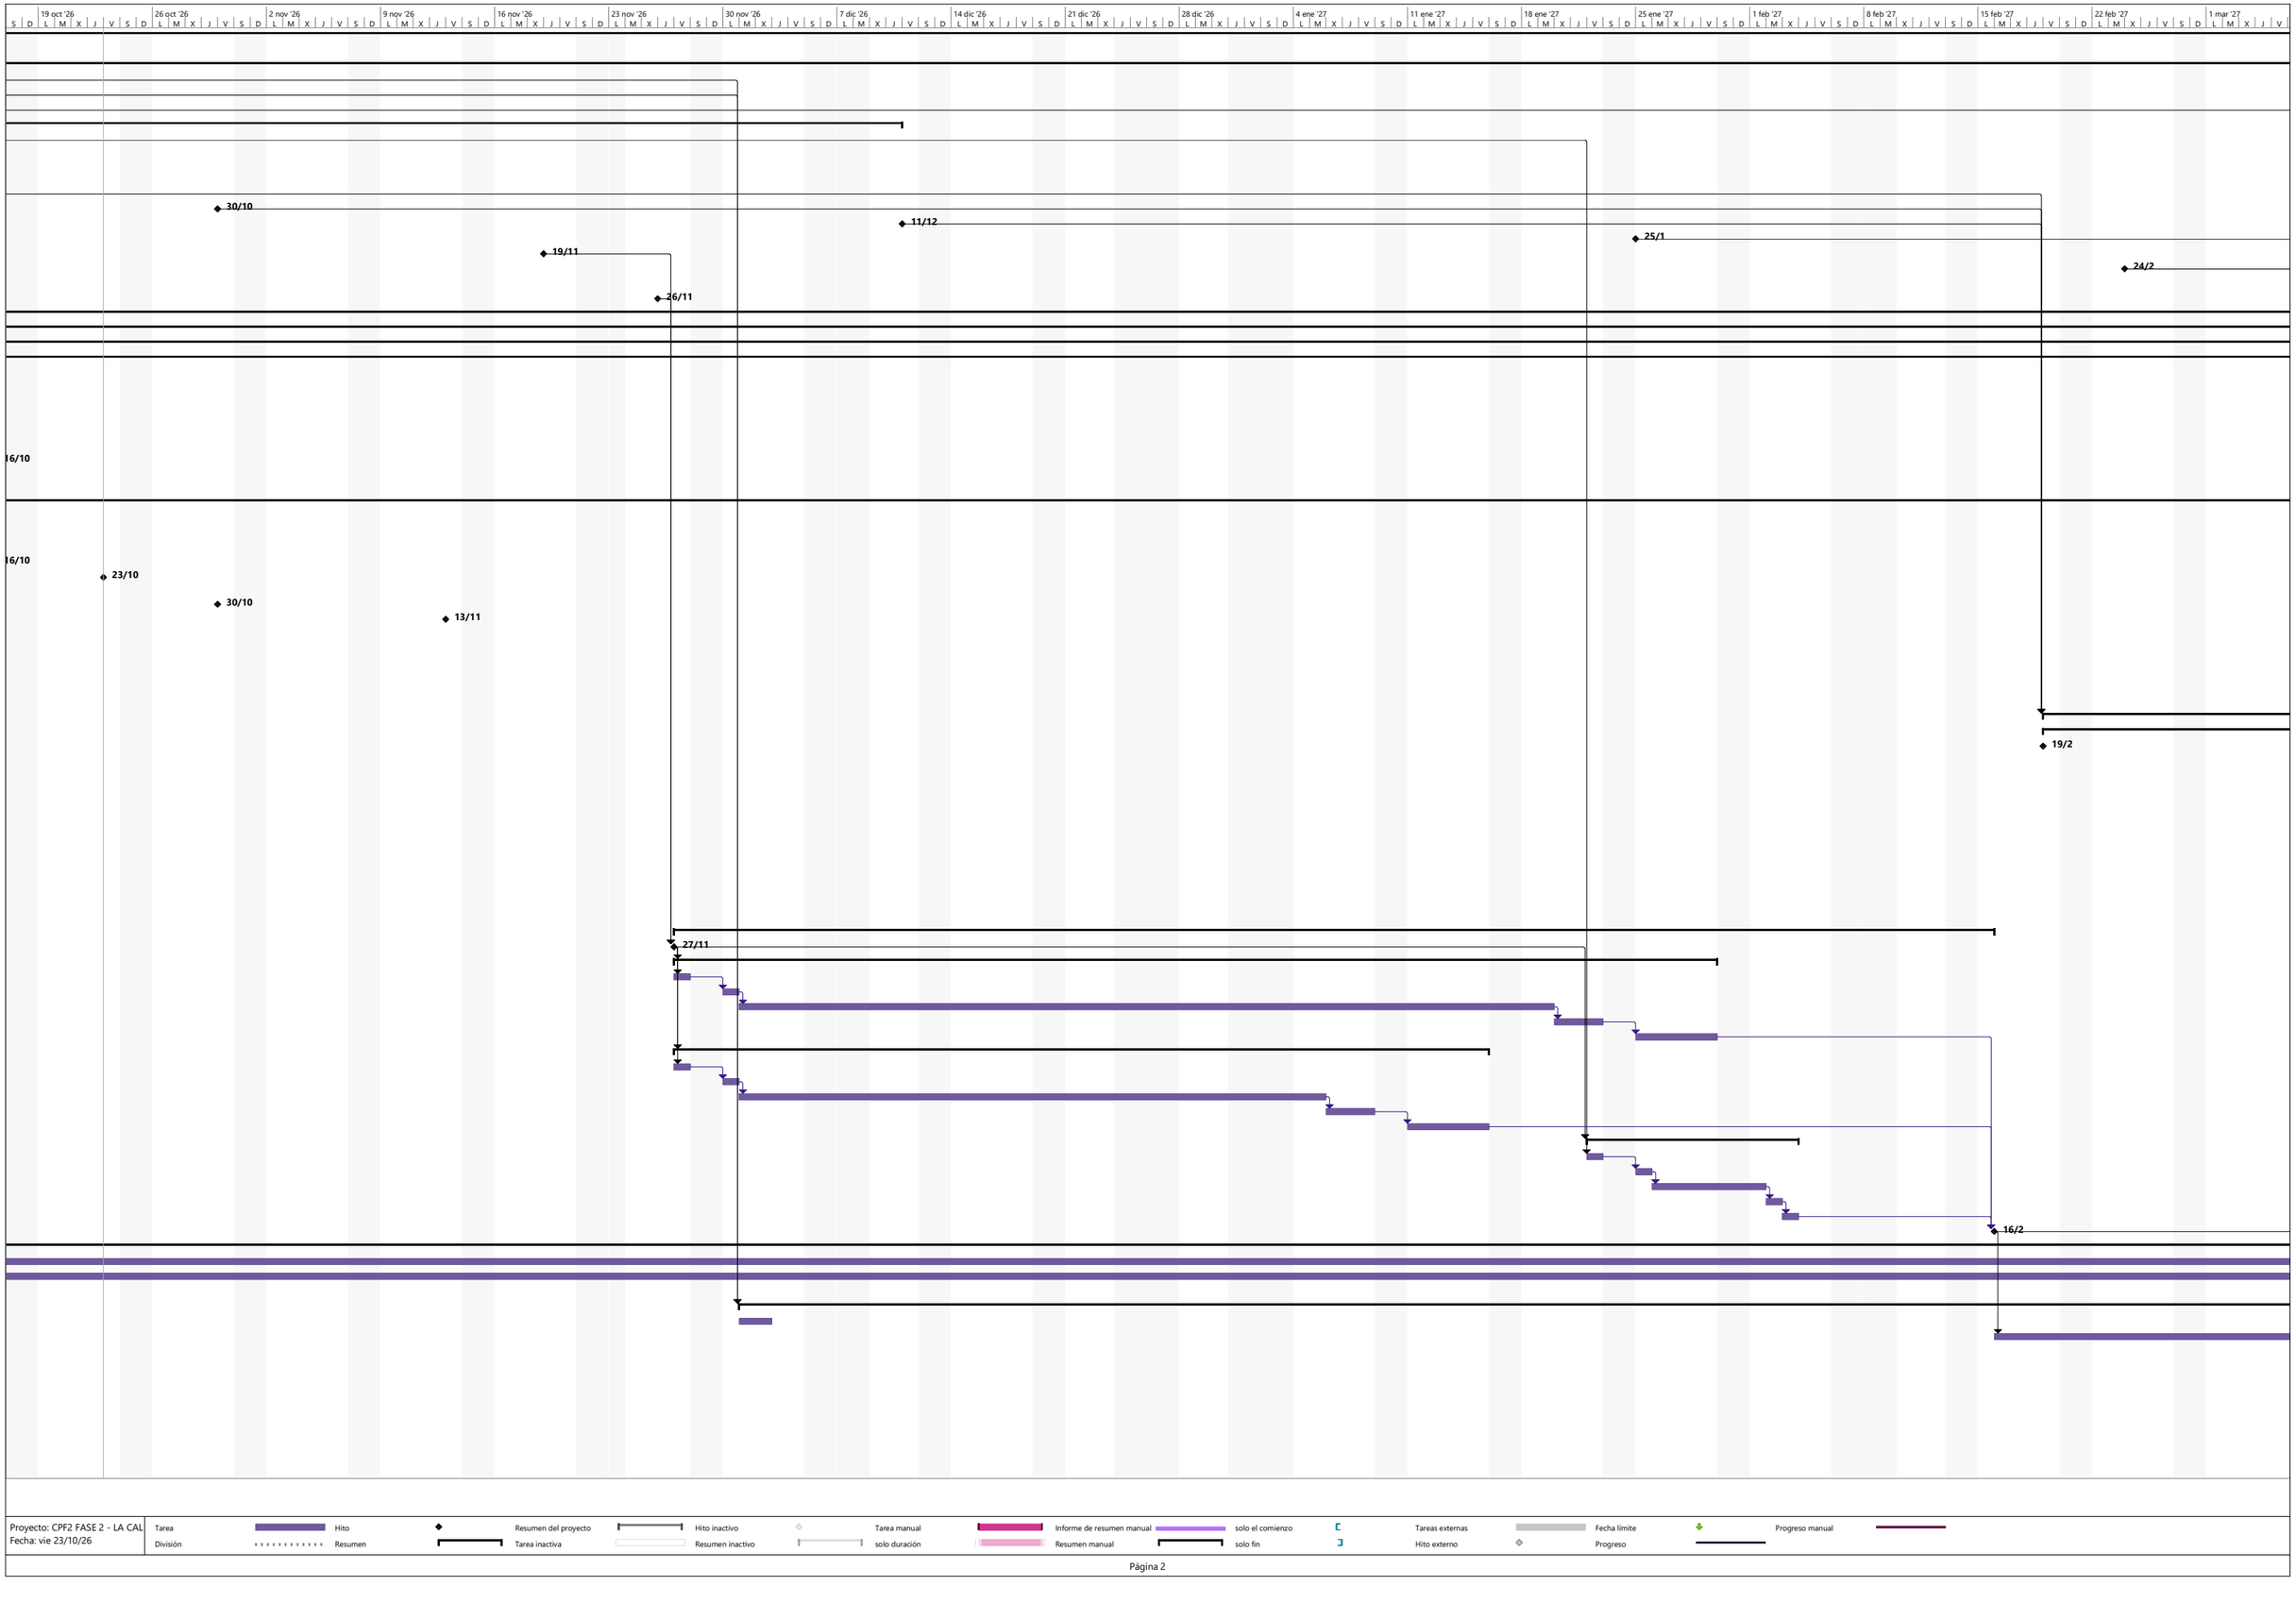


Proyecto: CPF2 FASE 2 - LA CAL
Fecha: vie 23/10/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso

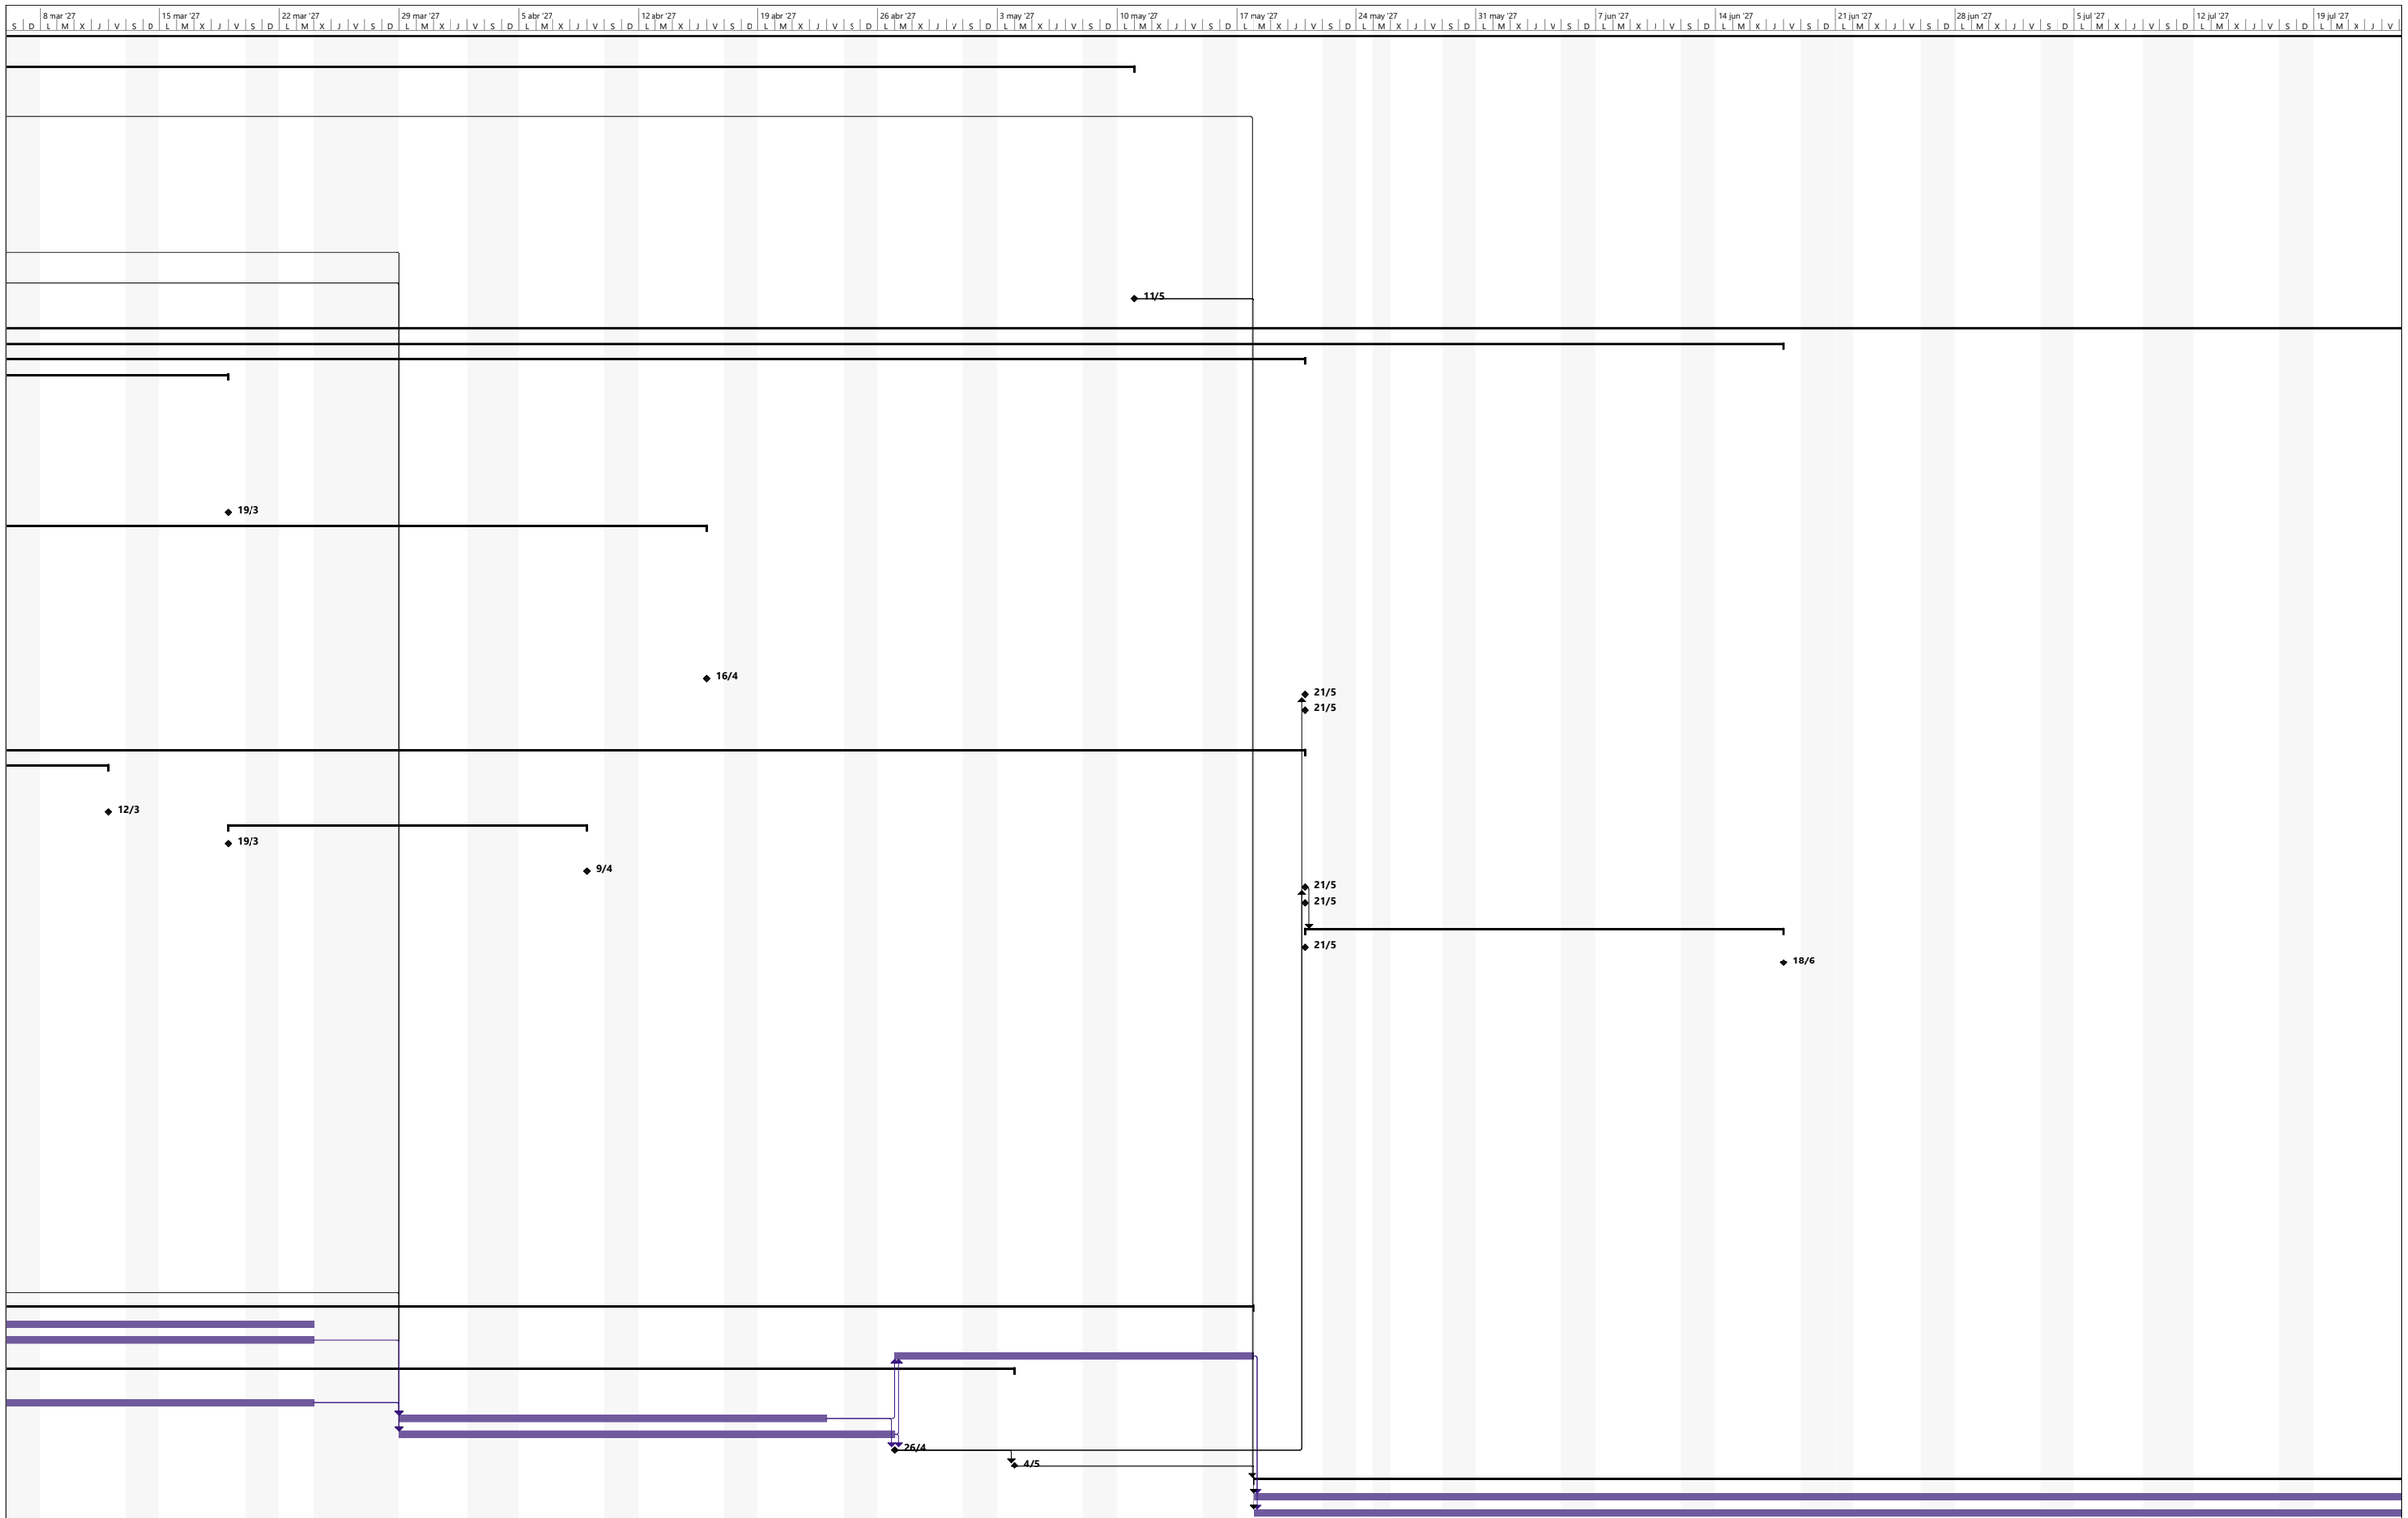

Proyecto: CPF2 FASE 2 - LA CAL
Fecha: vie 23/10/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso

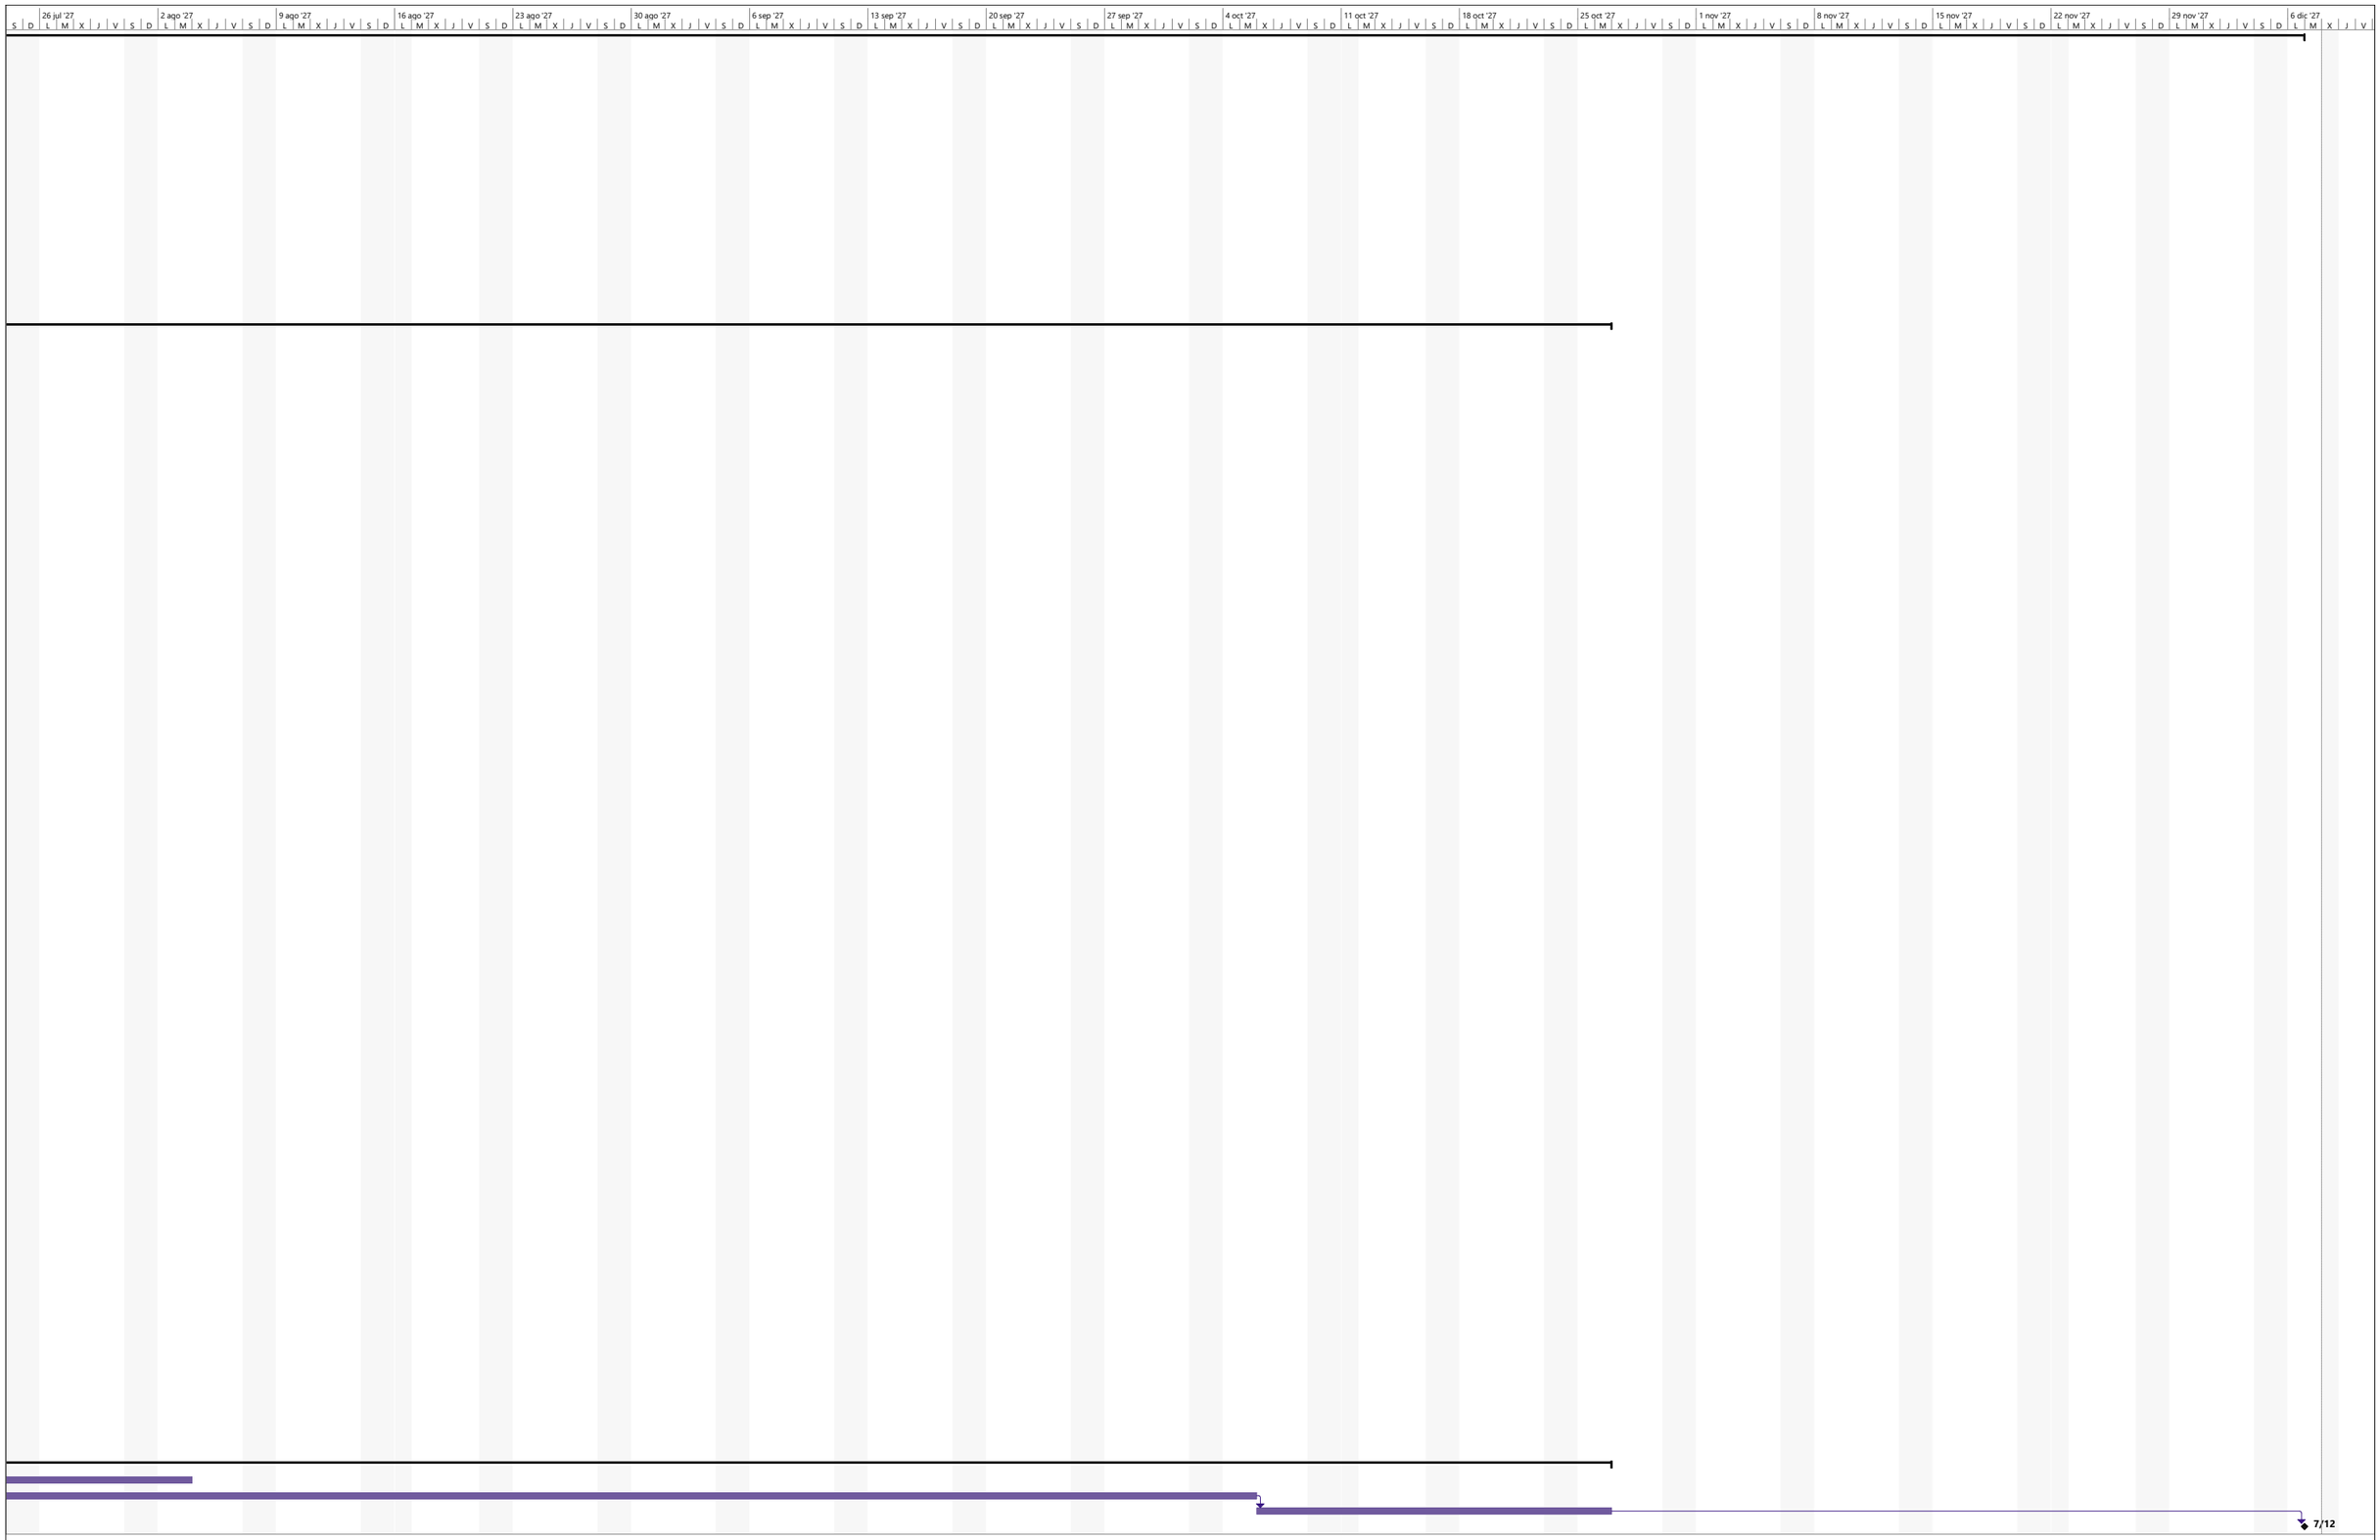

Proyecto: CPF2 FASE 2 - LA CAL
Fecha: vie 23/10/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso
