FLUJO INTEGRADO DE PROVISIONES — CPF-2 La Calera II · Rev4 · 2026-11-07

Convergencia de las 8 provisiones hacia el montaje en planta → iFAT en sitio → comisionado → RFSU. En rojo, el camino crítico de sistemas.

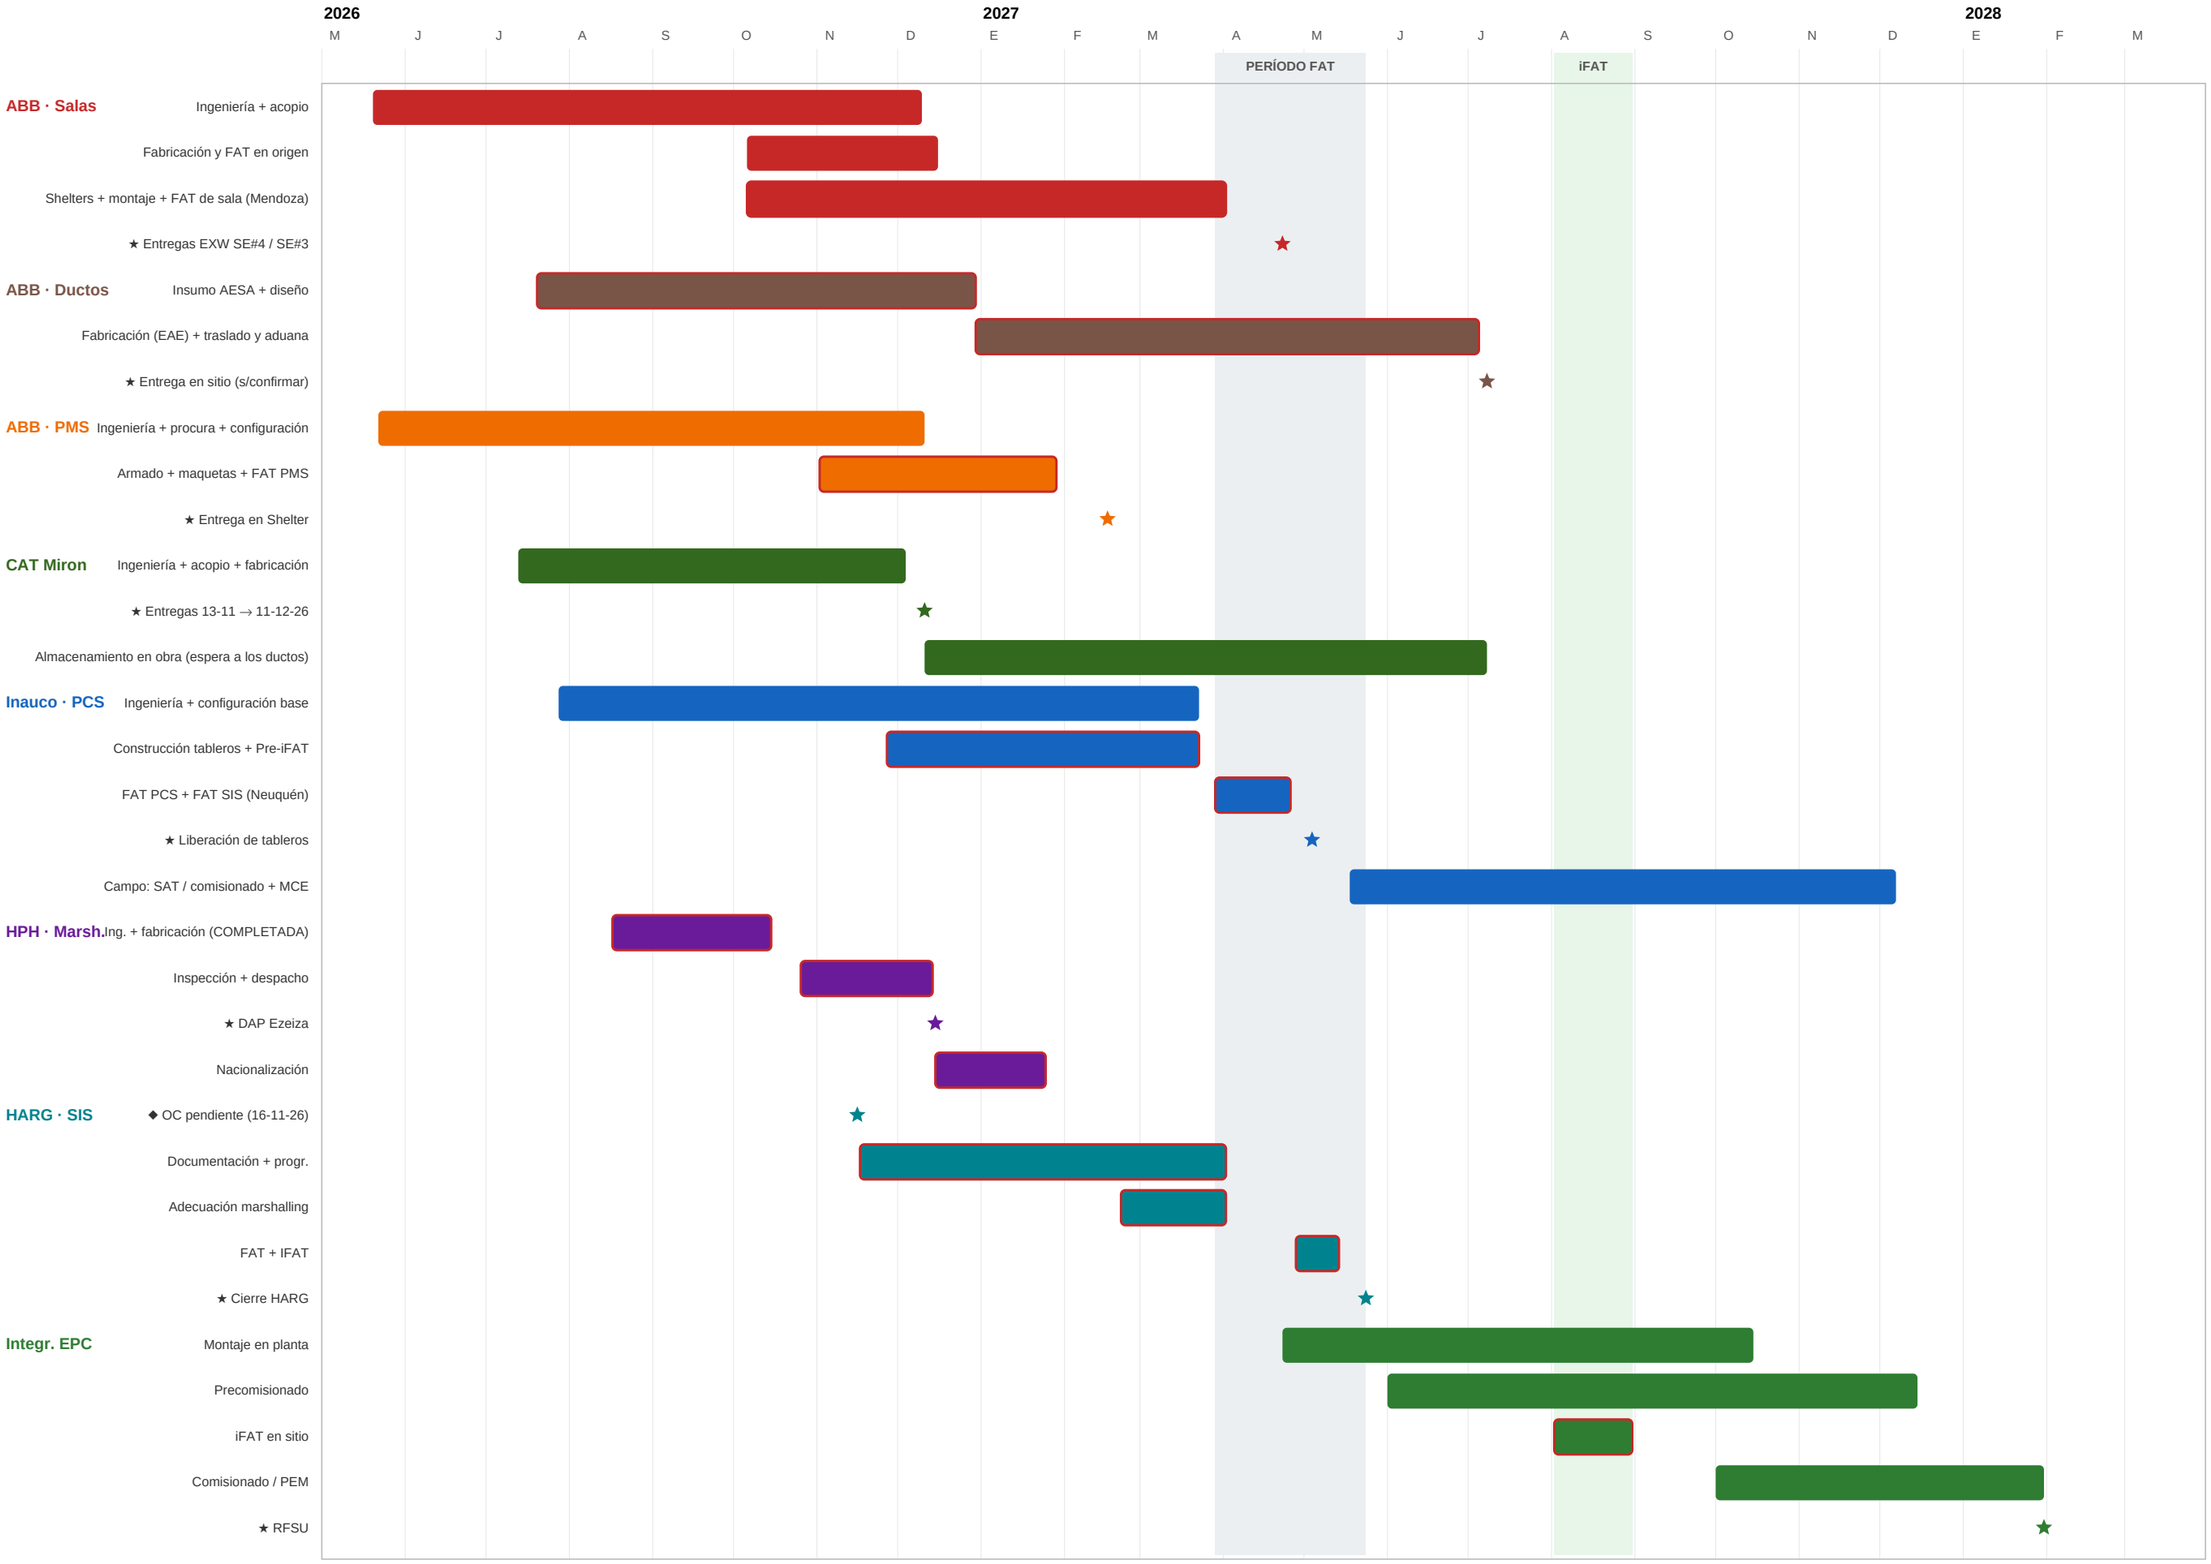

Ruta crítica de sistemas: OC de HARG (pendiente) → HPH (fabricación completada, DAP Ezeiza 15-DIC) → nacionalización → adecuación en base Inauco → FAT SIS → cierre HARG 24-MAY-2027 (se corrió 14 días por la segunda postergación de la OC).

Los ductos de barras corren por fuera del camino crítico de sistemas pero son la ÚLTIMA ENTREGA del paquete (08-JUL-2027) y condicionan el montaje de la vinculación a transformadores.

Los 13 transformadores llegan entre nov y dic de 2026 y quedan 7 meses almacenados a la espera de los ductos.
