AESA

Formulario

INFORME DE INSPECCIÓN/INSPECTION REPORT

FGE-CA-039 - Revisión 2 (14/07/2026 - AESA Privada)

Fecha de Inspección (Inspection Date)	21.10.2026

Hoja___1____de____2_____

Proveedor (Vendor):	CAT TRANSFORMADORES	N° de OC (Purchase Order N°):	4509019082	Registro de Inspección N° (Inspection Record N°)
Cliente (Customer):	ASTRA EVANGELISTA S.A.	N° de Obra (Work N°):	5155	IN-FC-CAT-19082-261021

Estado de la provisión (Provision Status)	Fase de la provisión (Provision Phase)	Documentos utilizados
[ ] Aprobado sin Observacion (Passed) [ ] Aprobado con Observaciones (Parcial) [ ] Retenido (Detained) [ ] Rechazado (Refused) [X] Otros (Others)	[ ] Continuación del Trabajo (Continuaion of work) [ ] Recepción (Reception) [ ] Pre Inspección (Pre-Inspection) [X] Proceso de Fabricación (Fabrication process) [ ] Final y/o Despacho (Final and/or dispatch) [ ] Revisión de Documentos (Document Review)	**Orden de Compra 4509019082** **Cronograma de fabricación 5155-00-0022-VE-CO-PG-001**

Puntos de Acción (Pendientes; Aprobaciones, Aclaraciones, No Conformidades Abiertas, etc)
Action points (Pending,Approvals,Clarifications,No Open Conformities, Etc):

Ítem	Descripción (Description)	Cantidad (Quantity)	Observaciones (Observations)
10	*Lote de repuestos para 2 años de operación*	1	*Ver detalles de observaciones y hallazgos en la sección de Detalles de la Inspección.*
20	*Transformador aislación seca cabinado, trifásico 500 KVA relación 380 / 480 V grupo de conexión DYN11*	1	
30	*Transformador aislación seca cabinado, trifásico 500 KVA relación 380 / 480 V grupo de conexión DYN11*	1	
40	*Transformador aislación seca cabinado, trifásico 500 KVA relación 380 / 480 V grupo de conexión DYN11*	1	
50	*Transformador aislación seca cabinado, trifásico 2.000 KVA relación 13,2 / 0,4 KV grupo de conexión DYN11*	1	
60	*Transformador aislación seca cabinado, trifásico 2.000 KVA relación 13,2 / 0,4 KV grupo de conexión DYN11*	1	
70	*Transformador aislación seca cabinado, trifásico 2.000 KVA relación 13,2 / 0,4 KV grupo de conexión DYN11*	1	
80	*Transformador aislación seca cabinado, trifásico 2.000 KVA relación 13,2 / 0,4 KV grupo de conexión DYN11*	1	
90	*Transformador aislación seca cabinado, trifásico 1.600 KVA relación 13,2 / 0,4 KV grupo de conexión DYN11*	1	
100	*Transformador aislación seca cabinado, trifásico 1.600 KVA relación 13,2 / 0,4 KV grupo de conexión DYN11*	1	
110	*Transformador aislación seca cabinado, trifásico 2.500 KVA relación 13,2 / 6,9 KV grupo DYN11*	1	
120	*Transformador aislación seca cabinado, trifásico 2.500 KVA relación 13,2 / 6,9 KV grupo DYN11*	1	
130	*Lote de repuestos para 2 años de operación*	1	
140	*Transformador baño de aceite, elevador trifásico 2.000 KVA relación 0,4 / 13,86 V grupo YND11*	1	
150	*Transformador baño de aceite, elevador trifásico 2.000 KVA relación 0,4 / 13,86 V grupo YND11*	1	
160	*Lote de repuestos para 2 años de operación*	1	

PROVISIÓN LIBERADA (RELEASED PROVISION)				*INFORME DE NC* (NC REPORT)*				*ORDEN COMPLETA (COMPLETE ORDER)*			
SI (YES)		NO	X	SI (YES)		NO	X	SI (YES)		NO	X

Instrumento de medición empleado (tipo) / (Measuring instrument used (TYPE)

Adjuntos (Attachments): Documento de compra y Protocolo de ensayos

Detalles de la inspección (Inspection details) :

Durante esta primera visita de inspección a CAT, se toma conicimiento de las siguientes generalidades:

1) En el depósito de materias primas de la empresa, se observa el acopio de foils de aluminio y resina de dos componentes ya destinadas a esta orden de compra

2) Se informa que todo el proceso de fabricación de núcleos a partir de láminas de FeSi se terceriza en una empresa afín a CAT ubicada en Villa Martelli, la cual será objeto de inspección en futuras visitas. Allí se realizan los cortes del FeSi y se conforman los núcleos ventana, los cuales son luego llevados a la planta de CAT, para el armado de bobinas y yugos de cierre, así como el armado en sus respectivos cabinados, cuando esto resulta aplicable.

3) Las bobinas para transformadores de distribución (1.6, 2 y 2.5 MVA), se hallan en buena medida en condición de stock permanete, lo cual agiliza los tiempos de fabricación de aquellos que corresponden a esta característica (items 50 al 100 por ejemplo)

4) A pedido de esta inspección se obtuvieron los certificados de calidad en fábrica de las principales materias primas, esto es FeSi, foils de Aluminio y resinas de dos componentes, los cuales se acompañan como adjuntos al presente reporte.

5) Se acompaña también el cronograma de la provisión y el registro fotográfico de la inspección.

<u>NOTA:</u> la aprobación del Inspector no libera al proveedor de su responsabilidad (<u>NOTE</u> : Inspector approval does not release supplier from responsibility)

Inspector	Proveedor (Vendor)	Cliente Final (End customer)
Firma (signature):	*Firma (signature):* Firma en Acta de Inspección CAT	*Firma (signature):*
Aclaración (Name and Surname): Ing. Felice Corrao	*Aclaración (Name and Surname):* Fernando Jelicich	*Aclaración (Name and Surname):*

AESA

Formulario

INFORME DE INSPECCIÓN CABLES

FGE-CA-039 - Revisión 2 (14/07/2026 - AESA Privada)

Fecha de Inspección (Inspection Date)	21.10.2026
Hoja 2 de 2	

Proveedor (Vendor):	**CAT TRANSFORMADORES**	**N° de OC (Purchase Order N°):**	**4509019082**	**Registro de Inspección N° (Inspection Record N°)**
Cliente (Customer):	**ASTRA EVANGELISTA S.A.**	**N° de Obra (Work N°):**	**5155**	**IN-FC-CAT-19082-261021**

REGISTRO FOTOGRAFICO OBTENIDO DURANTE LA INSPECCIÓN

NOTA: *la aprobación del Inspector no libera al proveedor de su responsabilidad (* ***NOTE*** *: Inspector approval does not release supplier from responsibility)*

Inspector	Proveedor (Vendor)	Cliente Final (End customer)
Firma (signature): Ing. Felice Corrao	*Firma (signature):* Firma en Acta de Inspección CAT	*Firma (signature):*
Aclaración (Name and Surname):	*Aclaración (Name and Surname):* Fernando Jelicich	*Aclaración (Name and Surname):*

KREMPEL

RELATÓRIO DE ENSAIOS DE LABORATÓRIO/LAB TESTS

PRODUTO / *PRODUCT*:	**RESIN DMR 9230 RF**	**REL N°**	**68546/26**

CLIENTE / CLIENT:	**Krempel**	**LOTE** / BATCH:	**019/26**
CÓDIGO / *CODE*:	**7101.01.109.004**		
ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION:	**Vermelho Claro**	**DATA** / *DATE*:	**02.09.2026**

ENSAIOS *PROPERTIES*	**NORMA** *TEST METHOD*	**ESPECIFICAÇÃO** *SPECIFIED*	**VALOR OBTIDO** *VALUES*
Densidade / Density	(ISO 1675)	1.65 - 1.75 (g/cm³)	1,65
Viscosidade / Viscosity (25°C)	PEL. 0037 (DIN 53019)	65.000 - 90.000 (mPa.s)	67600

OP´s:-

**** OP. 387667 - Qtde. 1380 Kg**

**** OP. 385990 - Qtde. 1200 Kg**

ANÁLISE LABORATÓRIO / *LAB CONCLUSION*

X	**APROVADO** / *APPROVED*	Wandrês B. Vitor CRQ IV 04262436 e-mail: wandres@dmibr.com Documento emitido eletronicamente, dispensa assinatura Document issued electronically, not need signing
	REPROVADO / *NOT APPROVED*	

KREMPEL

RELATÓRIO DE ENSAIOS DE LABORATÓRIO/LAB TESTS

PRODUTO / *PRODUCT*:	**HARDENER DMH 9231 HF**	**REL N°**	**68770/26**

CLIENTE / CLIENT:	**Itesa**	**LOTE** / BATCH:	**024/26**
CÓDIGO / *CODE*:	**7102.01.108.000**		
ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION:		**DATA** / *DATE*:	**28/09/2026**

ENSAIOS *PROPERTIES*	**NORMA** *TEST METHOD*	**ESPECIFICAÇÃO** *SPECIFIED*	**VALOR OBTIDO** *VALUES*
Densidade / Density	(ISO 1675)	1.80 - 1.90 g/cm³	1.87
Viscosidade / Viscosity (25°C)	PEL. 0037 (DIN 53019)	25.000 - 75.000 (mPa.s)	57.000

PROPRIEDADES DE MISTURA / *PROPERTIES OF THE MIXTURE*

DMR 9230 RF + DMH 9231 HF (Mistura / *Mixture*: **1:1)**	**NORMA** *TEST METHOD*	**ESPECIFICAÇÃO** *SPECIFIED*	**VALOR OBTIDO** *VALUES*
Tempo Gel / *Gel Time* (100°C)	PEL. 0039B (ASTM D-2471)	70 - 100 (min.)	91min 23seg

OP´s:-

**** OP. 388498 - Qtde. 1440 Kg**

**** OP. 385989 - Qtde. 1440 Kg**

ANÁLISE LABORATÓRIO / *LAB CONCLUSION*

X	**APROVADO** / *APPROVED*	Wandrês B. Vitor CRQ IV 04262436 e-mail: wandres@dmibr.com Documento emitido eletronicamente, dispensa assinatura Document issued electronically, not need signing
	REPROVADO / *NOT APPROVED*	

KREMPEL

RELATÓRIO DE ENSAIOS DE LABORATÓRIO/LAB TESTS

PRODUTO / *PRODUCT*:	**RESIN DMR 8390 RF**	**REL N°**	**68755/26**

CLIENTE / CLIENT:	**Krempel**	**LOTE** / BATCH:	**1082/26**
CÓDIGO / *CODE*:	**7101.01.106.106**		
COR / COLOR:	**Vermelho Claro**	**DATA** / *DATE*:	**16.09.2026**

ENSAIOS *PROPERTIES*	**NORMA** *TEST METHOD*	**ESPECIFICAÇÃO** *SPECIFIED*	**VALOR OBTIDO** *VALUES*
Densidade / Density	(ISO 1675)	1.65 - 1.75 (g/cm³)	1.68
Viscosidade / Viscosity (25°C)	PEL. 0037 (DIN 53019)	50.000 - 80.000 (mPa.s)	66.600

OP´s:-

****OP. 388488 - Qtde. 1350 Kg**

****OP. 388448 - Qtde. 1350 Kg**

ANÁLISE LABORATÓRIO / *LAB CONCLUSION*		
X	**APROVADO** / *APPROVED*	Wandrês B. Vitor CRQ IV 04262436 e-mail: wandres@dmibr.com Documento emitido eletronicamente, dispensa assinatura Document issued electronically, not need signing
	REPROVADO / *NOT APPROVED*	

RELATÓRIO DE ENSAIOS DE LABORATÓRIO/LAB TESTS

PRODUTO / *PRODUCT*:	**RESIN DMR 8390 RF**	**REL N°**	**68756/26**

CLIENTE / CLIENT:	**Krempel**	**LOTE** / BATCH:	**1083/26**
CÓDIGO / *CODE*:	**7101.01.106.106**		
COR / COLOR:	**Vermelho Claro**	**DATA** / *DATE*:	**16.09.2026**

ENSAIOS *PROPERTIES*	**NORMA** *TEST METHOD*	**ESPECIFICAÇÃO** *SPECIFIED*	**VALOR OBTIDO** *VALUES*
Densidade / Density	(ISO 1675)	1.65 - 1.75 (g/cm³)	1.68
Viscosidade / Viscosity (25°C)	PEL. 0037 (DIN 53019)	50.000 - 80.000 (mPa.s)	68.000

OP´s:-

****OP. 388489 - Qtde. 1350 Kg**

****OP. 388448 - Qtde. 1350 Kg**

ANÁLISE LABORATÓRIO / *LAB CONCLUSION*		
X	**APROVADO** / *APPROVED*	Wandrês B. Vitor CRQ IV 04262436 e-mail: wandres@dmibr.com Documento emitido eletronicamente, dispensa assinatura Document issued electronically, not need signing
	REPROVADO / *NOT APPROVED*	

KREMPEL

RELATÓRIO DE ENSAIOS DE LABORATÓRIO/LAB TESTS

PRODUTO / *PRODUCT*:	**RESIN DMR 8390 RF**	**REL N°**	**68757/26**

CLIENTE / CLIENT:	**Krempel**	**LOTE** / BATCH:	**1084/26**
CÓDIGO / *CODE*:	**7101.01.106.106**		
COR / COLOR:	**Vermelho Claro**	**DATA** / *DATE*:	**16.09.2026**

ENSAIOS *PROPERTIES*	**NORMA** *TEST METHOD*	**ESPECIFICAÇÃO** *SPECIFIED*	**VALOR OBTIDO** *VALUES*
Densidade / Density	(ISO 1675)	1.65 - 1.75 (g/cm³)	1.68
Viscosidade / Viscosity (25°C)	PEL. 0037 (DIN 53019)	50.000 - 80.000 (mPa.s)	57.200

OP´s:-

****OP. 388490 - Qtde. 1350 Kg**

****OP. 388448 - Qtde. 1350 Kg**

ANÁLISE LABORATÓRIO / *LAB CONCLUSION*		
X	**APROVADO** / *APPROVED*	Wandrês B. Vitor CRQ IV 04262436 e-mail: wandres@dmibr.com Documento emitido eletronicamente, dispensa assinatura Document issued electronically, not need signing
	REPROVADO / *NOT APPROVED*	

KREMPEL

RELATÓRIO DE ENSAIOS DE LABORATÓRIO/LAB TESTS

PRODUTO / *PRODUCT*:	**RESIN DMR 8390 RF**	**REL N°**	**68758/26**

CLIENTE / CLIENT:	**Krempel**	**LOTE** / BATCH:	**1085/26**
CÓDIGO / *CODE*:	**7101.01.106.106**		
COR / COLOR:	**Vermelho Claro**	**DATA** / *DATE*:	**16.09.2026**

ENSAIOS *PROPERTIES*	**NORMA** *TEST METHOD*	**ESPECIFICAÇÃO** *SPECIFIED*	**VALOR OBTIDO** *VALUES*
Densidade / Density	(ISO 1675)	1.65 - 1.75 (g/cm³)	1.68
Viscosidade / Viscosity (25°C)	PEL. 0037 (DIN 53019)	50.000 - 80.000 (mPa.s)	55.200

OP´s:-

****OP. 388492 - Qtde. 1320 Kg**

****OP. 388448 - Qtde. 1320 Kg**

ANÁLISE LABORATÓRIO / *LAB CONCLUSION*		
X	**APROVADO** / *APPROVED*	Wandrês B. Vitor CRQ IV 04262436 e-mail: wandres@dmibr.com Documento emitido eletronicamente, dispensa assinatura Document issued electronically, not need signing
	REPROVADO / *NOT APPROVED*	

KREMPEL

RELATÓRIO DE ENSAIOS DE LABORATÓRIO/LAB TESTS

PRODUTO / *PRODUCT*:	**HARDENER DMH 9395 HF**	**REL N°**	**68774/26**

CLIENTE / CLIENT:	**Krempel**	**LOTE** / BATCH:	**994/26**
CÓDIGO / *CODE*:	**7102.01.100.000**		
ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION:		**DATA** / *DATE*:	**22.09.2026**

ENSAIOS *PROPERTIES*	**NORMA** *TEST METHOD*	**ESPECIFICAÇÃO** *SPECIFIED*	**VALOR OBTIDO** *VALUES*
Densidade / Density	(ISO 1675)	1.80 - 1.90 (g/cm³)	1.81
Viscosidade / Viscosity (25°C)	PEL. 0037 (DIN 53019)	20.000 - 35.000 (mPa.s)	30.560

PROPRIEDADES DE MISTURA / *PROPERTIES OF THE MIXTURE*

DMR 8390RF + DMH 9395HF **(Mistura** / *Mixture*: **1:1)**	**NORMA** *TEST METHOD*	**ESPECIFICAÇÃO** *SPECIFIED*	**VALOR OBTIDO** *VALUES*
Tempo Gel / *Gel Time* (100°C)	PEL. 0039B (ASTM D-2471)	80 - 100 (min.)	95min 49seg

OP´s:-

** OP. 388450 - Qtde. 1500 Kg

** OP. 388449 - Qtde. 1500 Kg

ANÁLISE LABORATÓRIO / *LAB CONCLUSION*

X	**APROVADO** / *APPROVED*	Wandrês B. Vitor CRQ IV 04262436 e-mail: wandres@dmibr.com Documento emitido eletronicamente, dispensa assinatura Document issued electronically, not need signing
	REPROVADO / *NOT APPROVED*	

KREMPEL

RELATÓRIO DE ENSAIOS DE LABORATÓRIO/LAB TESTS

PRODUTO / *PRODUCT*:	**HARDENER DMH 9395 HF**	**REL N°**	**68775/26**

CLIENTE / CLIENT:	**Krempel**	**LOTE** / BATCH:	**995/26**
CÓDIGO / *CODE*:	**7102.01.100.000**		
ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION:		**DATA** / *DATE*:	**22.09.2026**

ENSAIOS *PROPERTIES*	**NORMA** *TEST METHOD*	**ESPECIFICAÇÃO** *SPECIFIED*	**VALOR OBTIDO** *VALUES*
Densidade / Density	(ISO 1675)	1.80 - 1.90 (g/cm³)	1.83
Viscosidade / Viscosity (25°C)	PEL. 0037 (DIN 53019)	20.000 - 35.000 (mPa.s)	34.760

PROPRIEDADES DE MISTURA / *PROPERTIES OF THE MIXTURE*

DMR 8390RF + DMH 9395HF **(Mistura** / *Mixture*: **1:1)**	**NORMA** *TEST METHOD*	**ESPECIFICAÇÃO** *SPECIFIED*	**VALOR OBTIDO** *VALUES*
Tempo Gel / *Gel Time* (100°C)	PEL. 0039B (ASTM D-2471)	80 - 100 (min.)	90min 24seg

OP´s:-

** OP. 388451 - Qtde. 1500 Kg

** OP. 388449 - Qtde. 1500 Kg

ANÁLISE LABORATÓRIO / *LAB CONCLUSION*

X	**APROVADO** / *APPROVED*	Wandrês B. Vitor CRQ IV 04262436 e-mail: wandres@dmibr.com Documento emitido eletronicamente, dispensa assinatura Document issued electronically, not need signing
	REPROVADO / *NOT APPROVED*	

KREMPEL

RELATÓRIO DE ENSAIOS DE LABORATÓRIO/LAB TESTS

PRODUTO / *PRODUCT*:	**HARDENER DMH 9395 HF**	**REL N°**	**68776/26**

CLIENTE / CLIENT:	**Krempel**	**LOTE** / BATCH:	**996/26**
CÓDIGO / *CODE*:	**7102.01.100.000**		
ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION:		**DATA** / *DATE*:	**22.09.2026**

ENSAIOS *PROPERTIES*	**NORMA** *TEST METHOD*	**ESPECIFICAÇÃO** *SPECIFIED*	**VALOR OBTIDO** *VALUES*
Densidade / Density	(ISO 1675)	1.80 - 1.90 (g/cm³)	1.81
Viscosidade / Viscosity (25°C)	PEL. 0037 (DIN 53019)	20.000 - 35.000 (mPa.s)	34.800

PROPRIEDADES DE MISTURA / *PROPERTIES OF THE MIXTURE*

DMR 8390RF + DMH 9395HF **(Mistura** / *Mixture*: **1:1)**	**NORMA** *TEST METHOD*	**ESPECIFICAÇÃO** *SPECIFIED*	**VALOR OBTIDO** *VALUES*
Tempo Gel / *Gel Time* (100°C)	PEL. 0039B (ASTM D-2471)	80 - 100 (min.)	87min 35seg

OP´s:-

** OP. 388452 - Qtde. 1500 Kg

** OP. 388449 - Qtde. 1500 Kg

ANÁLISE LABORATÓRIO / *LAB CONCLUSION*

X	**APROVADO** / *APPROVED*	Wandrês B. Vitor CRQ IV 04262436 e-mail: wandres@dmibr.com Documento emitido eletronicamente, dispensa assinatura Document issued electronically, not need signing
	REPROVADO / *NOT APPROVED*	

KREMPEL

RELATÓRIO DE ENSAIOS DE LABORATÓRIO/LAB TESTS

PRODUTO / *PRODUCT*:	**HARDENER DMH 9395 HF**	**REL N°**	**68777/26**

CLIENTE / CLIENT:	**Krempel**	**LOTE** / BATCH:	**997/26**
CÓDIGO / *CODE*:	**7102.01.100.000**		
ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION:		**DATA** / *DATE*:	**22.09.2026**

ENSAIOS *PROPERTIES*	**NORMA** *TEST METHOD*	**ESPECIFICAÇÃO** *SPECIFIED*	**VALOR OBTIDO** *VALUES*
Densidade / Density	(ISO 1675)	1.80 - 1.90 (g/cm³)	1.81
Viscosidade / Viscosity (25°C)	PEL. 0037 (DIN 53019)	20.000 - 35.000 (mPa.s)	29.280

PROPRIEDADES DE MISTURA / *PROPERTIES OF THE MIXTURE*

DMR 8390RF + DMH 9395HF (Mistura / *Mixture*: 1:1)	**NORMA** *TEST METHOD*	**ESPECIFICAÇÃO** *SPECIFIED*	**VALOR OBTIDO** *VALUES*
Tempo Gel / *Gel Time* (100°C)	PEL. 0039B (ASTM D-2471)	80 - 100 (min.)	83min 25seg

OP´s:-

** OP. 388453 - Qtde. 1500 Kg

** OP. 388449 - Qtde. 540 Kg

ANÁLISE LABORATÓRIO / *LAB CONCLUSION*

X	**APROVADO** / *APPROVED*	Wandrês B. Vitor CRQ IV 04262436 e-mail: wandres@dmibr.com Documento emitido eletronicamente, dispensa assinatura Document issued electronically, not need signing
	REPROVADO / *NOT APPROVED*	

Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.
Depósito Buenos Aires
Ruta Panamericana, Colectora Este KM. 31,7. Talar (1618) Buenos Aires
Argentina . T.E.:(5411)5789-8387
IVA Responsable Inscripto
Sede Social: Marcelo T. de Alvear 590, piso 3°, C.A.B.A.
R.P.C. Nro. 2534, L° 72, F° 151, T° "A" de Est. Nac., 26/06/1970

R

Código Nro: 91
Documento no válido como factura
REMITO CLIENTE

CI 30-52278060-6 Number/Número 0175 - 00006696
ING. BRUTOS: 901-914744-8 Date/Fecha: 20/08/2026
FECHA INICIO ACTIVIDADES: 15/04/70 Page/Página: 1 - 1
Nro. Pedido: 80711687-10
TRIPLICADO Orden de Compra: 22434

e: 0001001680 - ELECTROMECANICA BRENTA S.A / C.U.I.T: 30707207066/
Destino: BERMEJO 1562,,SAN ANDRES,BUENOS AIRES
ducto: **PRIMARY ALUMINIUM/ALUMINIO PRIMARIO.**
PT_LE_05026 - P1525 Lingotes estandar

Destino: BERMEJO 1562
1651 SAN ANDRES
BUENOS AIRES

Mark/Marca: ALUAR

Cast Colada	Net Weight Peso Neto	Tare Tara	Gross Peso Bruto	Analisis Certificate / Certificado de Análisis									
				Al	Fe	Si	Cu	Ti	Ga	Mg	Mn	Cr	
694 A5	1.051	.002	1.053	99.70	.24	.05	.000	.004	.012	.000	.002	.001	
695 A5	1.018	.002	1.02	99.70	.24	.05	.000	.004	.012	.000	.002	.001	
695 A5	1.016	.002	1.018										
695 A5	1.033	.002	1.035										
703 A5	1.038	.002	1.04	99.72	.22	.05	.000	.003	.011	.000	.002	.001	
737 A5	1.009	.002	1.011	99.72	.22	.05	.000	.004	.012	.000	.002	.001	

6.165

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C.
20 AGO 2026

varranties that the metal described has been tested and sampled in accordance with ALUAR'S standard procedures. Where no value is y this element meets ALUAR'S specification. Values are informed in percentages.

Este certificado garantiza que el metal descripto ha sido muestreado y analizado de acuerdo con los procedimientos estándares de ALUAR. Donde no se indica el valor, certificamos que este elemento cumple con las especificaciones de ALUAR. Los valores informados están expresados en porcentajes.

ate that the mentioned benn verified by us and veigth certificate

Certificamos que los pesos mencionados han sido verificados por nosotros, sirviendo la presente nota como certificado de pesada.

TOTAL METRI. TONS / TON.METRICAS			Total Bundles/Bultos	Total Pieces/Piezas
Net Weigth/Peso Neto	Tare / Tara	Gross Weight / Peso Bruto		
6.165	0.012	6.177	6	264

TE - RETIRA CLIENTE - CUIT:30557662320

/ALTER DNI:18335310

I-378

Transporte Transito: 716535

Receptor - Nombre / Apellido / Cargo

DOCUMENTO TIPO:_____NRO:_____

CAI Nro. 52196218478463 Fecha de VTO. 04/11/2026

Receptor

Firma / Sello

ETIRADA en puerta de deposito Bs.As. ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC. viaja POR CUENTA Y ORDEN DEL CLIENTE.

COT Remito electrónico s/opción art. 11 DN 32/2006

Legnano Teknoelectric Company Middle East FZCO

QUALITY CERTIFICATE AND TEST REPORT OF MILL

FOR THE ATTENTION OF QUALITY DEPARTMENT
COMPAÑIA ARGENTINA DE TRANSFORMADORES S.A.

Av. Gaona Km. 54.8, B1748 Gral.

Buenos Aires

ARG

WE NOTIFY, THAT THE MENTIONED PRODUCTS HAVE BEEN MANUFACTURED ACCORDING TO THE CONTRACT PRESCRIPTIONS\OF THE MENTIONED ORDER.

THIS CERTIFICATE DOES NOT EXEMPT THE SUPPLIER FROM THE CONTRACTS OBLIGATIONS.

WE REMAIN.

LEGNANO TEKNOELECTRIC MIDDLE EAST FZCO

ACCORDING TO EN10107 - IEC60404

DESCRIPTION: DDT D26-0280 28/01/26

Cust. Order No. 00001-00003304

NOTES 1260006 - D26-00214

PS.	NMI	ID. DESCRIPTION	1,0T-50Hz [W/kg]	1,5T-50Hz [W/kg]	1,7T-50Hz [W/kg]	H3 [Tesla]	H30 [Tesla]	B800 A/m [Tesla]
	DL00345	M4T27			1.03			1.86
	DL00339	M4T27			1.01			1.85
	DL00334	M4T27			1.01			1.85
	DL00340	M4T27			1.01			1.85
	DL00344	M4T27			1.01			1.85
	DL00346	M4T27			1.00			1.85

Legnano Teknoelectric Company Middle East FZCO

===

QUALITY CERTIFICATE AND TEST REPORT OF MILL

FOR THE ATTENTION OF QUALITY DEPARTMENT
COMPAÑIA ARGENTINA DE TRANSFORMADORES S.A.

Av. Gaona Km. 54.8, B1748 Gral.

Buenos Aires

ARG

WE NOTIFY, THAT THE MENTIONED PRODUCTS HAVE BEEN MANUFACTURED ACCORDING TO THE CONTRACT PRESCRIPTIONS\OF THE MENTIONED ORDER.

THIS CERTIFICATE DOES NOT EXEMPT THE SUPPLIER FROM THE CONTRACTS OBLIGATIONS.

WE REMAIN.

LEGNANO TEKNOELECTRIC MIDDLE EAST FZCO

ACCORDING TO EN10107 - IEC60404

DESCRIPTION: DDT D26-0281 28/01/26

Cust. Order No. 00001-00003304

NOTES 1260006 - D26-00215

PS.	NMI	ID. DESCRIPTION	1,0T-50Hz [W/kg]	1,5T-50Hz [W/kg]	1,7T-50Hz [W/kg]	H3 [Tesla]	H30 [Tesla]	B800 A/m [Tesla]
	DL00223	M4T27			1.01			1.85
	DL00216	M4T27			1.01			1.85
	DL00322	M4T27			1.01			1.84
	DL00210	M4T27			1.04			1.84
	DL00251	M4T27			1.03			1.85
	DL00288	M4T27			1.04			1.85

Legnano Teknoelectric Company Middle East FZCO

QUALITY CERTIFICATE AND TEST REPORT OF MILL

FOR THE ATTENTION OF QUALITY DEPARTMENT
COMPAÑIA ARGENTINA DE TRANSFORMADORES S.A.

Av. Gaona Km. 54.8, B1748 Gral.

Buenos Aires

ARG

WE NOTIFY, THAT THE MENTIONED PRODUCTS HAVE BEEN MANUFACTURED ACCORDING TO THE CONTRACT PRESCRIPTIONS\OF THE MENTIONED ORDER.

THIS CERTIFICATE DOES NOT EXEMPT THE SUPPLIER FROM THE CONTRACTS OBLIGATIONS.

WE REMAIN.

LEGNANO TEKNOELECTRIC MIDDLE EAST FZCO

ACCORDING TO EN10107 - IEC60404

DESCRIPTION: DDT D26-0282 28/01/26

Cust. Order No. 00001-00003304

NOTES 1260006 - D26-00216

PS.	NMI	ID. DESCRIPTION	1,0T-50Hz [W/kg]	1,5T-50Hz [W/kg]	1,7T-50Hz [W/kg]	H3 [Tesla]	H30 [Tesla]	B800 A/m [Tesla]
	DL00067	M4T27			1.04			1.88
	DL00068	M4T27			1.01			1.87
	DL00073	M4T27			1.01			1.88
	DL00075	M4T27			1.01			1.88
	DL00076	M4T27			1.01			1.88
	DL00204	M4T27			1.04			1.85

Legnano Teknoelectric Company Middle East FZCO

QUALITY CERTIFICATE AND TEST REPORT OF MILL

FOR THE ATTENTION OF QUALITY DEPARTMENT
COMPAÑIA ARGENTINA DE TRANSFORMADORES S.A.

Av. Gaona Km. 54.8, B1748 Gral.

Buenos Aires

ARG

WE NOTIFY, THAT THE MENTIONED PRODUCTS HAVE BEEN MANUFACTURED ACCORDING TO THE CONTRACT PRESCRIPTIONS\OF THE MENTIONED ORDER.

THIS CERTIFICATE DOES NOT EXEMPT THE SUPPLIER FROM THE CONTRACTS OBLIGATIONS.

WE REMAIN.

LEGNANO TEKNOELECTRIC MIDDLE EAST FZCO

ACCORDING TO EN10107 - IEC60404

DESCRIPTION: DDT D26-0283 28/01/26

Cust. Order No. 00001-00003304

NOTES 1260006 - D26-00217

PS.	NMI	ID. DESCRIPTION	1,0T-50Hz [W/kg]	1,5T-50Hz [W/kg]	1,7T-50Hz [W/kg]	H3 [Tesla]	H30 [Tesla]	B800 A/m [Tesla]
	DL00066	M4T27			1.02			1.88
	DK13922	M4T27			1.05			1.85
	DL00065	M4T27			1.02			1.88
	DK14855	M4T27			1.01			1.88
	DK14857	M4T27			1.00			1.88
	DL00044	M4T27			1.02			1.88

Legnano Teknoelectric Company Middle East FZCO

QUALITY CERTIFICATE AND TEST REPORT OF MILL

FOR THE ATTENTION OF QUALITY DEPARTMENT
COMPAÑIA ARGENTINA DE TRANSFORMADORES S.A.

Av. Gaona Km. 54.8, B1748 Gral.

Buenos Aires

ARG

WE NOTIFY, THAT THE MENTIONED PRODUCTS HAVE BEEN MANUFACTURED ACCORDING TO THE CONTRACT PRESCRIPTIONS\OF THE MENTIONED ORDER.

THIS CERTIFICATE DOES NOT EXEMPT THE SUPPLIER FROM THE CONTRACTS OBLIGATIONS.

WE REMAIN.

LEGNANO TEKNOELECTRIC MIDDLE EAST FZCO

ACCORDING TO EN10107 - IEC60404

DESCRIPTION: DDT D26-0284 28/01/26

Cust. Order No. 00001-00003304

NOTES 1260006 - D26-00218

PS.	NMI	ID. DESCRIPTION	1,0T-50Hz [W/kg]	1,5T-50Hz [W/kg]	1,7T-50Hz [W/kg]	H3 [Tesla]	H30 [Tesla]	B800 A/m [Tesla]
	DK13289	M4T27			1.05			1.85
	DK13856	M4T27			1.05			1.88
	DK13858	M4T27			1.05			1.89
	DK13860	M4T27			1.05			1.88
	DK13897	M4T27			1.05			1.88

Legnano Teknoelectric Company Middle East FZCO

QUALITY CERTIFICATE AND TEST REPORT OF MILL

FOR THE ATTENTION OF QUALITY DEPARTMENT
COMPAÑIA ARGENTINA DE TRANSFORMADORES S.A.

Av. Gaona Km. 54.8, B1748 Gral.

Buenos Aires

ARG

WE NOTIFY, THAT THE MENTIONED PRODUCTS HAVE BEEN MANUFACTURED ACCORDING TO THE CONTRACT PRESCRIPTIONS\OF THE MENTIONED ORDER.

THIS CERTIFICATE DOES NOT EXEMPT THE SUPPLIER FROM THE CONTRACTS OBLIGATIONS.

WE REMAIN.

LEGNANO TEKNOELECTRIC MIDDLE EAST FZCO

ACCORDING TO EN10107 - IEC60404

DESCRIPTION: DDT D26-0285 28/01/26

Cust. Order No. 00001-00003304

NOTES 1260006 - D26-00219

PS.	NMI	ID. DESCRIPTION	1,0T-50Hz [W/kg]	1,5T-50Hz [W/kg]	1,7T-50Hz [W/kg]	H3 [Tesla]	H30 [Tesla]	B800 A/m [Tesla]
	DK13031	M4T27			1.05			1.86
	DK12351	M4T27			1.05			1.87
	DK12386	M4T27			1.04			1.88
	DK12388	M4T27			1.05			1.88
	DK12218	M4T27			1.05			1.88

AESA	CALIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE TERCEROS
APROBADO	☐
APROBADO CON OBS.	☐
APROBADO CON OBS. MENORES	☐
VISTO	☐
RECHAZADO	☐

LA APROBACIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO EXIME AL PROVEEDOR DE SU RESPONSABILIDAD EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS ACORDADAS Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO A PROVEER.

REVISOR ..... FECHA .....

RESPONSABLE ..... FECHA .....

AESA		REVISIÓN MULTIDISCIPLINARIA	
	ESPECIALIDAD	FIRMA	FECHA
	CAÑERÍAS Y LAYOUT		
	CIVIL Y ESTRUCTURAS METÁLICAS		
	ELECTRICIDAD		
	EQUIPOS MECÁNICOS Y CALDERERÍA		
	INSPECCIÓN		
	INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL		
	PRECOM, COM Y PEM		
	PROCESOS		
	SEGURIDAD EN EL DISEÑO		
	TRANSPORTE E IZAJES		

REV.	DESCRIPTION	DATE	BY	CHK.	APPD
A	Para Aprobacion	01/09/2026	DJ	DJ	DJ

pluspetrol

Proyecto: **C5155 / Pluspetrol – CPF2**

AESA CAT MIRON

Codigo AESA

5155-00-0022-VE-CA-PE-001

FACILITIES ENGINEERING & MAJOR PROJECTS

TITLE: **PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS - PIE**

All the information contained in this document is confidential and property of Pluspetrol, and the totally or partial copy or reproduction of it is prohibited without previous authorization.

SCALE: N/A

DOCUMENT N°: **ACAL-00102-EMBR-TRSEC-QI-Q-0001**

REVISION: **A**

REPLACE:

MIRON — CAT MIRON

Cliente:	**AESA**	**Código:**	-
Proyecto:	**Pluspetrol - La Calera CPF2**	**Definición:**	-
Equipo:	**4x2000kVA - 2x1600kVA - 2x2500kVA - 2x2000kVA Ele - 3x500kVA**	**Revisión N°:**	A
Máq. N°:	**3489 - 3490 - 3491 - 3492 4x2000 13.2_0.4 / 3493 - 3494 2x1600 13.2_0.4kv**		
	3495 - 3496 2x2500kva 13.2_6.9kv / 3497 - 3498 2x2000 0.4_13.8kv Ynd11 / A7546 - A7547 - A7548 3x500 0.38_0.48	**Fecha:**	**Por:**

INDICE DEL CONTENIDO

1. DOCUMENTACION
2. MATERIALES
3. CONTROL DIMENSIONAL
4. ENSAYOS, PRUEBAS
5. DESPACHO
6. DOCUMENTACION FINAL

SUBPROVEEDORES

El proveedor deberá informar al cliente ..... sobre los requisitos de inspección y ensayo, es acción del cliente dar aviso a los sub-proveedores o clientes dependientes.

ACTIVIDADES DE TECPETROL

R: La Revisión del Informe significa que el cliente deberá recibir documentación que demuestre que se ha superado el control.

W: Testigo significa que ..... será notificado con diez días de anticipación del momento de la inspección o prueba;

H: Hold significa que ..... será notificado con diez días de anticipación sobre el momento de la inspección o prueba

Ampliar las filas para visualizar el texto

AESA

Item	Description de Fabricación o Inspección	Inspección del Proveedor y Plan de Ensayos	Código, Normas y Especificaciones de Referencia	Criterios de Recepción	Documentos para Verificación	ación y/o Testigos MIRON Acción	MIRON Firma	CLIENTE Acción	CLIENTE Firma	PLUSPETROL Acción	PLUSPETROL Firma
1	**DOCUMENTACION**										
1.1	Aprobación de ITP/PC (H)	Completar todos los espacios. Si no aplica, aclarar N/A	Indicar código del documento					R		R	
1.2	Aprobación de documentos y procedimientos aplicables							R		R	
2	**MATERIALES**										
2.1	Certificado Fe Si				Reporte	RA		R		R	
2.2	Certificado de conductor eléctrico				Reporte	RA		R		R	
2.3	Certificado De Resina				Reporte	RA		R		R	
3	**CONTROL DIMENSIONAL**	Procedimiento Req.									
3.1	Verificación de dimensiones		DWG	DWG		I		H		W	
3.2	Verificación de Accesorios		DWG	DWG		I		H		W	
3.3	Dimension final documentado		DWG	DWG		I		H		W	
4	**INSPECCION Y ENSAYOS**										
4.1	Control de instrumentos de medición	Procedimiento Req.	Indicar código norma aplicable	ISO 9001:2015	Reporte	I		H		W	
4.2	Resistencia ohmica	Procedimiento Req.	Hoja de Datos	IRAM	Reporte	I		H		W	
4.3	Resistencia de aislación	Procedimiento Req.	Hoja de Datos	IRAM	Reporte	I		H		W	
4.4	Tension aplicada	Procedimiento Req.	Hoja de Datos	IRAM	Reporte	I		H		W	
4.5	Tensión inducida	Procedimiento Req.	Hoja de Datos	IRAM	Reporte	I		H		W	
4.6	Relación de transformación/grupo de conexión	Procedimiento Req.	Hoja de Datos	IRAM	Reporte	I		H		W	
4.7	Pérdidas en Vacío / Control de I.O	Procedimiento Req.	Hoja de Datos	IRAM	Reporte	I		H		W	
4.8	Pérdidas de C.C / Tensión de C:C	Procedimiento Req.	Hoja de Datos	IRAM	Reporte	I		H		W	
4.9	Ensayo del conmutador	Procedimiento Req.	Hoja de Datos	IRAM	Reporte	I		H		W	
5.	**DESPACHO**										
5.1	Marcación puntos de izaje	Procedimiento Req.	Procedimiento de Fabricación	---	Lista de Embarque	VE		H		W	
5.2	Control de marcación	Procedimiento Req.	Procedimiento de Fabricación	---	Reporte	I		H		W	
5.3	Preparación para el despacho	Procedimiento Req.	Procedimiento de Fabricación	---	Reporte	I		H		W	
6	**DOCUMENTACION FINAL**										
6.1	Control de Certificados		Indicar código del documento		Lista de Embarque	VE		R		W	
6.2	Protocolos de ensayos				Lista de Embarque	VE		H		W	
6.4	Verificación del cierre de no conformidades (H)							H		R	
6.5	Control del Data Book (H)							R		R	

Indicar código del plano

Notas: *) Cuando se requiera un procedimiento particular, deberá ser enviardo a AESA para aprobación.

*) Este plan de inspección y prueba no libera al proveedor de cumplir con todos los requisitos indicados en las especificaciones, códigos y estándares particulares que se solicitan en la orden de compra y documentos relacionados.

Rev. #	Cambios de la Revisión	Fecha	Notes

Acción:

- H - Punto de retención obligatorio
- W / S - Testigo / Inspección al azar
- R/A - Revisar y firmar documento
- VE - Verificación y firma del intermediario
- A - Aprobación del cliente
- M - Inspección aleatoria obligatoria
- R - Revisión solo del documento
- I - Inspección del 100%
- P - Realizar la inspección

AESA	CALIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE TERCEROS
APROBADO	☐
APROBADO CON OBS.	☐
APROBADO CON OBS. MENORES	☐
VISTO	☒
RECHAZADO	☐

LA APROBACIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO EXIME AL PROVEEDOR DE SU RESPONSABILIDAD EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS ACORDADAS Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO A PROVEER.

REVISOR ..... FECHA .....

RESPONSABLE ..... FECHA .....

AESA	REVISIÓN MULTIDISCIPLINARIA	
ESPECIALIDAD	FIRMA	FECHA
CAÑERÍAS Y LAYOUT		
CIVIL Y ESTRUCTURAS METÁLICAS		
ELECTRICIDAD		
EQUIPOS MECÁNICOS Y CALDERERÍA		
INSPECCIÓN		
INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL		
PRECOM, COM Y PEM		
PROCESOS		
SEGURIDAD EN EL DISEÑO		
TRANSPORTE E IZAJES		

REV.	DESCRIPTION	DATE	BY	CHK.	APPD
A	Para Aprobacion	01/09/2026	IU	DJ	DJ

pluspetrol

FACILITIES ENGINEERING & MAJOR PROJECTS

Proyecto: **C5155 / Pluspetrol – CPF2**

CAT MIRON AESA

5155-00-0022-VE-CO-PG-001

TITLE: **CRONOGRAMA DE FABRICACION**

All the information contained in this document is confidential and property of Pluspetrol, and the totally or partial copy or reproduction of it is prohibited without previous authorization.

SCALE: N/A

DOCUMENT N°: **ACAL-00102-EMBR-TRSEC-PP-X-0001**

REVISION: **A**

REPLACE:

MIRON

CRONOGRAMA SEMANAL DE FABRICACIÓN

Fecha	Cliente	Rerencia	Proyecto	Referencias
ago-26	AESA	OT 5209 x 4	2000 kVA - 13,2/0,4 kV - ALUMINIO - FOLIO	Planificado / Con Atraso / Cumplido

Descripción					2026																						
Pos	Actividad	Tarea	Duración	% de Avance	13/07/26	20/07/26	27/07/26	03/08/26	10/08/26	17/08/26	24/08/26	31/08/26	07/09/26	14/09/26	21/09/26	28/09/26	05/10/26	12/10/26	19/10/26	26/10/26	02/11/26	09/11/26	16/11/26	23/11/26	30/11/26	07/12/26	14/12/26
1.0	Ingeniería	Cálculo y diseño	15 días	100%																							
1.1	Ingeniería	Proyecto de ingeniería en detalle	15 días	100%																							
2.0	Acopio de Materiales	Conductores BT/MT	30 días	90%																							
2.1	Acopio de Materiales	Materiales gruesos	45 días	50%																							
3.0	Fabricación	Bobinado BT/MT	40 días	0%																							
3.1	Fabricación	Nucleo magnético	30 días	0%																							
3.2	Fabricación	Montaje Final	3 días	0%																							
3.3	Fabricación	Montaje de Gabinete	5 días	0%																							
4.0	Laboratorio	Ensayos internos (*)	2 días	0%																							
5.0	Logística	Acondicionamiento para despacho	2 días	0%																							
5.1	Logística	Carga	1 días	0%																							

Notas:

(*) No incluye pruebas FAT, las cuales se deberán coordinar según disponibilidad de agenda de Laboratorio cercano a esa fecha.

Aclaración general (1): El presente cronograma está realizado en base a fechas y compromisos establecidos con proveedores externos, los cuales pueden sufrir alguna variación. Si fuera el caso, MIRON se compromete a informar y realizar una nueva revisión de este documento. La versión final del mismo queda sujeta a la aprobación definitiva de las especificaciones técnicas por parte del cliente.

Aclaración general (2): Los días reflejados en el programa representan días hábiles, no días corridos.

Aclaración general (3): En el acopio de Materiales Gruesos se contemplan los gabinetes de los trasnformadores, entre otras cosas.

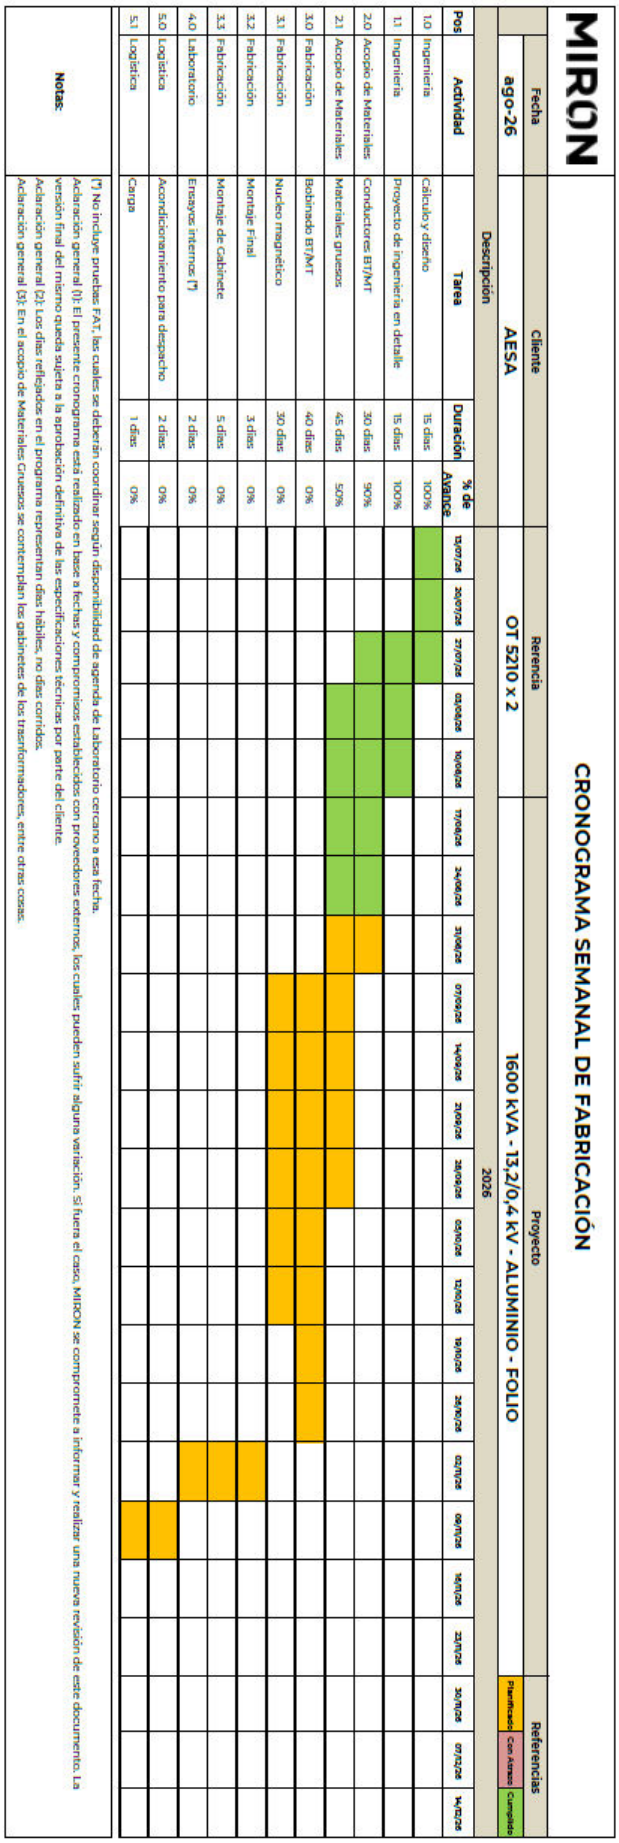
MIRON
CRONOGRAMA SEMANAL DE FABRICACIÓN
Fecha
ago-26
Cliente
AESA
Referencia
OT 5210 x 2
Proyecto
1600 kVA - 13,2/0,4 kV - ALUMINIO - FOLIO
2026
Referencias
Planificado
Con Atraso
Cumplido
Descripción
Pos
Actividad
Tarea
Duración
% de Avance
13/07/26
20/07/26
27/07/26
03/08/26
10/08/26
17/08/26
24/08/26
31/08/26
07/09/26
14/09/26
21/09/26
28/09/26
05/10/26
12/10/26
19/10/26
26/10/26
02/11/26
09/11/26
16/11/26
23/11/26
30/11/26
07/12/26
14/12/26
1.0 Ingeniería
Cálculo y diseño
15 días
100%
1.1 Ingeniería
Proyecto de ingeniería en detalle
15 días
100%
2.0 Acopio de Materiales
Conductores BT/MT
30 días
90%
2.1 Acopio de Materiales
Materiales gruesos
45 días
50%
3.0 Fabricación
Bobinado BT/MT
40 días
0%
3.1 Fabricación
Nucleo magnético
30 días
0%
3.2 Fabricación
Montaje Final
3 días
0%
3.3 Fabricación
Montaje de cabinete
5 días
0%
4.0 Laboratorio
Ensayos internos (*)
2 días
0%
5.0 Logística
Acondicionamiento para despacho
2 días
0%
5.1 Logística
Carga
1 días
0%
Notas:
(*) No incluye pruebas FAT, las cuales se deberán coordinar según disponibilidad de agenda de Laboratorio cercano a esa fecha.
Aclaración general (0): El presente cronograma está realizado en base a fechas y compromisos establecidos con proveedores externos, los cuales pueden sufrir alguna variación. Si fuera el caso, MIRON se compromete a informar y realizar una nueva revisión de este documento. La versión final del mismo queda sujeta a la aprobación definitiva de las especificaciones técnicas por parte del cliente.
Aclaración general (2): Los días reflejados en el programa representan días hábiles, no días corridos.
Aclaración general (3): En el acopio de Materiales Gruesos se contemplan los gabinetes de los trasnformadores, entre otras cosas.

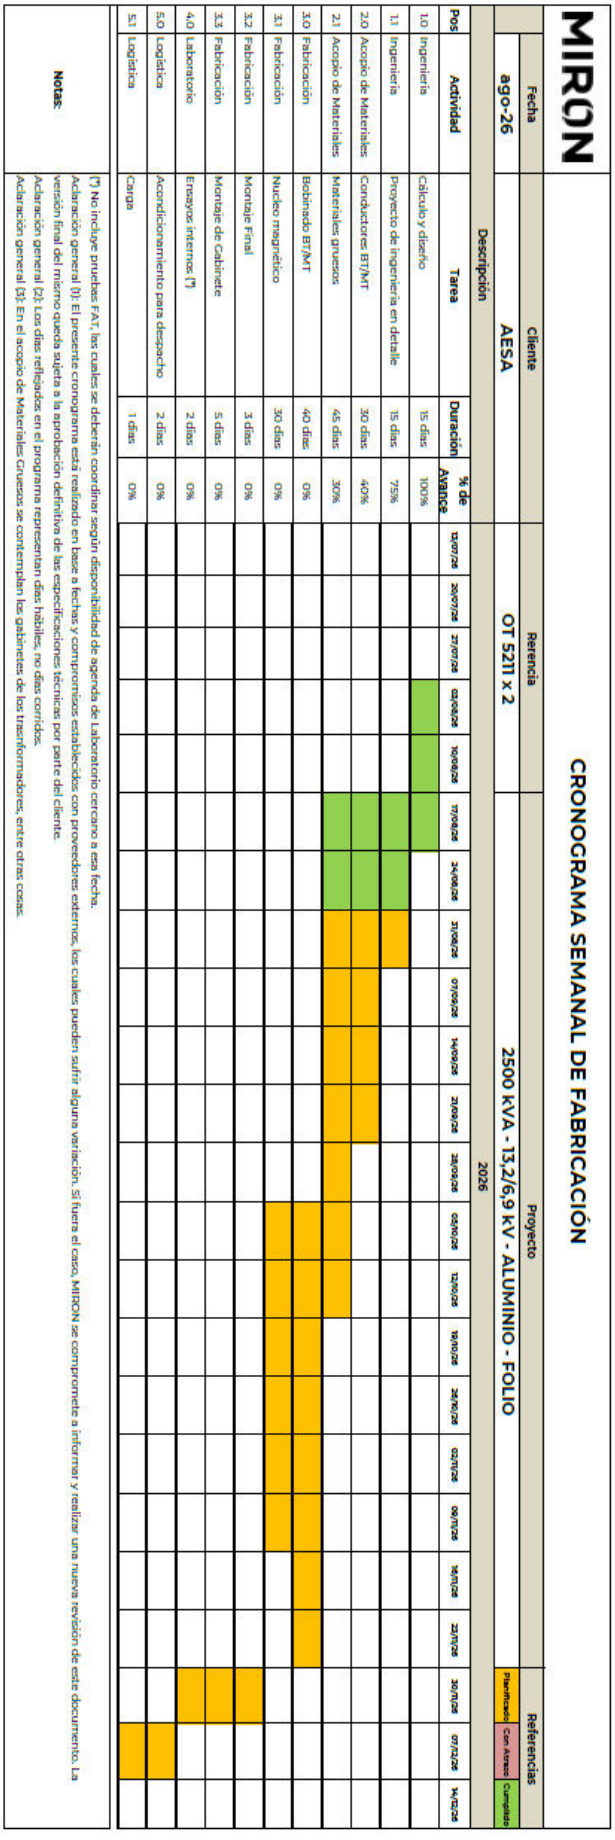

Notas:

(*) No incluye pruebas FAT, las cuales se deberán coordinar según disponibilidad de agenda de Laboratorio cercano a esa fecha.

Aclaración general (1): El presente cronograma está realizado en base a fechas y compromisos establecidos con proveedores externos, los cuales pueden sufrir alguna variación. Si fuera el caso, MIRON se compromete a informar y realizar una nueva revisión de este documento. La versión final del mismo queda sujeta a la aprobación definitiva de las especificaciones técnicas por parte del cliente.

Aclaración general (2): Los días reflejados en el programa representan días hábiles, no días corridos.

Aclaración general (3): En el acopio de Materiales Gruesos se contemplan los gabinetes de los trasformadores, entre otras cosas.

MIRON

CRONOGRAMA SEMANAL DE FABRICACIÓN

Fecha	Cliente	Rerencia	Proyecto	Referencias
ago-26	AESA	OT 5212 x 2	2000 kVA - 0,4/13,86 kV - ALUMINIO - FOLIO	Planificado / Con Atraso / Cumplido

Pos	Actividad	Tarea	Duración	% de Avance	13/07/26	20/07/26	27/07/26	03/08/26	10/08/26	17/08/26	24/08/26	31/08/26	07/09/26	14/09/26	21/09/26	28/09/26	05/10/26	12/10/26	19/10/26	26/10/26	02/11/26	09/11/26	16/11/26	23/11/26	30/11/26	07/12/26	14/12/26
1.0	Ingeniería	Cálculo y diseño	15 días	100%																							
1.1	Ingeniería	Proyecto de ingeniería en detalle	15 días	100%																							
2.0	Acopio de Materiales	Conductores BT/MT	30 días	80%																							
2.1	Acopio de Materiales	Materiales gruesos	45 días	40%																							
3.0	Fabricación	Bobinado BT/MT	40 días	0%																							
3.1	Fabricación	Nucleo magnético	30 días	0%																							
3.2	Fabricación	Montaje Final	3 días	0%																							
3.3	Fabricación	Montaje de Gabinete	5 días	0%																							
4.0	Laboratorio	Ensayos internos (*)	2 días	0%																							
5.0	Logística	Acondicionamiento para despacho	2 días	0%																							
5.1	Logística	Carga	1 días	0%																							

Notas:

(*) No incluye pruebas FAT, las cuales se deberán coordinar según disponibilidad de agenda de Laboratorio cercano a esa fecha.

Aclaración general (1): El presente cronograma está realizado en base a fechas y compromisos establecidos con proveedores externos, los cuales pueden sufrir alguna variación. Si fuera el caso, MIRON se compromete a informar y realizar una nueva revisión de este documento. La versión final del mismo queda sujeta a la aprobación definitiva de las especificaciones técnicas por parte del cliente.

Aclaración general (2): Los días reflejados en el programa representan días hábiles, no días corridos.

Aclaración general (3): En el acopio de Materiales Gruesos se contemplan los gabinetes de los trasnformadores, entre otras cosas.

CRONOGRAMA SEMANAL DE FABRICACIÓN

Fecha	Cliente	Rerencia	Proyecto	Referencias
ago-26	AESA	OT 5213 x 3	500 kVA - 0,38/0,48 kV - ALUMINIO - FOLIO	Planificado / Con Atraso / Cumplido

Pos	Actividad	Tarea	Duración	% de Avance	13/07/26	20/07/26	27/07/26	03/08/26	10/08/26	17/08/26	24/08/26	31/08/26	07/09/26	14/09/26	21/09/26	28/09/26	05/10/26	12/10/26	19/10/26	26/10/26	02/11/26	09/11/26	16/11/26	23/11/26	30/11/26	07/12/26	14/12/26
1.0	Ingeniería	Cálculo y diseño	15 días	100%																							
1.1	Ingeniería	Proyecto de ingeniería en detalle	15 días	100%																							
2.0	Acopio de Materiales	Conductores BT/MT	30 días	70%																							
2.1	Acopio de Materiales	Materiales gruesos	45 días	40%																							
3.0	Fabricación	Bobinado BT/MT	40 días	0%																							
3.1	Fabricación	Nucleo magnético	30 días	0%																							
3.2	Fabricación	Montaje Final	3 días	0%																							
3.3	Fabricación	Montaje de Gabinete	5 días	0%																							
4.0	Laboratorio	Ensayos internos (*)	2 días	0%																							
5.0	Logística	Acondicionamiento para despacho	2 días	0%																							
5.1	Logística	Carga	1 días	0%																							

Notas:

(*) No incluye pruebas FAT, las cuales se deberán coordinar según disponibilidad de agenda de Laboratorio cercano a esa fecha.

Aclaración general (1): El presente cronograma está realizado en base a fechas y compromisos establecidos con proveedores externos, los cuales pueden sufrir alguna variación. Si fuera el caso, MIRON se compromete a informar y realizar una nueva revisión de este documento. La versión final del mismo queda sujeta a la aprobación definitiva de las especificaciones técnicas por parte del cliente.

Aclaración general (2): Los días reflejados en el programa representan días hábiles, no días corridos.

Aclaración general (3): En el acopio de Materiales Gruesos se contemplan los gabinetes de los trasnformadores, entre otras cosas.

OT	RESUMEN [POTENCIA - TENSIÓN - TIPO - CONDUCTOR - TIPO CONDUCTOR]	N° ASIGN.	CLIENTE
5209/01	2000 kVA - 13,2/0,4 kV - ALUMINIO - FOLIO	3489	AESA
5209/02	2000 kVA - 13,2/0,4 kV - ALUMINIO - FOLIO	3490	AESA
5209/03	2000 kVA - 13,2/0,4 kV - ALUMINIO - FOLIO	3491	AESA
5209/04	2000 kVA - 13,2/0,4 kV - ALUMINIO - FOLIO	3492	AESA
5210/01	1600 kVA - 13,2/0,4 kV - ALUMINIO - FOLIO	3493	AESA
5210/02	1600 kVA - 13,2/0,4 kV - ALUMINIO - FOLIO	3494	AESA
5212/01	2000 kVA - 0,4/13,86 kV - ALUMINIO - FOLIO	3497	AESA
5212/02	2000 kVA - 0,4/13,86 kV - ALUMINIO - FOLIO	3498	AESA
5211/01	2500 kVA - 13,2/6,9 kV - ALUMINIO - FOLIO	3495	AESA
5211/02	2500 kVA - 13,2/6,9 kV - ALUMINIO - FOLIO	3496	AESA
5213/01	500 kVA - 0,38/0,48 kV - ALUMINIO - FOLIO	A7546	AESA
5213/02	500 kVA - 0,38/0,48 kV - ALUMINIO - FOLIO	A7547	AESA
5213/03	500 kVA - 0,38/0,48 kV - ALUMINIO - FOLIO	A7548	AESA
