AESA	CALIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE TERCEROS
APROBADO	☐
APROBADO CON OBS.	☐
APROBADO CON OBS. MENORES	☐
VISTO	☐
RECHAZADO	☐

LA APROBACIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO EXIME AL PROVEEDOR DE SU RESPONSABILIDAD EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS ACORDADAS Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO A PROVEER.

REVISOR ..... FECHA .....

RESPONSABLE ..... FECHA .....

AESA	REVISIÓN MULTIDISCIPLINARIA	
ESPECIALIDAD	FIRMA	FECHA
CAÑERÍAS Y LAYOUT		
CIVIL Y ESTRUCTURAS METÁLICAS		
ELECTRICIDAD		
EQUIPOS MECÁNICOS Y CALDERERÍA		
INSPECCIÓN		
INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL		
PRECOM, COM Y PEM		
PROCESOS		
SEGURIDAD EN EL DISEÑO		
TRANSPORTE E IZAJES		

REV.	DESCRIPTION	DATE	BY	CHK.	APPD
0	PARA CONSTRUCCIÓN	14/10	RM	RM	RM
A	PARA APROBACIÓN	4/6/2026	RM	RM	RM

AESA ABB

AESA N° 5155-00-0009-VE-CO-PG-001

PROVEEDOR N° _____

pluspetrol

FACILITIES ENGINEERING & MAJOR PROJECTS

JOB: **PRODUCTION FACILITIES – LA CALERA**

TITLE:

CRONOGRAMA

All the information contained in this document is confidential and property of Pluspetrol, and the totally or partial copy or reproduction of it is prohibited without previous authorization.


SCALE: -

DOCUMENT N°: **P00001-D-AESA-ACAL-00102-ABBX-SELC-PP-X-0001**

REVISION: **0**

REPLACE:


ID		% Compl	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Text1
1		**54%**		**OPP-24-6977812 - PlusPetrol La Calera II Project**	**293 days**	**Fri 8/5/26**	**Thu 8/7/27**	
2	✓	100%		Emisión de OC - Recepcion en ABB - Sala N4	0 days	Fri 8/5/26	Fri 8/5/26	ABB / AESA
3	✓	100%		Emisión de OC - Recepcion en ABB - Sala N3	0 days	Fri 8/5/26	Fri 8/5/26	ABB / AESA
4	✓	100%		KOM técnico - Sala N4	1 day	Fri 15/5/26	Mon 18/5/26	ABB / AESA
5	✓	100%		KOM técnico - Sala N3	1 day	Fri 15/5/26	Mon 18/5/26	ABB / AESA
6	✓	100%		Emision Pedidos internos/OC proveedores - Sala N4	10 edays	Tue 12/5/26	Fri 22/5/26	ABB
7	✓	100%		Emision Pedidos internos/OC proveedores - Sala N3	10 edays	Tue 12/5/26	Fri 22/5/26	ABB
8		48%		Contrato PMS - Entrega equipos en sheltrista	285,42 edays	Fri 8/5/26	Wed 17/2/27	ABB
9		**57%**		**Sala Eléctrica #3 BT**	**287 days**	**Mon 18/5/26**	**Thu 8/7/27**	
10		**64%**		**Equipos**	**287 days**	**Mon 18/5/26**	**Thu 8/7/27**	
11		**78%**		**Tableros CCMs**	**149,88 days**	**Fri 5/6/26**	**Sun 10/1/27**	
12	✓	**100%**		**Ingeniería**	**44 days**	**Fri 5/6/26**	**Fri 7/8/26**	
13	✓	10...		Esquemas unifilares definitivos	0 days	Fri 5/6/26	Fri 5/6/26	AESA
14	✓	10...		Esquemas funcionales definitivos	0 days	Mon 22/6/26	Mon 22/6/26	AESA
15	✓	**10...**		**Tablero 102-CCM-005**	**39 days**	**Fri 5/6/26**	**Fri 31/7/26**	
16	✓	100%		Emisión Ingeniería básica tablero 102-CCM-005	4 days	Fri 5/6/26	Thu 11/6/26	ABB
17	✓	100%		Aprobación de Ingeniería básica tablero 102-CCM-005	5 days	Fri 12/6/26	Fri 19/6/26	AESA
18	✓	100%		Freezing Point	0 days	Fri 19/6/26	Fri 19/6/26	ABB
19	✓	100%		Emisión Ingeniería de detalle tablero 102-CCM-005	15 days	Mon 22/6/26	Tue 14/7/26	ABB
20	✓	100%		Aprobación de Ingeniería de Detalle tablero 102-CCM-005	12 days	Wed 15/7/26	Fri 31/7/26	AESA
21	✓	100%		Freezing Point	0 days	Fri 31/7/26	Fri 31/7/26	ABB
22	✓	**10...**		**Tablero 102-CCM-006**	**40 days**	**Fri 5/6/26**	**Mon 3/8/26**	
23	✓	10...		Emisión Ingeniería básica tablero 102-CCM-006	4 days	Fri 5/6/26	Thu 11/6/26	ABB
24	✓	10...		Aprobación de Ingeniería básica tablero 102-CCM-006	5 days	Fri 12/6/26	Fri 19/6/26	AESA
25	✓	100%		Freezing Point	0 days	Fri 19/6/26	Fri 19/6/26	ABB
26	✓	10...		Emisión Ingeniería de detalle tablero 102-CCM-006	18 days	Mon 22/6/26	Fri 17/7/26	ABB
27	✓	10...		Aprobación de Ingeniería de Detalle tablero 102-CCM-006	10 days	Mon 20/7/26	Mon 3/8/26	AESA
28	✓	100%		Freezing Point	0 days	Mon 3/8/26	Mon 3/8/26	ABB
29	✓	**10...**		**Tablero 102- CCM-007**	**44 days**	**Fri 5/6/26**	**Fri 7/8/26**	
30	✓	10...		Emisión Ingeniería básica tablero 102-CCM-007	4 days	Fri 5/6/26	Thu 11/6/26	ABB
31	✓	10...		Aprobación de Ingeniería básica tablero 102-CCM-007	5 days	Fri 12/6/26	Fri 19/6/26	AESA
32	✓	100%		Freezing Point	0 days	Fri 19/6/26	Fri 19/6/26	ABB

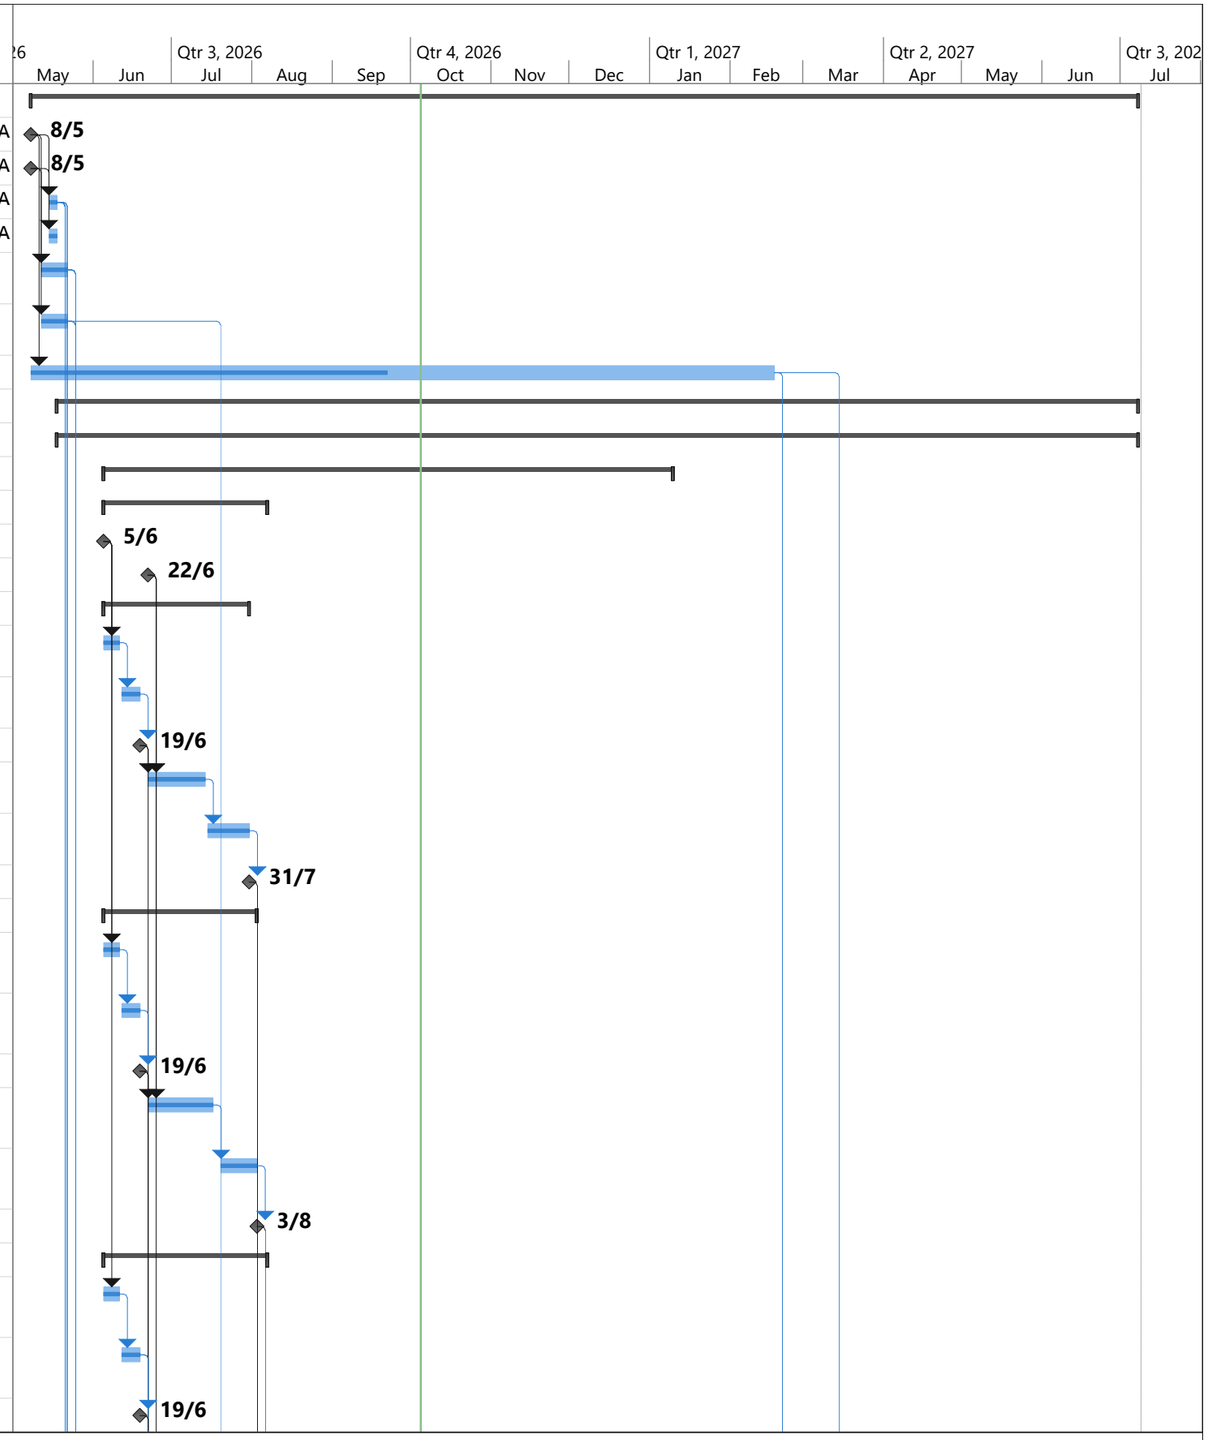

Project: La Calera II - Cronogram
Date: Mon 5/10/26

Task	Inactive Task	Manual Summary Rollup	External Milestone	Manual Progress
Split	Inactive Milestone	Manual Summary	Deadline	
Milestone	Inactive Summary	Start-only	Critical	
Summary	Manual Task	Finish-only	Critical Split	
Project Summary	Duration-only	External Tasks	Progress	


ID		% Compl	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Text1
33	✓	10...		Emisión Ingeniería de detalle tablero 102-CCM-007	23 days	Mon 22/6/26	Fri 24/7/26	ABB
34	✓	10...		Aprobación de Ingeniería de Detalle tablero 102-CCM-007	10 days	Fri 24/7/26	Fri 7/8/26	AESA
35	✓	100%		Freezing Point	0 days	Fri 7/8/26	Fri 7/8/26	ABB
36		**93%**		**Materiales**	**86 days**	**Fri 19/6/26**	**Tue 20/10/26**	
37	✓	10...		Compra y acopio de materiales críticos 102-CCM-005	103 edays	Fri 19/6/26	Wed 30/9/26	ABB
38	✓	10...		Compra y acopio de materiales críticos 102-CCM-006	103 edays	Fri 19/6/26	Wed 30/9/26	ABB
39	✓	10...		Compra y acopio de materiales críticos 102-CCM-007	103 edays	Fri 19/6/26	Wed 30/9/26	ABB
40		90%		Compra y acopio de materiales secundarios 102-CCM-005	67 edays	Fri 31/7/26	Tue 6/10/26	ABB
41		85%		Compra y acopio de materiales secundarios 102-CCM-006	70 edays	Mon 3/8/26	Mon 12/10/26	ABB
42		75%		Compra y acopio de materiales secundarios 102-CCM-007	70 edays	Tue 11/8/26	Tue 20/10/26	ABB
43		**1%**		**Fabricación y ensayos**	**47 days**	**Tue 6/10/26**	**Fri 11/12/26**	
44		2%		Fabricación tablero 102-CCM-005	22 days	Tue 6/10/26	Thu 5/11/26	ABB
45		0%		Ensayos internos tablero 102-CCM-0	9 days	Fri 6/11/26	Thu 19/11/26	ABB
46		2%		Fabricación tablero 102-CCM-006	23 days	Mon 12/10/2	Thu 12/11/26	ABB
47		0%		Ensayos internos tablero 102-CCM-0	9 days	Fri 13/11/26	Thu 26/11/26	ABB
48		2%		Fabricación tablero 102-CCM-007	22 days	Tue 20/10/2(	Thu 19/11/26	ABB
49		0%		Ensayos internos tablero 102-CCM-0	9 days	Fri 20/11/26	Thu 3/12/26	ABB
50		**0%**		**Ensayos FAT**	**15 days**	**Thu 19/11/2**	**Fri 11/12/26**	
51		0%		Tablero 102-CCM-005	5 days	Thu 19/11/2(	Thu 26/11/26	ABB / AESA
52		0%		Tablero 102-CCM-006	5 days	Thu 26/11/2(	Thu 3/12/26	ABB / AESA
53		0%		Tablero 102-CCM-007	5 days	Thu 3/12/26	Fri 11/12/26	ABB / AESA
54		**0%**		**Adecuación y despachos de fábrica**	**13 days**	**Fri 27/11/26**	**Thu 17/12/26**	
55		0%		Tablero 102-CCM-005	3 days	Fri 27/11/26	Wed 2/12/26	ABB
56		0%		Tablero 102-CCM-006	3 days	Fri 4/12/26	Thu 10/12/26	ABB
57		0%		Tablero 102-CCM-007	3 days	Mon 14/12/26	Thu 17/12/26	ABB
58		**0%**		**Traslado internacional + Aduana**	**21 days**	**Wed 2/12/2(**	**Thu 7/1/27**	ABB
59		0%		Tablero 102-CCM-005	21 edays	Wed 2/12/26	Wed 23/12/26	ABB
60		0%		Tablero 102-CCM-006	21 edays	Thu 10/12/2(	Thu 31/12/26	ABB
61		0%		Tablero 102-CCM-007	21 edays	Thu 17/12/2(	Thu 7/1/27	ABB
62		**0%**		**Entrega en Shelterista**	**8,88 days**	**Wed 23/12/2**	**Sun 10/1/27**	
63		0%		Tablero 102-CCM-005	5 edays	Wed 23/12/26	Mon 28/12/26	ABB
64		0%		Tablero 102-CCM-006	3 edays	Thu 31/12/26	Sun 3/1/27	ABB
65		0%		Tablero 102-CCM-007	3 edays	Thu 7/1/27	Sun 10/1/27	ABB

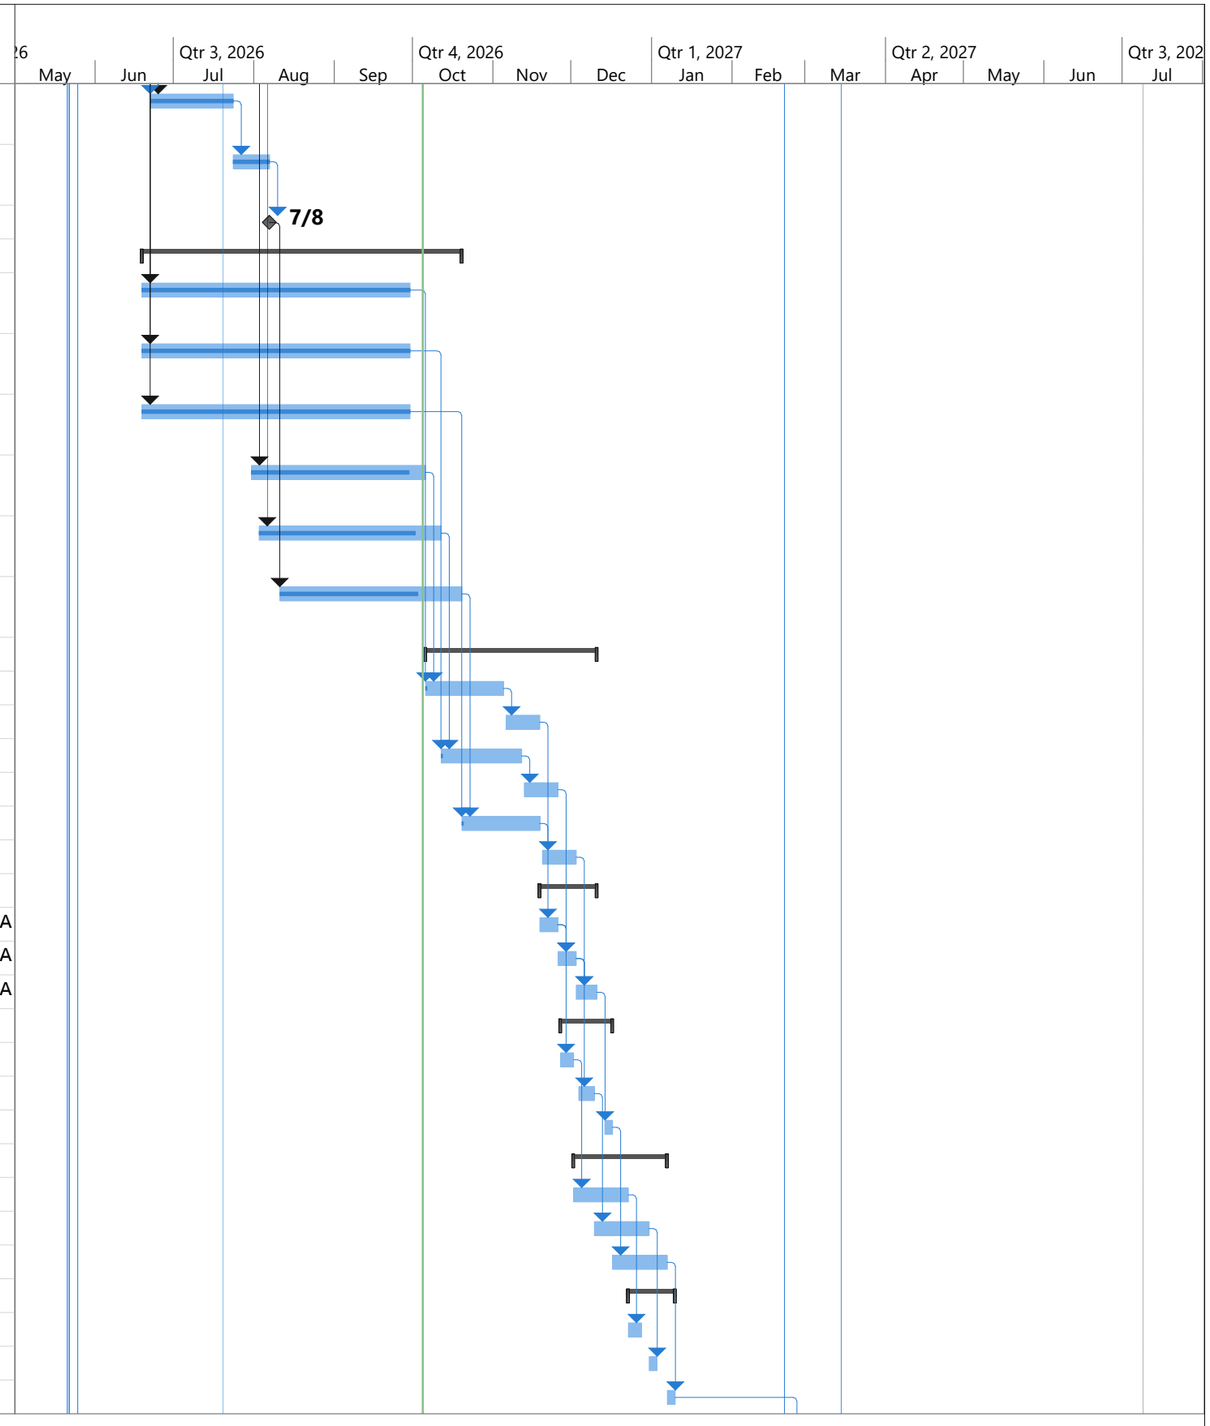

Project: La Calera II - Cronogram
Date: Mon 5/10/26

Task	Inactive Task	Manual Summary Rollup	External Milestone	Manual Progress	
Split	Inactive Milestone	Manual Summary	Deadline		
Milestone	Inactive Summary	Start-only	Critical		
Summary	Manual Task	Finish-only	Critical Split		
Project Summary	Duration-only	External Tasks	Progress		


ID		% Compl	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Text1
66		**47%**		**Drives BT**	**152 days**	**Fri 22/5/26**	**Tue 29/12/26**	
67	✓	10...		Emisión ingeniería básica	37 days	Fri 22/5/26	Thu 16/7/26	ABB
68	✓	10...		Aprobación de ingeniería - Confirmación de slot de fabricación	10 days	Thu 16/7/26	Thu 30/7/26	AESA
69	✓	10...		Freezing Point	0 days	Thu 30/7/26	Thu 30/7/26	ABB
70	✓	10...		Emisión ingeniería de detalle	31 days	Thu 30/7/26	Fri 11/9/26	ABB
71	✓	10...		Aprobación de ingeniería de detalle	8 days	Fri 11/9/26	Wed 23/9/26	AESA
72	✓	10...		Freezing Point	0 days	Wed 23/9/26	Wed 23/9/26	ABB
73	✓	10...		Acopio y fabricación	40 edays	Fri 21/8/26	Wed 30/9/26	ABB
74		10%		Despacho fábrica de origen	7 days	Wed 30/9/26	Fri 9/10/26	ABB
75		0%		Traslado internacional + aduana	75 edays	Fri 9/10/26	Wed 23/12/26	ABB
76		0%		Entrega en Shelterista	2 days	Wed 23/12/2	Tue 29/12/26	ABB
77		**87%**		**Rectificadores/UPS/Baterias**	**138,88 days**	**Mon 18/5/26**	**Mon 30/11/26**	
78	✓	10...		Datos técnicos confirmados en etapa de licitación	0 days	Mon 18/5/26	Mon 18/5/26	AESA
79	✓	100%		Emisión de ingeniería básica	25 days	Mon 18/5/26	Tue 23/6/26	ABB
80	✓	100%		Aprobación de ingeniería básica con comentarios	8 days	Tue 23/6/26	Fri 3/7/26	AESA
81	✓	100%		Freezing Point	0 days	Fri 3/7/26	Fri 3/7/26	ABB
82		**93%**		**Compra y Acopio de Materiales**	**88 days**	**Tue 9/6/26**	**Mon 12/10/26**	**ABB**
83		95%		Baterias	85 days	Tue 9/6/26	Wed 7/10/26	ABB
84		85%		Gabinetes y accesorios	65 days	Mon 13/7/26	Mon 12/10/26	ABB
85		95%		Magnéticos y Semiconductores	60 days	Mon 13/7/26	Mon 5/10/26	ABB
86		98%		Interruptores y Fusibles	60 days	Mon 13/7/26	Mon 5/10/26	ABB
87		90%		Disipadores y capacitores	60 days	Mon 20/7/26	Mon 12/10/26	ABB
88		0%		Fabricación	7 days	Wed 14/10/26	Fri 23/10/26	ABB
89		0%		Ensayos internos	7 days	Mon 26/10/2	Wed 4/11/26	ABB
90		0%		Ensayos - FAT	2,13 days	Thu 12/11/26	Fri 13/11/26	ABB / AESA
91		0%		Acondicionamiento y embalaje	3 days	Mon 16/11/2	Wed 18/11/26	ABB
92		0%		Condicion EXW	5 days	Thu 19/11/26	Wed 25/11/26	ABB
93		0%		Entrega en Shelterista	3 days	Thu 26/11/26	Mon 30/11/26	ABB
94		**70%**		**Tableros Auxiliares**	**151 days**	**Fri 22/5/26**	**Mon 28/12/26**	
95	✓	100%		Emisión ingeniería básica	35 days	Fri 22/5/26	Tue 14/7/26	ABB
96	✓	100%		Aprobación de Ingeniería Básica	6 days	Tue 14/7/26	Wed 22/7/26	AESA
97	✓	100%		Freezing Point	0 days	Wed 22/7/26	Wed 22/7/26	ABB
98	✓	100%		Emisión Ingeniería de detalle	16 days	Wed 22/7/26	Thu 13/8/26	ABB
99	✓	100%		Aprobación de Ingeniería de Detalle	10 days	Thu 13/8/26	Thu 27/8/26	AESA
100	✓	100%		Freezing Point	0 days	Thu 27/8/26	Thu 27/8/26	ABB
101		72%		Acopio de Materiales	100 edays	Wed 22/7/26	Fri 30/10/26	ABB
102		0%		Fabricación	29 days	Fri 30/10/26	Fri 11/12/26	ABB

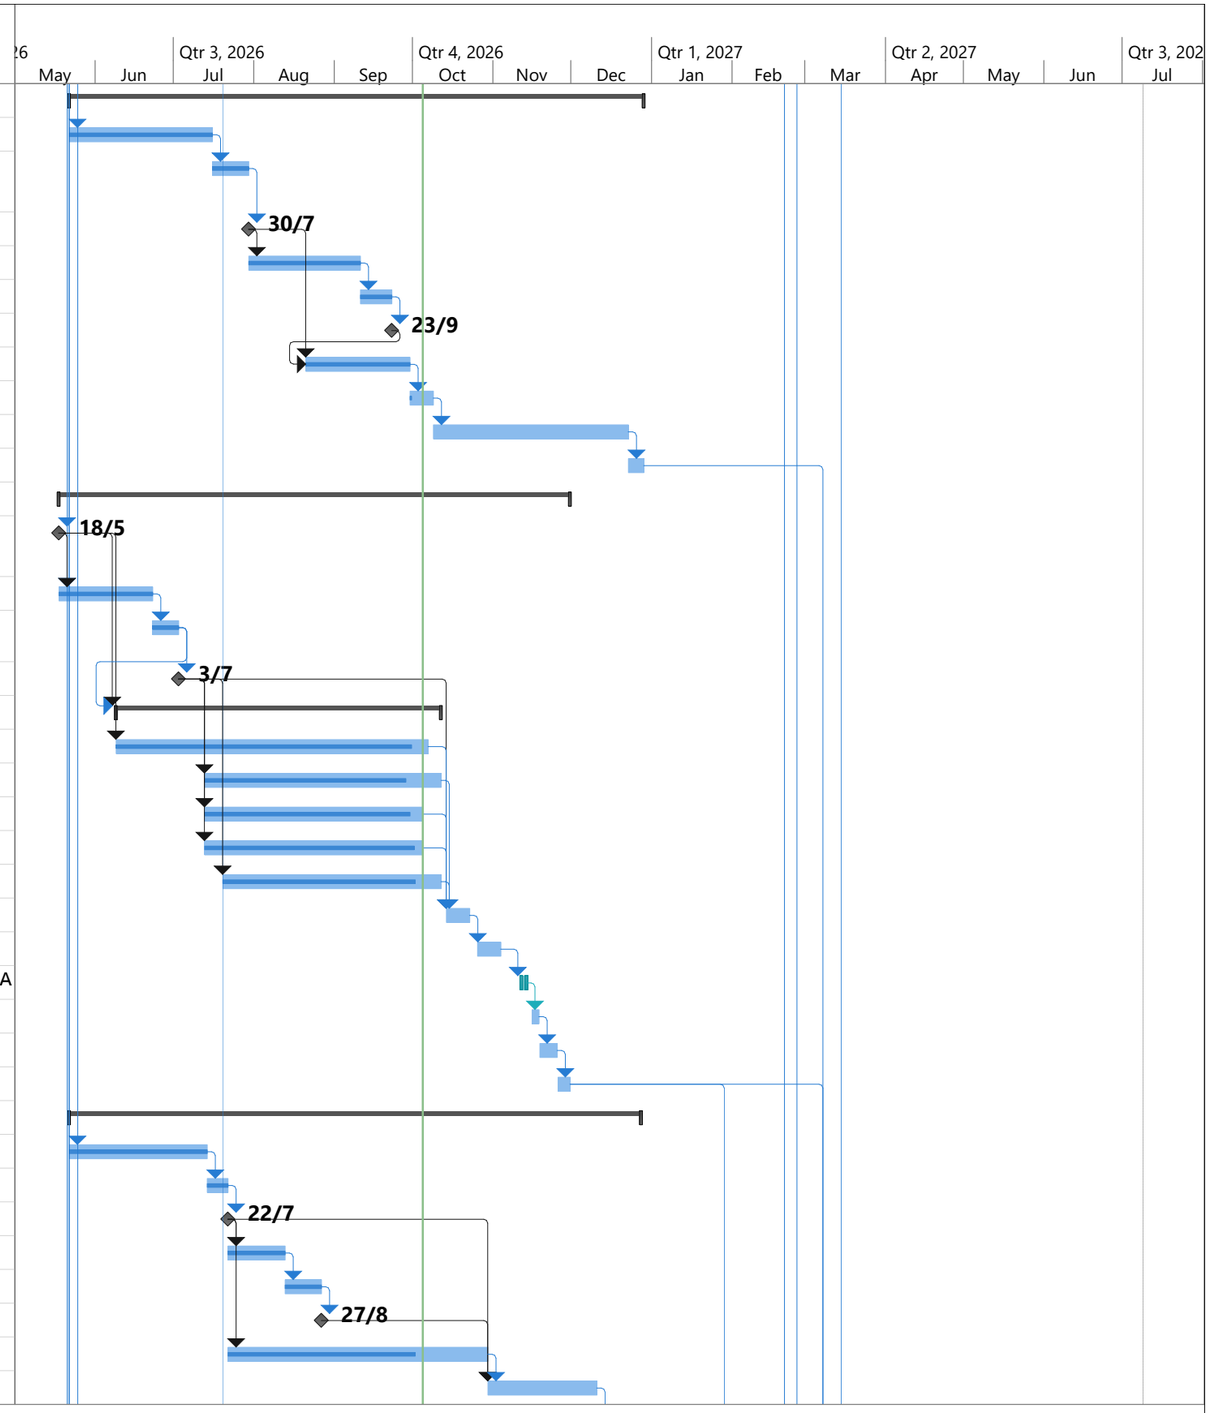

Project: La Calera II - Cronogram
Date: Mon 5/10/26

Task	Inactive Task	Manual Summary Rollup	External Milestone	Manual Progress
Split	Inactive Milestone	Manual Summary	Deadline	
Milestone	Inactive Summary	Start-only	Critical	
Summary	Manual Task	Finish-only	Critical Split	
Project Summary	Duration-only	External Tasks	Progress	


ID		% Compl	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Text1
103		0%		Ensayos - FAT	2 days	Mon 14/12/26	Wed 16/12/26	ABB / AESA
104		0%		Disponible para entrega	3 days	Wed 16/12/26	Mon 21/12/26	ABB
105		0%		Entrega en Shelterista	3 days	Mon 21/12/26	Mon 28/12/26	ABB
106		**24%**		**Ductos de barras**	**244 days**	**Mon 20/7/26**	**Thu 8/7/27**	
107	✓	100%		Emisión Layout instalación + Detalle de Conexionado Trafo	60 edays	Mon 20/7/26	Fri 18/9/26	AESA
108	✓	10...		Freezing Point para inicio de diseño	0 days	Fri 18/9/26	Fri 18/9/26	ABB
109		15%		Diseño de ductos	60 days	Fri 18/9/26	Mon 14/12/26	ABB
110		0%		Aprobación de diseño	10 days	Mon 14/12/2	Wed 30/12/26	AESA
111		0%		Freezing Point	0 days	Wed 30/12/26	Wed 30/12/26	ABB
112		0%		Fabricación	100 edays	Wed 30/12/26	Fri 9/4/27	ABB
113		0%		FCA fabrica de origen	5 days	Fri 9/4/27	Fri 16/4/27	ABB
114		0%		Traslado internacional + aduana	80 edays	Fri 16/4/27	Mon 5/7/27	ABB
115		0%		Entrega en sitio	3 days	Mon 5/7/27	Thu 8/7/27	ABB
116		**39%**		**Sala eléctrica 3**	**230 days**	**Mon 18/5/26**	**Tue 20/4/27**	
117	✓	100%		Confirmación Layout Sala y equipamento	2 days	Mon 18/5/26	Wed 20/5/26	ABB / AESA
118	✓	10...		Definición de equipos para control de acc	0 days	Tue 30/6/26	Tue 30/6/26	AESA
119	✓	100%		Emisión ingeniería básica	80 days	Wed 20/5/26	Fri 11/9/26	ABB
120		90%		Aprobación de Ingeniería Básica	10 days	Fri 11/9/26	Fri 25/9/26	AESA
121		0%		Freezing Point	0 days	Fri 25/9/26	Fri 25/9/26	ABB
122		95%		Emisión Ingeniería de detalle	90 days	Fri 22/5/26	Tue 29/9/26	ABB
123		0%		Aprobación de Ingeniería de Detalle	10 days	Tue 29/9/26	Tue 13/10/26	AESA
124		0%		Freezing Point	0 days	Tue 13/10/26	Tue 13/10/26	ABB
125		62%		Compra y acopio de materiales	205 edays	Tue 19/5/26	Thu 10/12/26	ABB
126		0%		Suministro de equipos para control de acceso	0 days	Sat 13/2/27	Sat 13/2/27	AESA
127		**0%**		**Fabricación**	**67 days**	**Mon 23/11/2**	**Fri 5/3/27**	
128		0%		Construcción base	45 edays	Mon 23/11/2	Thu 7/1/27	ABB
129		0%		Construcción estructura	38 edays	Fri 18/12/26	Mon 25/1/27	ABB
130		0%		Revestimiento exterior e interior	30 edays	Mon 11/1/27	Wed 10/2/27	ABB
131		0%		Pintura exterior e interior	60 edays	Tue 15/12/26	Sat 13/2/27	ABB
132		0%		Instalación eléctrica	20 edays	Sat 13/2/27	Fri 5/3/27	ABB
133		**0%**		**Montaje e integración de equipos**	**13 days**	**Fri 26/2/27**	**Wed 17/3/27**	
134		0%		Montaje tableros CCMs	6 days	Fri 26/2/27	Mon 8/3/27	ABB
135		0%		Montaje Drives	2 days	Mon 8/3/27	Wed 10/3/27	ABB
136		0%		Montaje Rectificadores/UPS/Baterias	2 days	Mon 8/3/27	Wed 10/3/27	ABB
137		0%		Montaje Tableros Auxiliares	3 days	Wed 10/3/27	Mon 15/3/27	ABB
138		0%		Montaje PMS	2 days	Mon 15/3/27	Wed 17/3/27	ABB
139		0%		Interconexión de equipos	10 days	Tue 9/3/27	Tue 23/3/27	ABB
140		0%		Ensayos FAT (sala eléctrica)	3 days	Tue 23/3/27	Tue 30/3/27	ABB / AESA

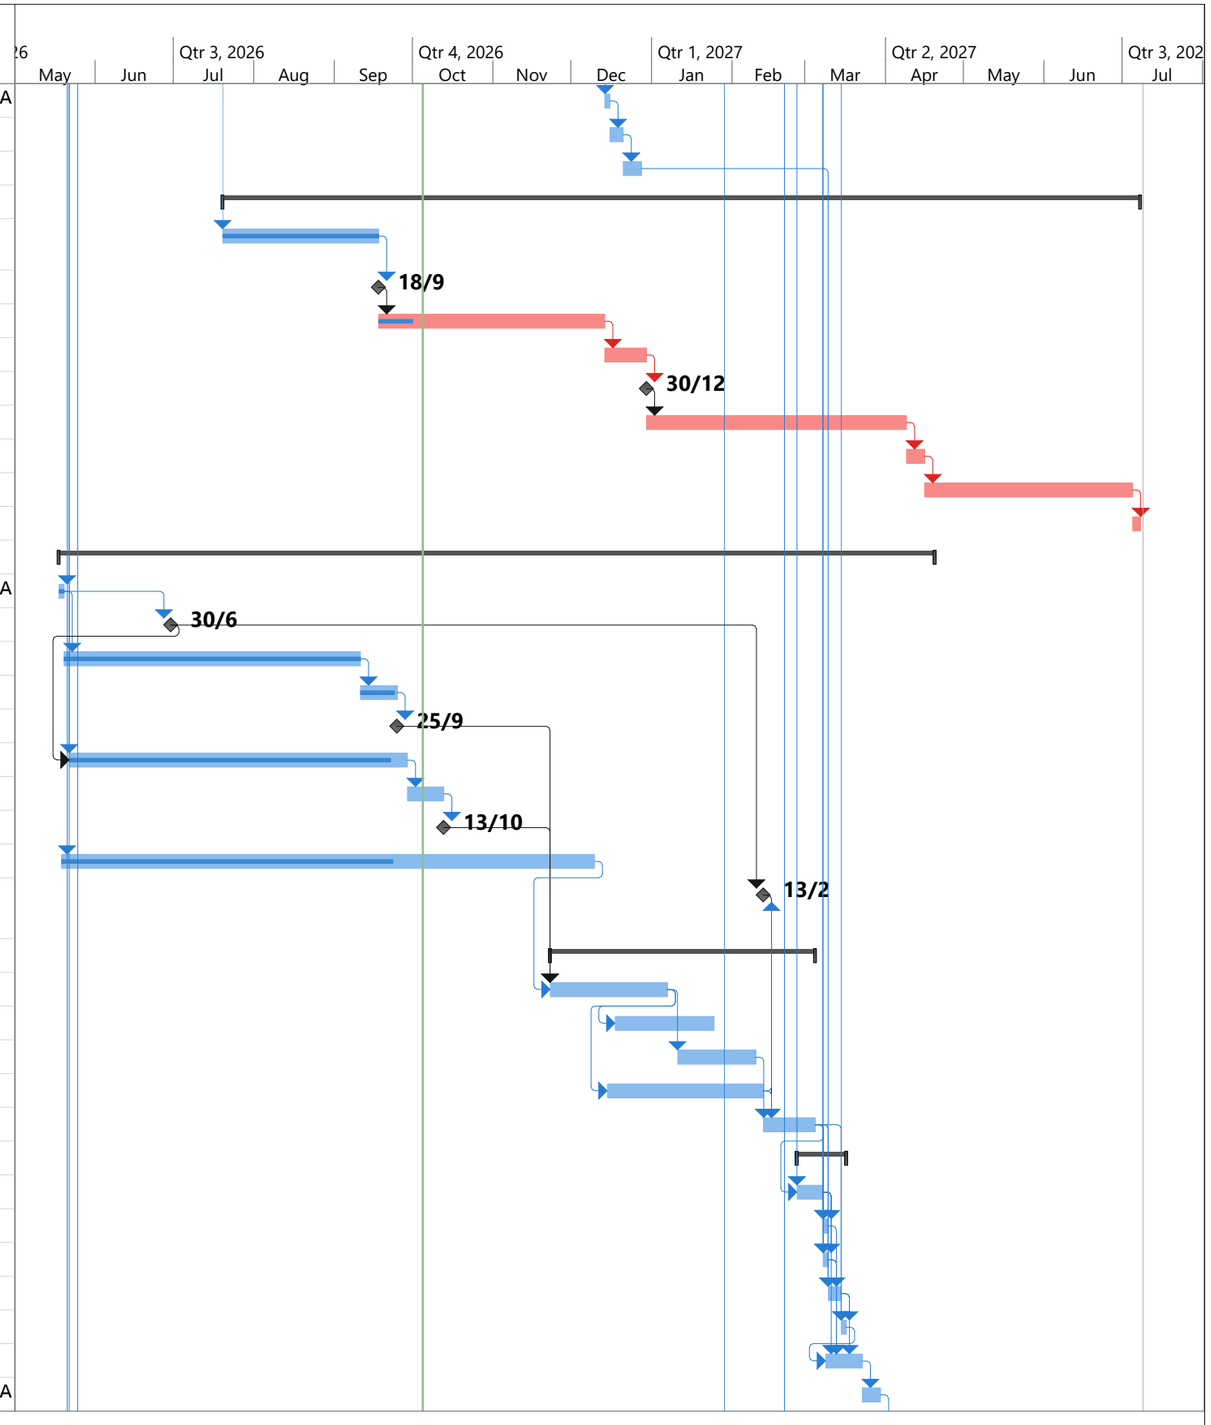

Project: La Calera II - Cronogram
Date: Mon 5/10/26

Task	Inactive Task	Manual Summary Rollup	External Milestone	Manual Progress
Split	Inactive Milestone	Manual Summary	Deadline	
Milestone	Inactive Summary	Start-only	Critical	
Summary	Manual Task	Finish-only	Critical Split	
Project Summary	Duration-only	External Tasks	Progress	


ID		% Compl	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Text1
141		0%		Ensayos PMS (Contrato PMS)	5 days	Tue 30/3/27	Tue 6/4/27	ABB / AESA
142		0%		Desconexion de interconexionado para viaje	6 edays	Tue 6/4/27	Mon 12/4/27	ABB
143		0%		Embalaje	3 days	Mon 12/4/27	Thu 15/4/27	ABB
144		0%		Despacho	3 days	Thu 15/4/27	Tue 20/4/27	ABB
145		0%		Entrega en condición EXW	0 days	Tue 20/4/27	Tue 20/4/27	ABB
146		**50%**		**Sala Eléctrica #4 MT**	**213,88 days**	**Mon 18/5/26**	**Thu 25/3/27**	
147		**64%**		**Equipos**	**156 days**	**Fri 22/5/26**	**Wed 6/1/27**	
148		**72%**		**Celdas MT Unigear**	**156 days**	**Fri 22/5/26**	**Wed 6/1/27**	
149	✓	**100%**		**Ingeniería**	**48 days**	**Fri 22/5/26**	**Fri 31/7/26**	
150	✓	100%		Emisión ingeniería básica	13 days	Fri 22/5/26	Thu 11/6/26	ABB
151	✓	100%		Aprobación de Ingeniería Básica	7 days	Thu 11/6/26	Mon 22/6/26	AESA
152	✓	100%		Freezing Point	0 days	Mon 22/6/26	Mon 22/6/26	ABB
153	✓	100%		Emisión Ingeniería de detalle	15 days	Mon 22/6/26	Tue 14/7/26	ABB
154	✓	100%		Aprobación de Ingeniería de Detalle	13 days	Tue 14/7/26	Fri 31/7/26	AESA
155	✓	100%		Freezing Point	0 edays	Fri 31/7/26	Fri 31/7/26	ABB
156		78%		**Acopio de materiales y fabricación**	121 days	Mon 22/6/26	Thu 10/12/26	
157		78%		Compra de materiales principales	130 edays	Mon 22/6/26	Fri 30/10/26	ABB
158		95%		Compra de materiales secundarios	65 edays	Fri 31/7/26	Sun 4/10/26	ABB
159		0%		Fabricación	27 days	Thu 8/10/26	Mon 16/11/26	ABB
160		0%		Ensayos internos	7 days	Tue 17/11/26	Thu 26/11/26	ABB
161		0%		Ensayos - FAT	5 days	Fri 27/11/26	Fri 4/12/26	ABB / AESA
162		0%		Acondicionamiento y embalaje	3 days	Fri 4/12/26	Thu 10/12/26	ABB
163		0%		FCA fabrica de origen	2 days	Thu 10/12/26	Mon 14/12/26	ABB
164		0%		Traslado internacional + aduana	21 edays	Mon 14/12/26	Mon 4/1/27	ABB
165		0%		Entrega en Shelterista	2 days	Mon 4/1/27	Wed 6/1/27	ABB
166		**45%**		**Drives MT**	**153 days**	**Fri 22/5/26**	**Wed 30/12/26**	
167	✓	100%		Emisión ingeniería básica	37 days	Fri 22/5/26	Thu 16/7/26	ABB
168	✓	100%		Aprobación de ingeniería - Confirmación de slot de fabricación	10 days	Thu 16/7/26	Thu 30/7/26	AESA
169	✓	100%		Freezing Point	0 days	Thu 30/7/26	Thu 30/7/26	ABB
170	✓	10...		Emisión ingeniería de detalle	3 days	Thu 30/7/26	Tue 4/8/26	ABB
171	✓	10...		Aprobación de ingeniería de detalle	10 days	Tue 4/8/26	Tue 18/8/26	AESA
172	✓	10...		Freezing Point	0 days	Tue 18/8/26	Tue 18/8/26	ABB
173	✓	10...		Acopio y fabricación	43 edays	Tue 18/8/26	Wed 30/9/26	ABB
174		10%		Despacho fábrica de origen	7 days	Wed 30/9/26	Fri 9/10/26	ABB
175		0%		Traslado internacional + aduana	75 edays	Fri 9/10/26	Wed 23/12/26	ABB
176		0%		Entrega en Shelterista	3 days	Wed 23/12/2	Wed 30/12/26	ABB
177		**70%**		**Tableros Auxiliares**	**151 days**	**Fri 22/5/26**	**Mon 28/12/26**	
178	✓	10...		Emisión ingeniería básica	35 days	Fri 22/5/26	Tue 14/7/26	ABB
179	✓	10...		Aprobación de Ingeniería Básica	6 days	Tue 14/7/26	Wed 22/7/26	AESA

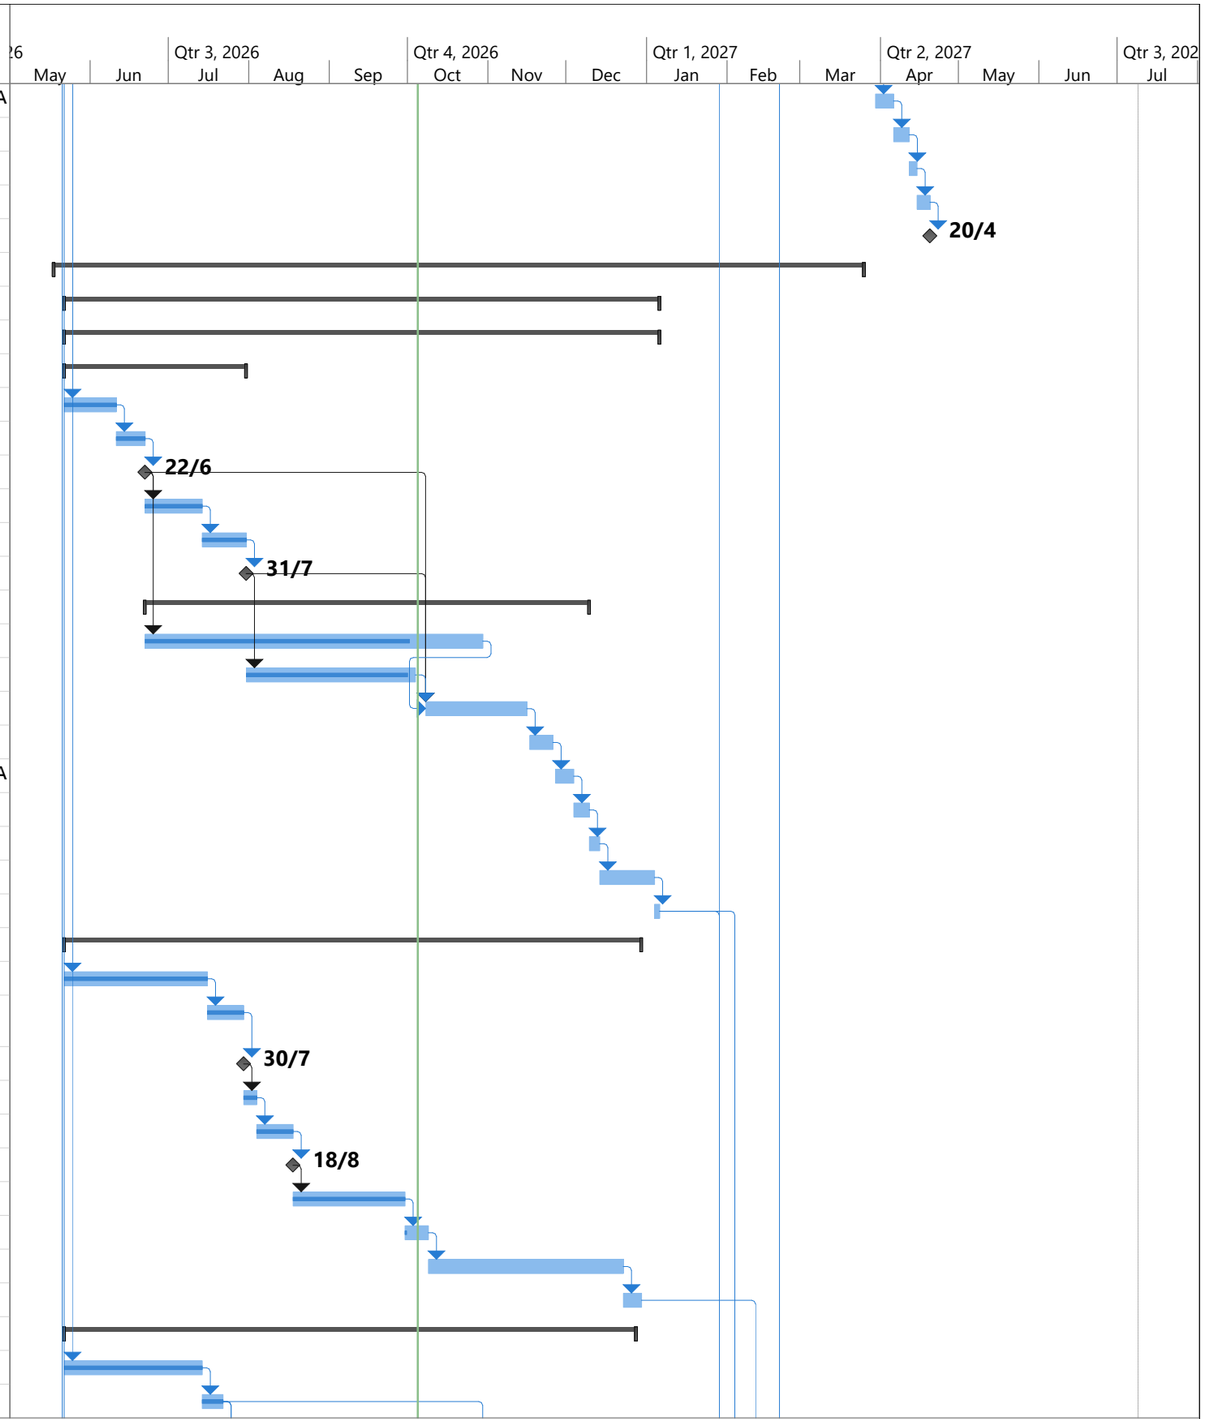

Project: La Calera II - Cronogram
Date: Mon 5/10/26

Task	Inactive Task	Manual Summary Rollup	External Milestone	Manual Progress
Split	Inactive Milestone	Manual Summary	Deadline	
Milestone	Inactive Summary	Start-only	Critical	
Summary	Manual Task	Finish-only	Critical Split	
Project Summary	Duration-only	External Tasks	Progress	

ID		% Compl	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Text1
180	✓	10...		Freezing Point	0 days	Wed 22/7/26	Wed 22/7/26	ABB
181	✓	10...		Emisión Ingeniería de detalle	16 days	Wed 22/7/26	Thu 13/8/26	ABB
182	✓	10...		Aprobación de Ingeniería de Detalle	10 days	Thu 13/8/26	Thu 27/8/26	AESA
183	✓	10...		Freezing Point	0 days	Thu 27/8/26	Thu 27/8/26	ABB
184		72%		Acopio de Materiales	100 edays	Wed 22/7/26	Fri 30/10/26	ABB
185		0%		Fabricación	29 days	Fri 30/10/26	Fri 11/12/26	ABB
186		0%		Ensayos - FAT	2 days	Mon 14/12/26	Wed 16/12/26	ABB / AESA
187		0%		Disponible para entrega	3 days	Wed 16/12/26	Mon 21/12/26	ABB
188		0%		Entrega en Shelterista	3 days	Mon 21/12/26	Mon 28/12/26	ABB
189		**35%**		**Sala eléctrica 4**	**213,88 days**	**Mon 18/5/26**	**Thu 25/3/27**	
190	✓	100%		Confirmación Layout Sala y equipamento	2 days	Mon 18/5/26	Wed 20/5/26	ABB / AESA
191	✓	10...		Definición de equipos para control de acc	0 days	Tue 30/6/26	Tue 30/6/26	AESA
192	✓	100%		Emisión ingeniería básica	80 days	Wed 20/5/26	Fri 11/9/26	ABB
193		90%		Aprobación de Ingeniería Básica	10 days	Fri 11/9/26	Fri 25/9/26	AESA
194		0%		Freezing Point	0 days	Fri 25/9/26	Fri 25/9/26	ABB
195		95%		Emisión Ingeniería de detalle	90 days	Fri 22/5/26	Tue 29/9/26	ABB
196		0%		Aprobación de Ingeniería de Detalle	10 days	Tue 29/9/26	Tue 13/10/26	AESA
197		0%		Freezing Point	0 days	Tue 13/10/26	Tue 13/10/26	ABB
198		62%		Compra y acopio de materiales	205 edays	Tue 19/5/26	Thu 10/12/26	ABB
199		0%		Suministro de equipos para control de acceso	0 days	Mon 4/1/27	Mon 4/1/27	AESA
200		**0%**		**Fabricación**	**77,88 days**	**Tue 6/10/26**	**Fri 29/1/27**	
201		0%		Construcción base	60 edays	Tue 6/10/26	Sat 5/12/26	ABB
202		0%		Construcción estructura	50 edays	Fri 30/10/26	Sat 19/12/26	ABB
203		0%		Revestimiento exterior e interior	40 edays	Mon 23/11/2	Sat 2/1/27	ABB
204		0%		Pintura exterior e interior	70 edays	Mon 26/10/2	Mon 4/1/27	ABB
205		0%		Instalación eléctrica	25 edays	Mon 4/1/27	Fri 29/1/27	ABB
206		**0%**		**Montaje e integración de equipos**	**14 days**	**Fri 29/1/27**	**Fri 19/2/27**	
207		0%		Montaje Tableros Auxiliares UPS	3 days	Fri 29/1/27	Tue 2/2/27	ABB
208		0%		Montaje Tableros Auxiliares	4 days	Fri 29/1/27	Wed 3/2/27	ABB
209		0%		Montaje Tablero MT	4 days	Thu 4/2/27	Thu 11/2/27	ABB
210		0%		Montaje Drives	3 days	Fri 12/2/27	Tue 16/2/27	ABB
211		0%		Montaje PMS	2 days	Thu 18/2/27	Fri 19/2/27	ABB
212		0%		Interconexión de equipos	5 days	Wed 17/2/27	Tue 23/2/27	ABB
213		0%		Ensayos FAT (sala eléctrica)	3 days	Thu 25/2/27	Mon 1/3/27	ABB / AESA
214		0%		Ensayos PMS (Contrato PMS)	5 days	Wed 3/3/27	Tue 9/3/27	ABB / AESA
215		0%		Desconexion de interconexionado para viaje	5 days	Wed 10/3/27	Tue 16/3/27	ABB
216		0%		Embalaje	3 days	Wed 17/3/27	Fri 19/3/27	ABB
217		0%		Despacho	3 days	Mon 22/3/27	Thu 25/3/27	ABB
218		0%		Entrega en condición EXW	0 days	Thu 25/3/27	Thu 25/3/27	ABB

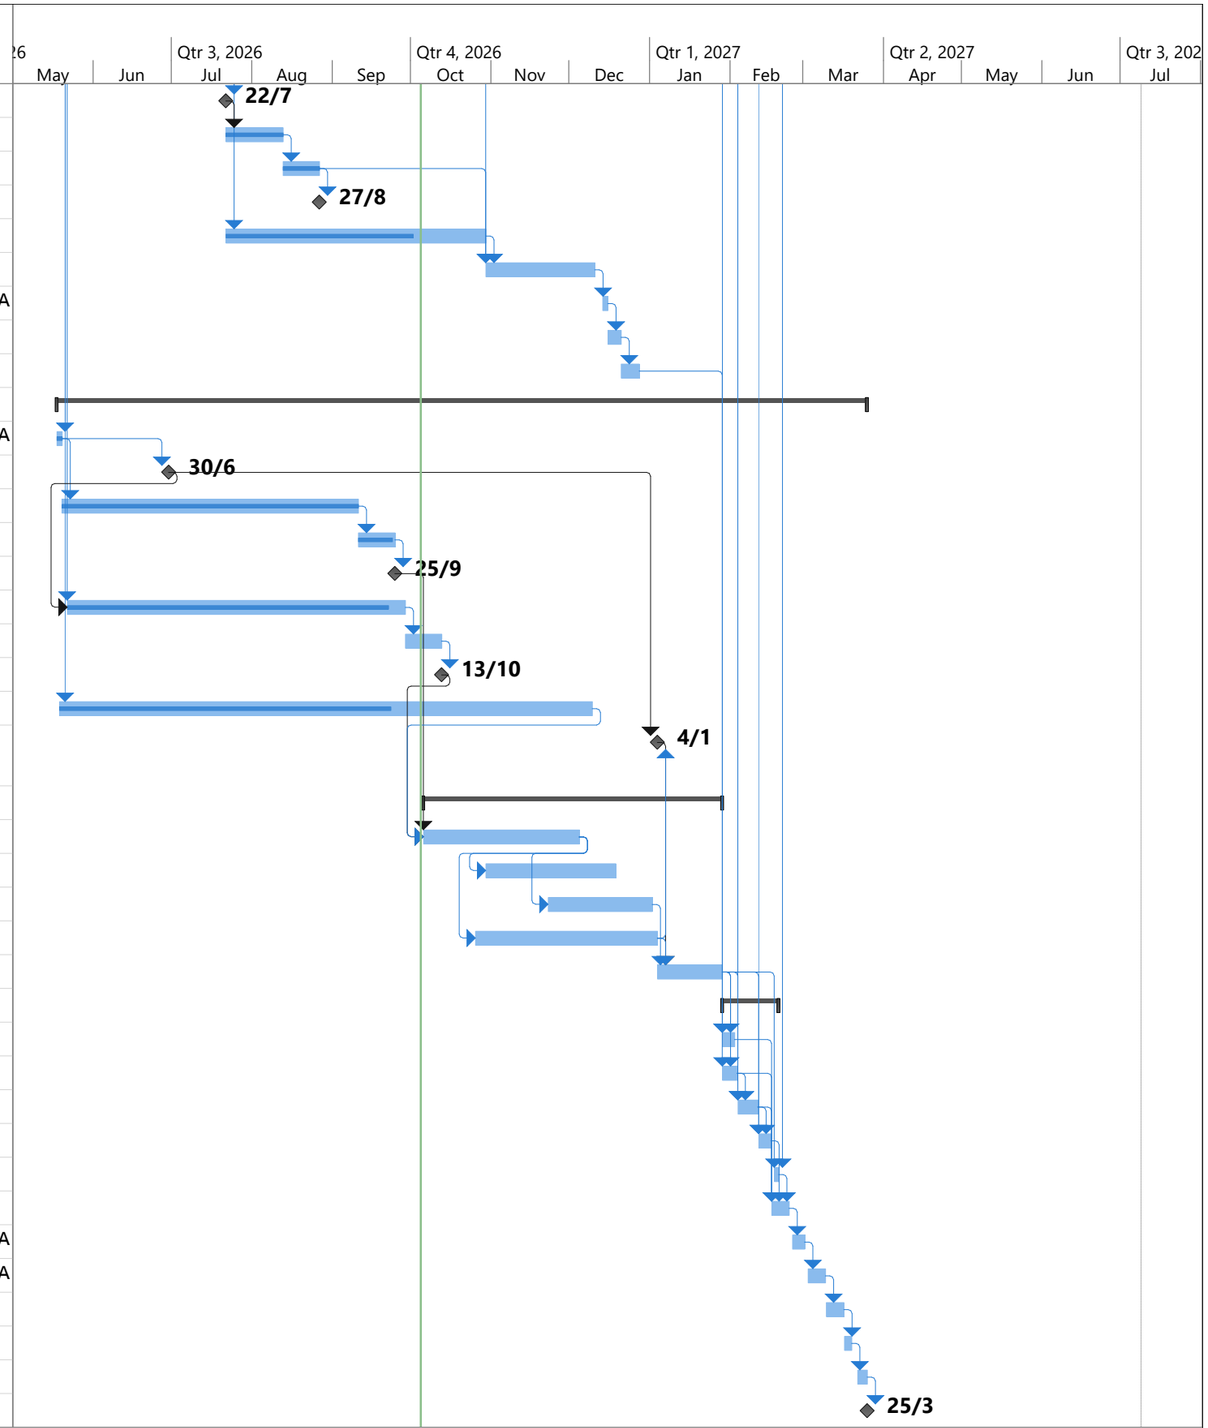

Project: La Calera II - Cronogram
Date: Mon 5/10/26

Task	Inactive Task	Manual Summary Rollup	External Milestone	Manual Progress
Split	Inactive Milestone	Manual Summary	Deadline	
Milestone	Inactive Summary	Start-only	Critical	
Summary	Manual Task	Finish-only	Critical Split	
Project Summary	Duration-only	External Tasks	Progress	
