# FLUJO INTEGRADO DE PROVISIONES — CPF-2 La Calera II · Rev3 · 2026-10-27

Convergencia de las 8 provisiones hacia el montaje en planta → iFAT en sitio → comisionado → RFSU. En rojo, el camino crítico de sistemas.

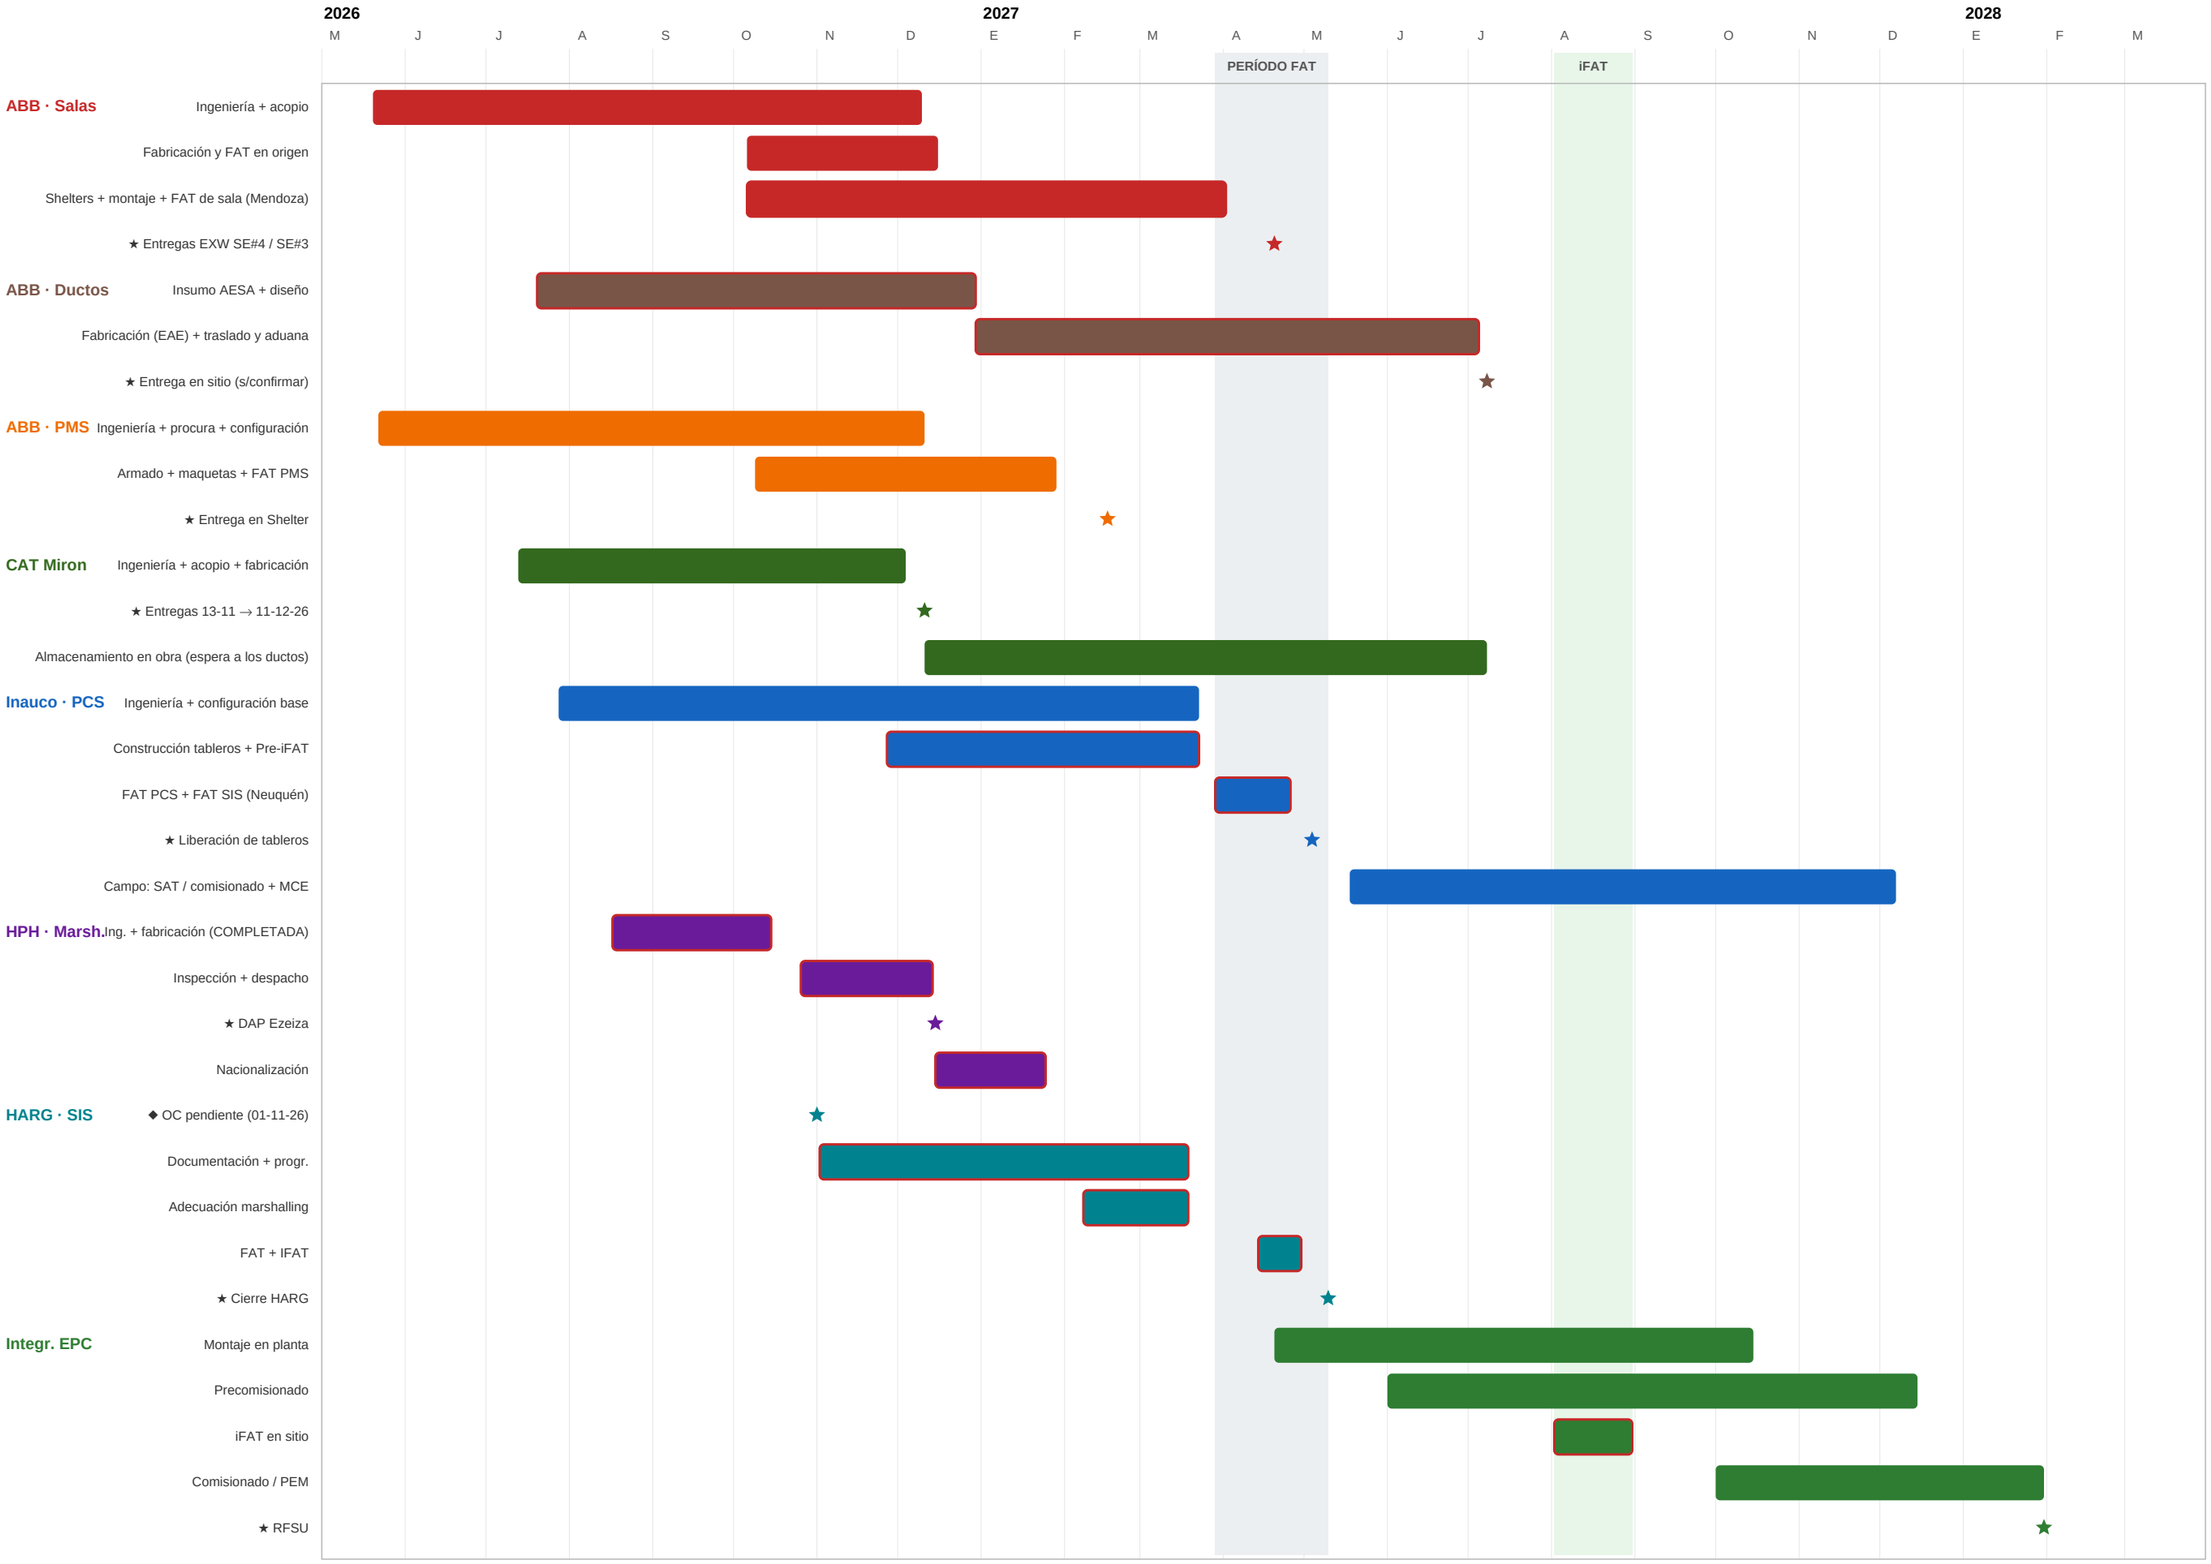


*Ruta crítica de sistemas: OC de HARG (pendiente) → HPH (fabricación completada, DAP Ezeiza 15-DIC) → nacionalización → adecuación en base Inauco → FAT SIS → cierre HARG 10-MAY-2027.*

*Los ductos de barras corren por fuera del camino crítico de sistemas pero son la ÚLTIMA ENTREGA del paquete (08-JUL-2027) y condicionan el montaje de la vinculación a transformadores.*

*Los 13 transformadores llegan entre nov y dic de 2026 y quedan 7 meses almacenados a la espera de los ductos.*
