CRONOGRAMA INTEGRADO — CPF-2 La Calera II · Rev3 · 2026-10-27

8 provisiones · ABB Salas y Ductos REV 0 «Para construcción» (14-10-26) · ABB PMS SEP-2026 REV 0 · CAT Miron (29-09-26) · Inauco REV 0 «Para construcción» (23-10-26) · HPH informe N (15-10-26) · HARG con OC pendiente

Camino crítico de sistemas: cierre HARG 10-MAY-2027 · Última entrega del paquete: ductos de barras 08-JUL-2027 · RFSU 31-ENE-2028

ABB · Salas

- Ingeniería básica y de detalle (equipos APROBADOS · sala pendi
- ◆ Freezing point ing. básica de salas — VENCIDO 25-09-26
- Acopio de materiales (CCM 93% · UPS 93% · auxiliares 72%)
- Fabricación de tableros en origen (Sorocaba · Santa Fe · AMBA)
- FAT en fábrica de origen (UPS · TGMT · CCM · auxiliares)
- Entrega en Shelterista (Mendoza)
- Fabricación de los shelters (Bottino)
- Montaje e integración de equipos en salas
- FAT Salas en Mendoza (SE#4 22-26/02 · SE#3 29/03-02/04)
- Ensayos PMS en sala (interfase contrato PMS)
- ★ Entrega EXW SE#4 (25-03-27) · contractual 08-04-27
- ★ Entrega EXW SE#3 (20-04-27) · contractual 14-05-27

ABB · Ductos

- Insumo AESA: layout + detalle de conexionado a trafo
- Diseño de ductos (arrancó efectivamente el 21-09-26) — 15%
- Aprobación de diseño + freezing point (30-12-26)
- Acopio y fabricación (EAE Turquía — entrega en origen «tbd»)
- FCA + traslado internacional + aduana (80 d)
- ★ Entrega en sitio (08-07-27) — PLAZO SIN CONFIRMAR

ABB · PMS

- Ingeniería básica y Rev.0 + aprobación (freezing 11-09-26)
- Procura y acopio — gestión de compra al 100%
- Configuración / programación del sistema (32%)
- Armado de tableros (inicio corrido al 09-10-26)
- Maqueta integrada CPF1
- Maqueta CPF2 — integración PCS↔PMS con Inauco (Bs.As.)
- Pruebas internas + FAT tableros y sistema (witness AESA)
- Despachos
- ★ Entrega de equipamiento en Shelter (17-02-27)
- FAT integral del shelter (PMS) + DataBook

CAT Miron

- Ingeniería: cálculo, diseño y proyecto de detalle (5 OT)
- Acopio: conductores BT/MT y materiales gruesos (gabinetes)
- Fabricación: núcleo magnético, bobinado y montaje
- Ensayos internos · FAT NO incluidas en el cronograma
- ★ Entregas escalonadas de los 13 transformadores (13-11 → 11-1
- Almacenamiento y conservación en obra (7 meses hasta los ducto

Inauco · PCS

- ◆ Recepción de OC — inicio del proyecto (28-07-26)
- Recepción de ingeniería de AESA — 5 entregas (2 vencidas)
- Emisión de ingeniería Rev.A y Rev.0 de tableros
- Configuración base — PLC/comunicaciones y SCADA (12%)
- ◆ Freezing point: aprobación de ing. para construcción (19-11)
- Pruebas de integración con ABB PMS (Bs.As.) — ADELANTADA
- Construcción de tableros 07a / 07b / COM-07
- Pre-iFAT interna (previa a la FAT con el cliente)
- FAT PCS + Comunicaciones (Inauco Neuquén)
- FAT SIS — conjunto con HIMA (Inauco Neuquén)
- ★ Fin de FAT integral (26-04-27)
- Configuraciones post-FAT
- ★ Liberación y entrega de tableros (04-05-27)
- SAT y comisionado PCS — campo
- SAT y comisionado SCADA/SIS — campo
- Prueba MCE + cierre de documentación

HPH · Marsh.

- Ingeniería de detalle (80%) + acopio — material ENTREGADO
- Fabricación de los 3 tableros de marshalling — COMPLETADA
- Inspección / HW check de los 3 tableros (semana 44-45)
- ◆ Letter of Credit de la orden ampliada (AESA) — 30-10-26
- Packing y despacho desde Alemania
- ★ Entrega DAP Ezeiza aeropuerto (15-12-26) — CONFIRMADA
- Nacionalización + transporte a base Inauco
- ★ Recepción de tableros en base Inauco (25-01-27)

HARG · SIS

- ◆ COLOCACIÓN DE LA OC (AESA) — PENDIENTE, asumida 01-11-26
- Documentación y programación HARG (recursos 1 y 2)
- Ingeniería de aplicación SIS (insumo de HPH)
- Adecuación de tableros de marshalling en base Inauco
- FAT HARG
- IFAT — integración (recursos 1 y 2)
- ★ Entrega del alcance HARG (10-05-27) — fin del camino crítico

Integr. EPC

- Montaje en planta de salas y equipos
- Montaje de los ductos de barras (no puede iniciar antes del 08
- Precomisionado
- iFAT — integración en sitio (shelters + PMS + PCS + SIS)
- Comisionado / Puesta en marcha (PEM)
- ★ RFSU — Ready For Start Up (31-01-2028)

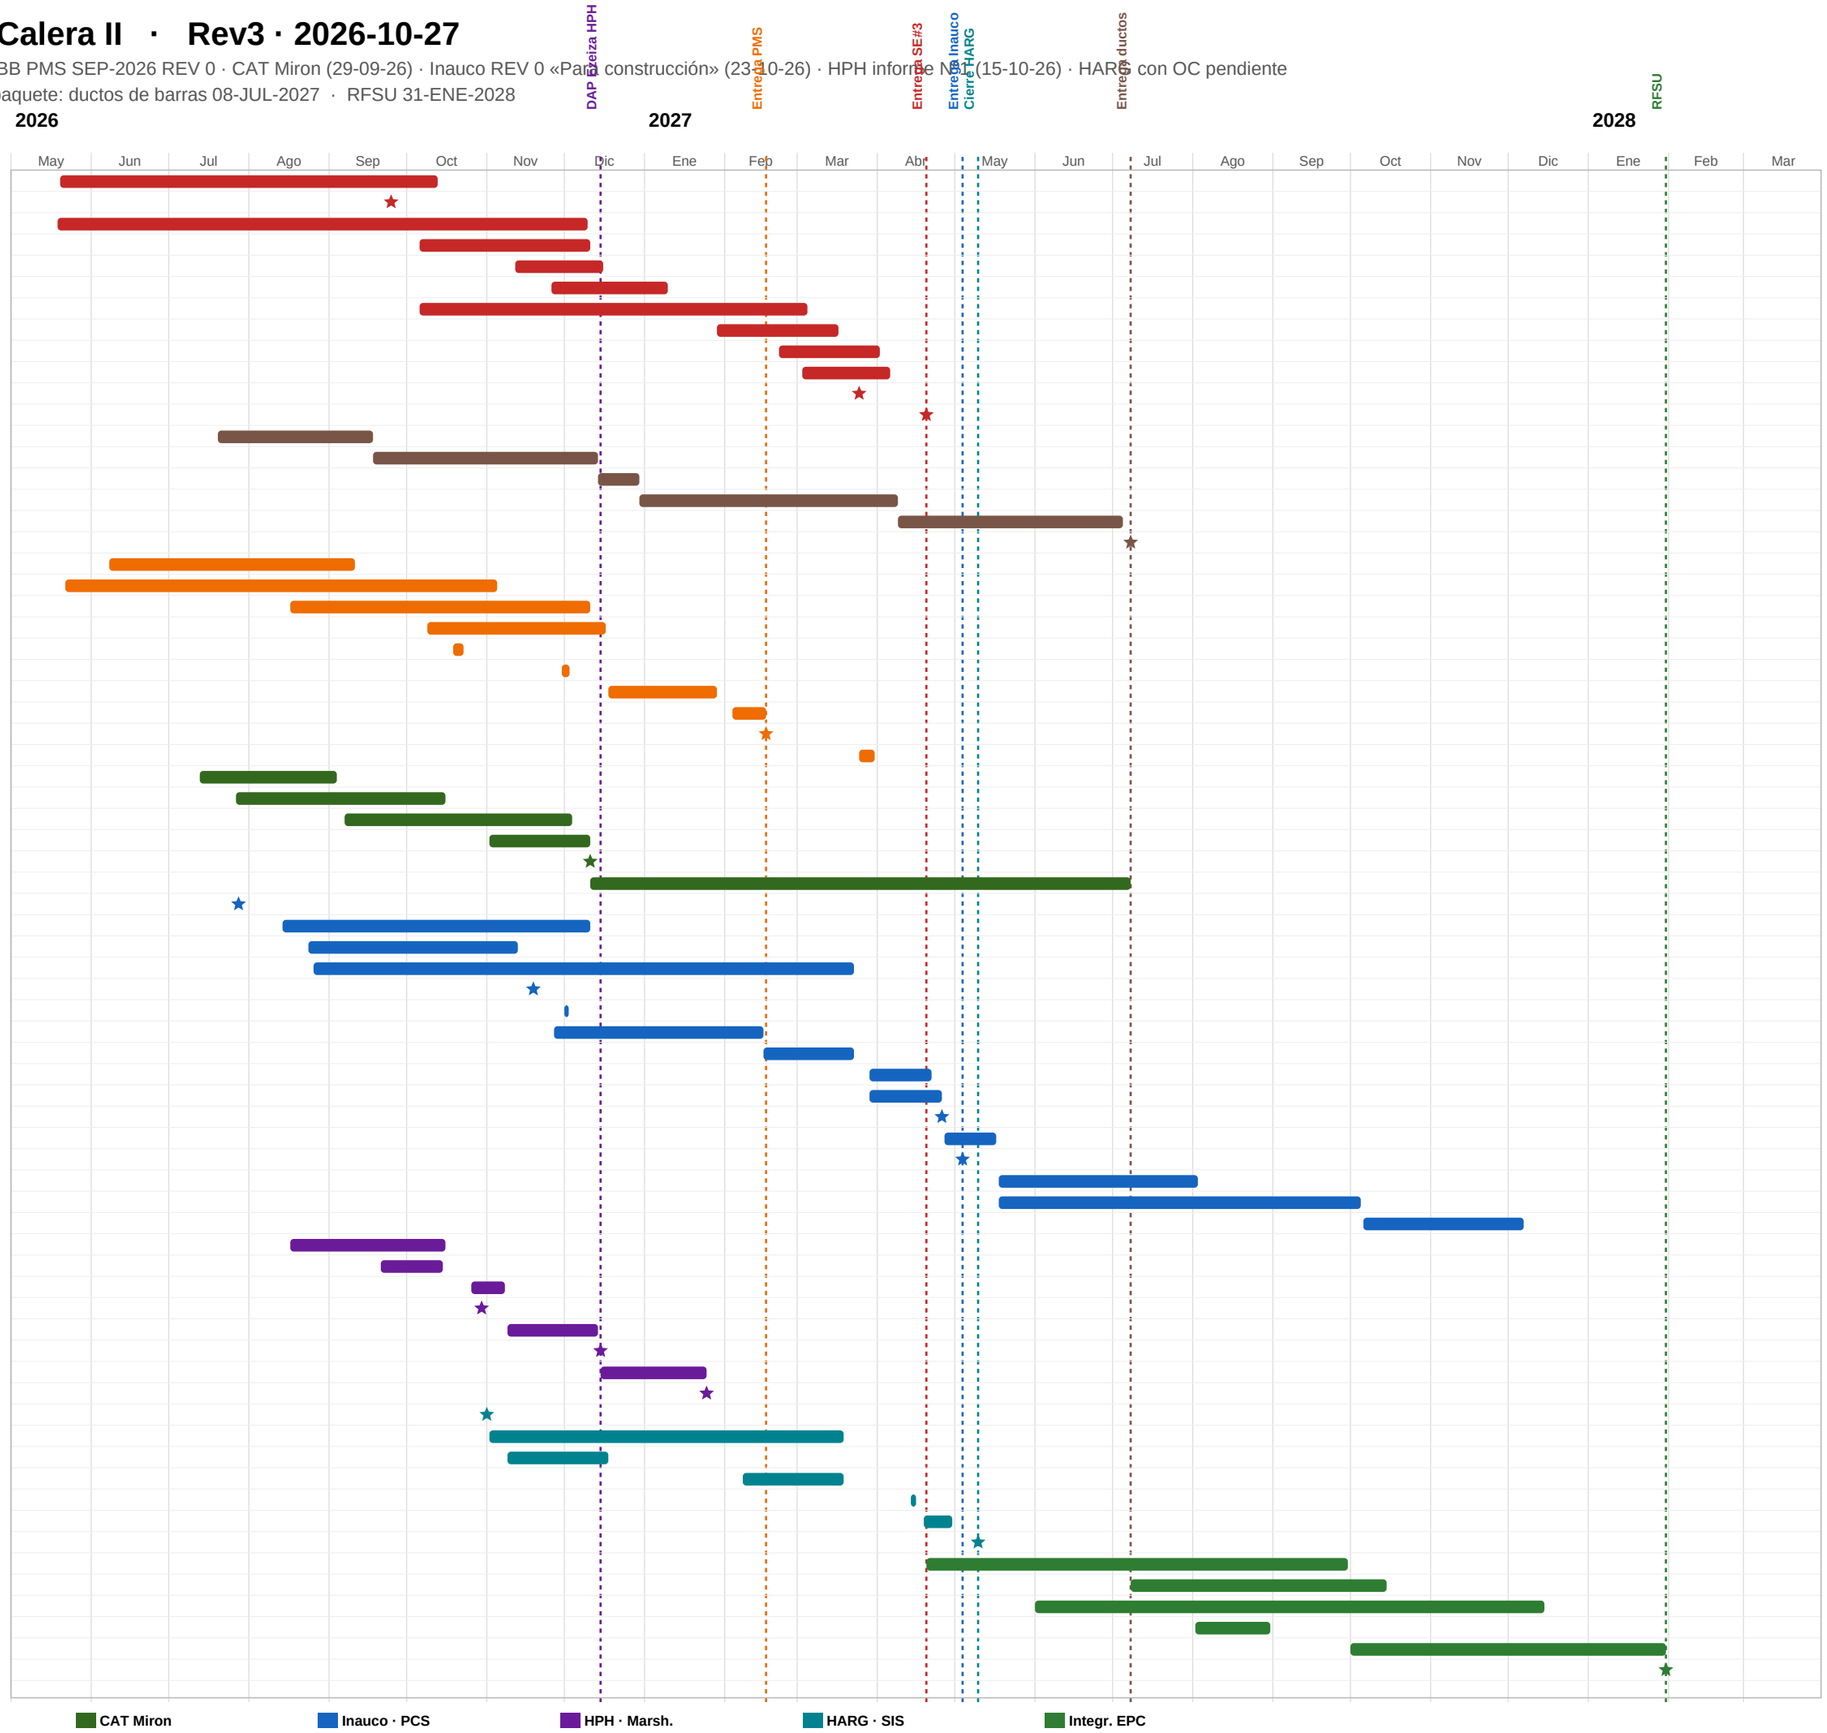

ABB · Salas · ABB · Ductos · ABB · PMS · CAT Miron · Inauco · PCS · HPH · Marsh. · HARG · SIS · Integr. EPC

Fechas de los cronogramas vigentes de cada proveedor al 27-10-2026. El ducto de barras tiene el plazo SIN CONFIRMAR y la OC de HARG está PENDIENTE.
