CPF – LA CALERA II

FACILIDADES DESARROLLO CPF LA CALERA

INFORME DE AVANCE

ABB

INFORME Nº 6

4/11/2026

Revisión	Fecha	Realizado	Aprobado
A	4/11/2026	R. MACK	M. PUGA

SUMARIO EJECUTIVO

Este informe, detalla las acciones ejecutadas por el Contratista durante el mes de: Octubre 26.

1 Reseña

El presente informe tiene como objetivo detallar las actividades relacionadas con la provisión de los equipos de las OCs 45089944971 y 4508944973 a ser suministrados por ABB.

2 Alcance de los Trabajos

- Sala Eléctrica n° 3, compuesta de los siguientes equipos:

  -Sala eléctrica modular, con dimensiones 37.000x9.000x3.700mm (Largo x Ancho x Alto) – Con instalaciones auxiliares completas

  -Tableros 102-CCM-005/6/7

  -Variadores de velocidad de BT stand alone 102-DP-VFD-24210A/B/C

  -Ducto de barras 102-DB-005A/B , 102-DB-006A/B y 102-DB-007A/B

  -Tableros auxiliares de distribución 102-DP-001 , 102-LP-001, 102-LP-002, 102-DP-001-TRA

  -Sistema UPS/Cargador de baterías/Baterías

  -Gabinete para CCTV y CA

  -Repuestos

- Sala Eléctrica n° 4, compuesta de los siguientes equipos:

  -Sala eléctrica modular, con dimensiones 28.000x5.000x3.500mm (Largo x Ancho x Alto) – Con instalaciones auxiliares completas

  -Tableros de media tensión 102-TGMT-001/002

  -Variadores de media tensión 102-DP-VFD-23310A/B/C

  -Tablero auxiliar 102-DP-101

  -Tableros auxiliare de distribución para sistema UPS 102-DP-101UPS y 102-DP-101VCC

  -Repuestos

3 General

En el presente período, se ha conseguido a aprobación de la ingeniería de detalle de todos los equipos en las salas eléctricas logrando llegar a un hito importante.

En cuanto a certificaciones, se avanzó con la certificación parcial del hito 1 (contra emisión de ingenierías básicas de los variadores de velocidad e ingeniería básica de las salas eléctricas).

4 Situación Contractual

Pólizas de fiel cumplimiento y fondo de reparo para ambas OCs (45089944971 y 4508944973) emitidas por ABB y aprobadas por AESA.

Se ha presentado y acordado las aclaraciones solicitadas por AESA con respecto a los hitos de certificación para ambas órdenes de compra. Los documentos de compra han sido revisados de acuerdo con esto.

Se ha presentado la nota de cambio número uno (documento R-2631036 - NC1_A) el cual ha sido aprobado por AESA y por lo tanto, ABB ha avanzado en la implementación técnica. La nota de pedido por éste ítem ha sido recibido correctamente en el mes de agosto.

Se ha presentado la versión optimista del cronograma de ejecución en el cual se evidencia una mejora en los plazos contractuales de la provisión de ambas salas.

Sala Eléctrica 3: fecha contractual 14/5/2027, fecha objetivo 23/4/2027. Mejora de plazo de 21 días.

Sala Eléctrica 4: fecha contractual 8/4/2027, fecha objetivo 25/3/2027. Mejora de plazo de 14 días.

Al día de la fecha de confección del informe, se verifica un corrimiento en la fecha contractual de entrega de los ductos de barras de la sala #3, los cuales no han podido ser diseñados debido a que no se dispone de información suficiente sobre los gabinetes de los transformadores de media tensión y posiciones relativas de los mismos. Se iniciaron las tareas de diseño el día 21/9 a partir de la confirmación de la información mencionada. ABB se encuentra trabajando en la confirmación del plazo de entrega y el posible impacto económico.

AESA deberá adecuar la fecha de entrega contractual de las posiciones 120, 130 y 140 del documento de compras 45089944971, con el fin de evitar penalidades para ABB, por incumplimiento en el plazo de entrega de las posiciones mencionadas.

5 Principales Eventos Cumplidos en Octubre

➢ En el área de Ingeniería se destacan lo siguiente:

Tableros Auxiliares

➢ Ingeniería básica y de detalle emitida y aprobada en revisión numérica para fabricación.

Tableros CCMs

➢ Ingeniería básica y de detalle emitida y aprobada en revisión numérica para fabricación.

Tableros de MT

➢ Ingeniería básica y de detalle emitida y aprobada en revisión numérica para fabricación.

Sistema UPS y baterías

➢ Ingeniería básica y de detalle emitida y aprobada en revisión numérica para fabricación.

Variadores de media y baja tensión

➢ Ingeniería básica y de detalle emitida y aprobada en revisión numérica para fabricación.

Salas eléctricas

➢ Emisión de ingeniería básica. Aprobación parcial. Se observan nuevos comentarios en las sucesivas revisiones que impiden la aprobación final y emisión de ingeniería para fabricación.

- Emisión de ingeniería de detalle Aprobación parcial. Se observan nuevos comentarios en las sucesivas revisiones que impiden la aprobación final y emisión de ingeniería para fabricación.

Detalle de materiales comprados:

SHELTER SALA ELECTRICA - SALA #3		
SISTEMA HVAC - SALA ELECTRICA (TABLEROS)	**Cant.**	**N° Pedido**
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO AM-010 CSS1BPS - 30.000 FRIG/H - FRÍO/CALOR **(TRIFÁSICO)** - WESTRIC	7	87956
SITOP PSU4200 1AC 24 V/5 A fuente de alimentación estabilizada PSU4200 entrada: 120/240 V AC salida: 24 V DC/5 A - 6EP33333SB000AX0 - SIEMENS	1	Of. Siemens
S71200, CPU S71214C, 110220VAC (14DI en 24VDC, 10DO Relé, 2AI) Profinet FW4 - 6ES72141BG400XB0 - SIEMENS	1	Of. Siemens
S71200, Módulo de Entradas Digitales, SM 1221, 8DI en 24VDC - 6ES72211BF320XB0 - SIEMENS	2	Of. Siemens
S71200, Módulo de Salidas Digitales, SM 1222, 8DO Relé 220VAC (2A) - 6ES72221HF320XB0 - SIEMENS	1	Of. Siemens
MTP700 Unified Basic Panel 7.0" - 6AV21233GB320AW0 - SIEMENS	1	Of. Siemens
SISTEMA HVAC - SALA BATERÍA	**Cant.**	**N° Pedido**
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO AM-010 CSS1BPS - 30.000 FRIG/H - FRÍO/CALOR **(TRIFÁSICO)** - WESTRIC	2	87956
EXTRACTOR CON MOTOR ANTIEXPLOSIVO - LPP 500/30.00-U - CIARRAPICO AEROTÉCNICA	2	88098
SISTEMA DE PRESURIZACIÓN	**Cant.**	**N° Pedido**
PRESURIZADOR RA330 TRIFÁSICO 3HP 1420 RPM SASE DM4 H270 - GATTI	5	88087
FILTRO METÁLICO LAVABLE 25x25x2"	5	88084
PREFILTRO DESECHABLE MARK 80-2 25x25x2"	5	88084
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO - SALA TABLEROS	**Cant.**	**N° Pedido**
CENTRAL DE INCENDIO - NFS-320E-SP-NOTIFIER	1	86096
BATERÍA DE GEL DE LIBRE MANTENIMIENTO DE 12V / 17A - BAT 12/17	2	86096
DETECTOR ÓPTICO DE HUMO DIRECCIONABLE Y ANALÓGICO DE BAJO PERFIL - FSP-951 – NOTIFIER	12	86096
BASE UNIVERSAL P/DETECTORES DIRECCIONABLES Y ANALÓGICOS DE BAJO PERFIL - B501-WHITE – NOTIFIER	12	86096
AVISADOR MANUAL DE DOBLE ACCIÓN C/REGISTRO DE OPERACIÓN - NBG-12LSP - NOTIFIER (IP-44 INTERIOR)	6	86096
MINI MÓDULO DIRECCIONABLE PARA MONITOREO DE AVISADOR MANUAL - FMM-101 – NOTIFIER	6	86096
SIRENA CON LUX ESTROBOSCÓPICA 12/24 VOLTS - 2HILOS ROJA - MONTAJE A PARED - INTEMPERIE - P2GRKLED – NOTIFIER	2	86096
SIRENA CON LUX ESTROBOSCÓPICA 12/24 VOLTS - 2HILOS ROJA - MONTAJE A PARED - INTERIOR - P2RLED-SP – NOTIFIER	1	86096
MÓDULO DIRECCIONABLE PARA COMANDO MEDIANTE CONTACTO SECO - FRM-1 – NOTIFIER	5	86096
INTERFASE INTELIGENTE SALIDA PROTOCOLO MODBUS PARA INTEGRACIÓN CON CLSS - MODBUS-CGW – NOTIFIER	1	86096
PUERTA DE ENLACE CLSS - CON CARCASA - HON-CGW-MBB - NOTIFIER	1	86096
KIT DE PUERTA DE ENLACE CLSS - 50160636-001 - NOTIFIER	1	86096
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO - SALA BATERÍA	**Cant.**	**N° Pedido**
DETECTOR ÓPTICO DE HUMO DIRECCIONABLE Y ANALÓGICO DE BAJO PERFIL - FSP-951 – NOTIFIER	3	86096
BASE UNIVERSAL P/DETECTORES DIRECCIONABLES Y ANALÓGICOS DE BAJO PERFIL - B501-WHITE – NOTIFIER	3	86096
AVISADOR MANUAL DE DOBLE ACCIÓN C/REGISTRO DE OPERACIÓN - NBG-12LSP - NOTIFIER (IP-44 INTERIOR)	2	86096
MINI MÓDULO DIRECCIONABLE PARA MONITOREO DE AVISADOR MANUAL - FMM-101 – NOTIFIER	2	86096
SIRENA CON LUX ESTROBOSCÓPICA 12/24 VOLTS - 2HILOS ROJA - MONTAJE A PARED - INTERIOR - P2RLED-SP – NOTIFIER	1	86096
ESTRUCTURA		88086
ESTRUCTURA - SECCIÓN N° 1 - 14.000x3.500x3.700mm (Largo x Ancho x Alto)	1	88086
ESTRUCTURA - SECCIÓN N° 2 - 14.200x3.500x3.700mm (Largo x Ancho x Alto)	1	88086
ESTRUCTURA - SECCIÓN N° 3 - 8.800x3.500x3.700mm (Largo x Ancho x Alto)	1	88086
ESTRUCTURA - SECCIÓN N° 4 - 14.000x2.500x3.700mm (Largo x Ancho x Alto)	1	88086
ESTRUCTURA - SECCIÓN N° 5 - 14.200x2.500x3.700mm (Largo x Ancho x Alto)	1	88086
ESTRUCTURA - SECCIÓN N° 6 - 8.800x2.500x3.700mm (Largo x Ancho x Alto)	1	88086
ESTRUCTURA - SECCIÓN N° 7 - 10.500x3.000x3.700mm (Largo x Ancho x Alto)	1	88086

Ductos de barras

- Diseño 3D avanzado. Se avanza con la definición de detalles de tramos y soportes y piezas de acople para diseño final. Se espera confirmación/aprobación de diseño por parte de AESA con respecto a la conexión con los transformadores a ser provistos por Miron.

➢ En el área de Suministros se destacan los siguientes:

Detalles de OC emitidas a subproveedores

Documento de Compra	Descripción	Fecha de Emisión	Proveedor	Origen	Fecha de entrega en origen
4500407392	Salas eléctricas 3 y 4	18/5/2026	Bottino	Argentina	14/5/27 y 8/4/27
4500407396	Tableros Auxiliares	18/5/2026	Mehcco	Argentina	28/1/2027
4500407468	Sistema UPS y Baterías	19/5/2026	KMT	Argentina	27/11/2026
4700201354	Ductos de barras	16/5/2026	EAE	Turquía	tbd
4700201355	Tableros de Media tensión	16/5/2026	BRABB	Brasil	27/11/2026
4700201478	Tableros CCMs	19/5/2026	BRABB	Brasil	25/1/2027
4700201819	Variadores de baja tensión	26/5/2026	FIABB	Finlandia	6/11/2026
4700201626	Variadores de Media Tensión	22/5/2026	CNABB	China	6/11/2026

Tableros auxiliares

- Acopio de equipamiento mecánico y eléctrico – 100%











Sistema UPS y baterias

- Acopio de equipamiento mecánico y eléctrico

  BREAKERS – 100%

  FUSIBLES – 100%

  VENTILADORES – 100%

  TI: 100%

  PLACAS ELECTRONICAS – 100%

  SEMICONDUCTORES – 100%

  GABINETES Y RACKS – 90%

















K00900-2


K00900-1

ABB
2CDS252001R0204P
QTY 6
S 202 - C 20

ABB


K00900-1
DROPPER

Infineon
ABB

22X4H
SS-A1-VU

1SDA065656R1
ABB




- **En el área de Calidad/Inspección se destacan los siguientes:**
  - Emisión de documentación de Calidad

CODIFICACIÓN AESA	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	CALIFICACIÓN
5155-00-0009-VE-CA-PR-001	Procedimiento de END's	APR
5155-00-0009-VE-CA-WP-001	Procedimientos de soldadura (WPS, WPQ, PQR)	APR
5155-00-0009-VE-CA-PR-002	Procedimiento de pintura + Ficha técnica de productos aplicados.	APR
5155-00-0009-VE-CA-IN-001	SALA ELÉCTRICA N° 3 - PROTOCOLOS FAT	APR
5155-00-0009-VE-CA-PE-001	PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS (ITP/PIE) - SALA ELÉCTRICA N°3	APR
5155-00-0009-VE-CA-WP-003	Welding MAP SE#3 Estructura de Shelter	ACO
5155-00-0009-VE-CA-IN-002	SALA ELÉCTRICA N° 4 - PROTOCOLOS FAT	APR
5155-00-0009-VE-CA-WP-002	Welding MAP SE#4 Estructura de Shelter	ACO
5155-00-0009-VE-CA-PE-002	PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS (ITP/PIE) - TABLEROS CCM	APR
5155-00-0009-VE-CA-PR-003	PROCEDIMIENTO DE FAT - TABLEROS CCM	APR
5155-00-0009-VE-CA-IN-003	102-CCM-005 - CCM 380/220V - PROTOCOLOS FAT	APR
5155-00-0009-VE-CA-IN-004	102-CCM-006 - CCM 380/220V - PROTOCOLOS FAT	APR
5155-00-0009-VE-CA-IN-005	102-CCM-007 - CCM 380/220V - PROTOCOLOS FAT	APR
5155-00-0009-VE-CA-PE-003	PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS (ITP/PIE) - TABLEROS TGMT	APR
5155-00-0009-VE-CA-PR-004	PROCEDIMIENTO DE FAT - TABLEROS TGMT	APR
5155-00-0009-VE-CA-IN-006	102-TGMT-001 - SWG MT 13,2kV - PROTOCOLOS FAT	APR
5155-00-0009-VE-CA-IN-007	102-TGMT-002 - SWG MT 6,6kV - PROTOCOLOS FAT	APR
5155-00-0009-VE-CA-IN-008	102-DP-101VCC - TAB DISTRIB PARA SISTEMA CORRIENTE CONTINUA - PROTOCOLOS FAT	APR
5155-00-0009-VE-CA-IN-009	102-DP-101UPS - TAB DISTRIB PARA SISTEMA UPS - PROTOCOLOS FAT	APR
5155-00-0009-VE-CA-PE-004	PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS (ITP/PIE) - SISTEMA CC	APR
5155-00-0009-VE-CA-PR-006	PROCEDIMIENTO DE FAT - SISTEMA CC	APR
5155-00-0009-VE-CA-IN-010	102-VCC-001A/B - SISTEMA DE CC - PROTOCOLOS FAT	APR
5155-00-0009-VE-CA-PE-005	PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS (ITP/PIE) - SISTEMA UPS	APR
5155-00-0009-VE-CA-PR-007	PROCEDIMIENTO DE FAT - SISTEMA UPS	APR
5155-00-0009-VE-CA-IN-011	102-UPS-001A/B - SISTEMA DE UPS - PROTOCOLOS FAT	APR
5155-00-0009-VE-CA-PE-006	PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS (ITP/PIE) - TABLEROS ELÉCTRICOS DE SERVICIOS AUXILIARES	APR
5155-00-0009-VE-CA-PR-008	PROCEDIMIENTO DE FAT - TABLEROS ELÉCTRICOS DE SERVICIOS AUXILIARES	APR
5155-00-0009-VE-CA-IN-012	102-DP-001-TRA - TAB DISTRIBUCIÓN DE TRACING - PROTOCOLOS FAT	APR
5155-00-0009-VE-CA-IN-013	102-LP-001 - TAB DISTRIBUCIÓN SERV AUX S#3 - PROTOCOLOS FAT	APR
5155-00-0009-VE-CA-IN-014	102-LP-002 - TAB DISTRIB PARA SISTEMA UPS - PROTOCOLOS FAT	APR
5155-00-0009-VE-CA-IN-015	102-DP-001 - TAB DE SERVICIOS AUXILIARES SE#3 - PROTOCOLOS FAT	APR
5155-00-0009-VE-CA-IN-016	102-DP-101 - TAB DE SERVICIOS AUXILIARES SE#4 - PROTOCOLOS FAT	APR
5155-00-0009-VE-CA-PE-007	PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS (ITP/PIE) - SALA ELÉCTRICA N°4	ACO

- Previsión de fechas FAT de los distintos equipos

COMENTARIOS	ORIGEN	FECHA INICIO FAT	FECHA FIN FAT	Lugar de FAT	ESTADO
Sistema UPS y baterías	Argentina	18/11/2026	20/11/2026	Santa Fe - Argentina	Invitación enviada
Tableros TGMT	Brasil	30/11/2026	4/12/2026	Sorocaba - Brasil	Invitación enviada
Tableros CCMs	Brasil	30/11/2026	12/12/2026	Sorocaba - Brasil	Invitación enviada
Tableros auxiliares	Argentina	14/12/2026	16/12/2026	AMBA - Buenos Aires	
Sala eléctrica #4	Argentina	22/2/2027	26/2/2027	Mendoza - Argentina	
Sala eléctrica #3	Argentina	29/3/2027	2/4/2027	Mendoza - Argentina	

- **En el área de Fabricación se destacan los siguientes:**
  - Variadores de Media Tensión: inicio y finalización de fabricación y ensayos





- Tableros CCMs: inicio de fabricación de columnas y módulos extraíbles

Módulos extraíbles







Columnas














- Tableros de Media tensión: inicio de fabricación de gabinetes de comando



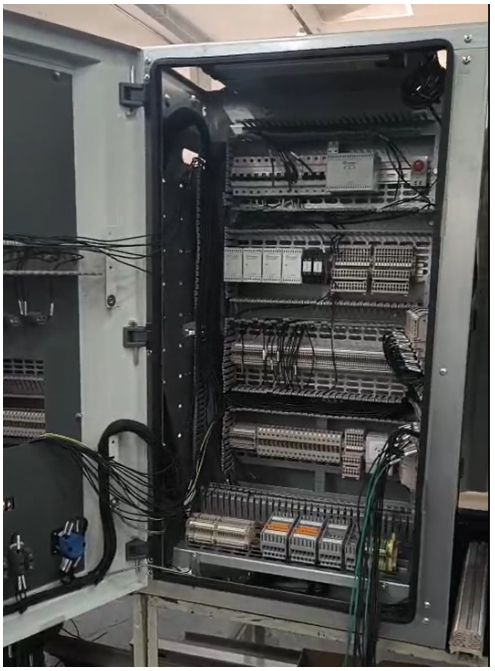






- Sistema UPS y baterías



- Sala eléctrica 4



SECCIÓN A

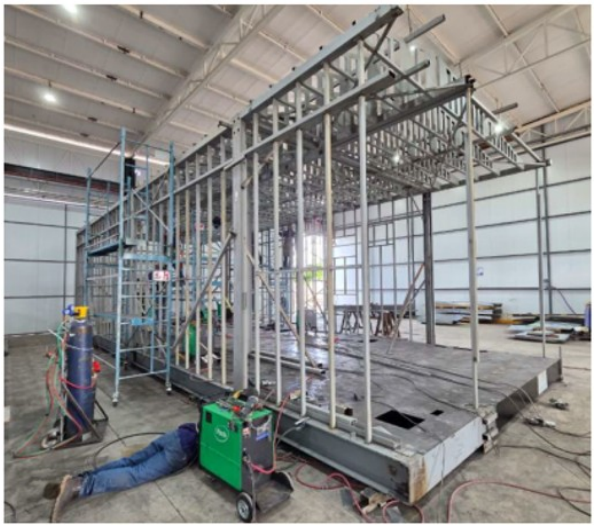

SECCIÓN B



SECCIÓN C



SECCIÓN D

6 Principales Eventos a ser Cumplidos en el mes de Noviembre

- **En el área de Temas Generales de la Ejecución del Proyecto:**
  - Emisión de certificación parcial correspondiente al hito 2 por aprobación de ingeniería básica de salas eléctricas.
  - Emisión de certificación correspondiente al hito 4 por acopio de materiales correspondiente a los Tableros Auxiliares.

- **En el área de Calidad/Inspección:**
  - Inspección a proveedor de salas eléctricas para verificación de avance de fabricación.
  - Inspección a proveedor de tableros auxiliares para verificación de acopio de materiales.
  - Sistema UPS y baterías: inicio y finalización de ensayos FAT.
  - Tableros CCMs: inicio de ensayos FAT.
  - Tableros de media tensión: inicio de ensayos FAT.

- **En el área de Fabricación:**
  - Finalización de fabricación de tableros CCMs.
  - Finalización de fabricación de los tableros de Media Tensión.
  - Inicio de fabricación de tableros auxiliares.

7 Avances

- El avance resultante de las actividades ejecutadas es el que muestra los siguientes cuadros:

Tableros CCMs MNS III 102-CCM-005/6/7		**MES PREVIO** **sept-26**	**AVANCE MENSUAL** **oct-26**	**MES PRÓXIMO** **nov-26**
Especialidad	Peso por Especialidad	Actual	Previsto	Previsto
Ingeniería	19%	100%	100%	100%
Compra de Materiales	4%	100%	100%	100%
Recepción de materiales	53%	85%	85%	100%
Fabricación	9%	0%	5%	95%
Tests/Inspección	5%	0%	0%	0%
Despacho	10%	0%	0%	0%
TOTAL GLOBAL	**100%**	**0%**	**69%**	**85%**

Tableros de media tensión UNIGEAR 102-TGMT-001/2		**MES PREVIO** **sept-26**	**AVANCE MENSUAL** **oct-26**	**MES PRÓXIMO** **nov-26**
Especialidad	Peso por Especialidad	Actual	Previsto	Previsto
Ingeniería	20%	100%	100%	100%
Compra de Materiales	10%	98%	100%	100%
Recepción de materiales	12%	40%	80%	100%
Fabricación	20%	0%	25%	100%

Tests/Inspección	4%	0%	0%	0%
Despacho	1%	0%	0%	0%
TOTAL GLOBAL	**67%**	**0%**	**45%**	**62%**

Tableros Auxiliares de distribución 102-DP-001 , 102-LP-001, 102-LP-002, 102-DP-001-TRA		**MES PREVIO**	**AVANCE MENSUAL**	**MES PRÓXIMO**
		sept-26	**oct-26**	**nov-26**
Especialidad	Peso por Especialidad	Actual	Previsto	Previsto
Ingeniería	20%	100%	100%	100%
Compra de Materiales	10%	100%	100%	100%
Recepción de materiales	45%	80%	100%	100%
Fabricación	20%	0%	0%	80%
Tests/Inspección	4%	0%	0%	0%
Despacho	1%	0%	0%	0%
TOTAL GLOBAL	**100%**	**0%**	**75%**	**91%**

Ductos de barras 102-DB-0005A/B - 102-DB-0006A/B - 102-DB-0007A/B		**MES PREVIO**	**AVANCE MENSUAL**	**MES PRÓXIMO**
		sept-26	**oct-26**	**nov-26**
Especialidad	Peso por Especialidad	Actual	Previsto	Previsto
Ingeniería	30%	15%	50%	100%
Fabricación	35%	0%	0%	0%
Transporte Marítimo	34%	0%	0%	0%
Despacho	1%	0%	0%	0%
TOTAL GLOBAL	**100%**	**0%**	**15%**	**30%**

Variadores de Velocidad de BT 102-DP-VFD-24210A/B/C		**MES PREVIO**	**AVANCE MENSUAL**	**MES PRÓXIMO**
		sept-26	**oct-26**	**nov-26**
Especialidad	Peso por Especialidad	Actual	Previsto	Previsto
Ingeniería	10%	100%	100%	100%
Acopio y Fabricación	58%	100%	100%	100%
Transporte Marítimo	30%	0%	10%	100%
Despacho	2%	0%	0%	0%
TOTAL GLOBAL	**100%**	**0%**	**71%**	**98%**

Variadores de Velocidad de MT 102-DP-VFD-23310A/B/C		**MES PREVIO**	**AVANCE MENSUAL**	**MES PRÓXIMO**
		sept-26	**oct-26**	**nov-26**
Especialidad	Peso por Especialidad	Actual	Previsto	Previsto
Ingeniería	10%	100%	100%	100%
Acopio y Fabricación	58%	20%	100%	100%
Transporte Marítimo	30%	0%	10%	80%
Despacho	2%	0%	0%	0%
TOTAL GLOBAL	**100%**	**0%**	**71%**	**92%**

Sistema UPS y baterías		MES PREVIO	AVANCE MENSUAL	MES PRÓXIMO
		sept-26	oct-26	nov-26
Especialidad	Peso por Especialidad	Actual	Previsto	Previsto
Ingeniería	20%	100%	100%	100%
Colocación de Sub Ordenes	5%	100%	100%	100%
Recepción de Materiales	30%	80%	95%	100%
Fabricación	30%	0%	0%	100%
Tests/Inspección	5%	0%	0%	100%
Despacho	10%	0%	0%	0%
TOTAL GLOBAL	**100%**	**0%**	**54%**	**90%**

Sala eléctrica 3		MES PREVIO	AVANCE MENSUAL	MES PRÓXIMO
		sept-26	oct-26	nov-26
Especialidad	Peso por Especialidad	Actual	Previsto	Previsto
Ingeniería	20%	80%	100%	100%
Colocación de Sub Ordenes	5%	100%	100%	100%
Recepción de Materiales	30%	18%	30%	40%
Fabricación	30%	0%	0%	0%
Tests/Inspección	5%	0%	0%	0%
Despacho	10%	0%	0%	0%
TOTAL GLOBAL	**100%**	**0%**	**34%**	**37%**

Sala eléctrica 4		MES PREVIO	AVANCE MENSUAL	MES PRÓXIMO
		sept-26	oct-26	nov-26
Especialidad	Peso por Especialidad	Actual	Previsto	Previsto
Ingeniería	20%	100%	100%	100%
Colocación de Sub Ordenes	5%	100%	100%	100%
Recepción de Materiales	30%	18%	50%	60%
Fabricación	30%	0%	30%	40%
Tests/Inspección	5%	0%	0%	0%
Despacho	10%	0%	0%	0%
TOTAL GLOBAL	**100%**	**0%**	**49%**	**55%**

8 Factores potenciales de Retraso en el Proyecto

Cambios de alcance, indefiniciones y otros factores no detectados al momento de redacción del informe.

Verificar lo indicado en el inciso 4 del presente informe con respecto a los ductos de barras.

Se requiere avanzar con la aprobación de los documentos de ingeniería correspondientes a las salas eléctricas y evitar la generación de nuevos comentarios sobre documentos ya emitidos para fabricación.

9 Principales tareas adicionales del Proyecto detectadas a la fecha

Se han modificado los listados de cargas en los tableros 102-CCM-006 y 102-CCM-007 por la cual se ha emitido y aprobado una nota de cambio durante el mes de Julio.

10 Temas Pendientes Prioritarios

-Listado de pendientes a resolver:

- Control de acceso. Suministro de equipos físicos de acuerdo con cronograma de cada sala – Resp. AESA
- Definición de conexiones del ducto de barras con los transformadores de media tensión
- Aprobación de ingeniería constructiva de las salas

11 Detalle de estado de facturación y cobranzas

OC 45089944971	FACTURACIÓN		COBRANZA	
PROYECTO	Fecha Presentación Factura	USD (monto+imp)	Fecha de Pago Factura	Fecha Real de Cobro
Certificación nº 1	8/7/2026	143.589	7/8/2026	Pagado
Certificación nº 2	24/7/2026	143.589	24/8/2026	Pagado
Certificación nº 3	23/9/2026	29.343	23/10/2026	Pagado
Certificación nº 4	28/9/2026	376.804	28/10/2026	
Certificación nº 5	28/10/2026	1.191.654,46	28/11/2026	
TOTAL		**1.884.979,46**		

OC 45089944973	FACTURACIÓN		COBRANZA	
PROYECTO	Fecha Presentación Factura	USD (monto+imp)	Fecha de Pago Factura	Fecha Real de Cobro
Certificación nº 1	8/7/2026	170.739,00	7/8/2026	Pagado
Certificación nº 2	24/7/2026	170.739,00	24/8/2026	Pagado
Certificación nº 3	23/9/2026	29.343,00	23/10/2026	Pagado
Certificación nº 4	28/9/2026	48.031,00	28/10/2026	
Certificación nº 5	28/10/2026	566.080,57	28/11/2026	
TOTAL		**984.932,57**		

Rodrigo Mack

Digitally signed by Rodrigo Mack
DN: cn=Rodrigo Mack, c=CH, o=ABB Asea Brown Boveri Ltd, ou=Intune Enrollment Policy
Date: 2026.11.04 09:48:39 -03'00'

Firma

Responsable del Proyecto
