


Flujo OPTIMIZADO de Ejecución — EL + IN

CPF2 La Calera II · cables progresivos · 6 d/sem · doble turno en salas/Sala INS · solapamiento precom-comis · RFSU optim. 31-MAR-28

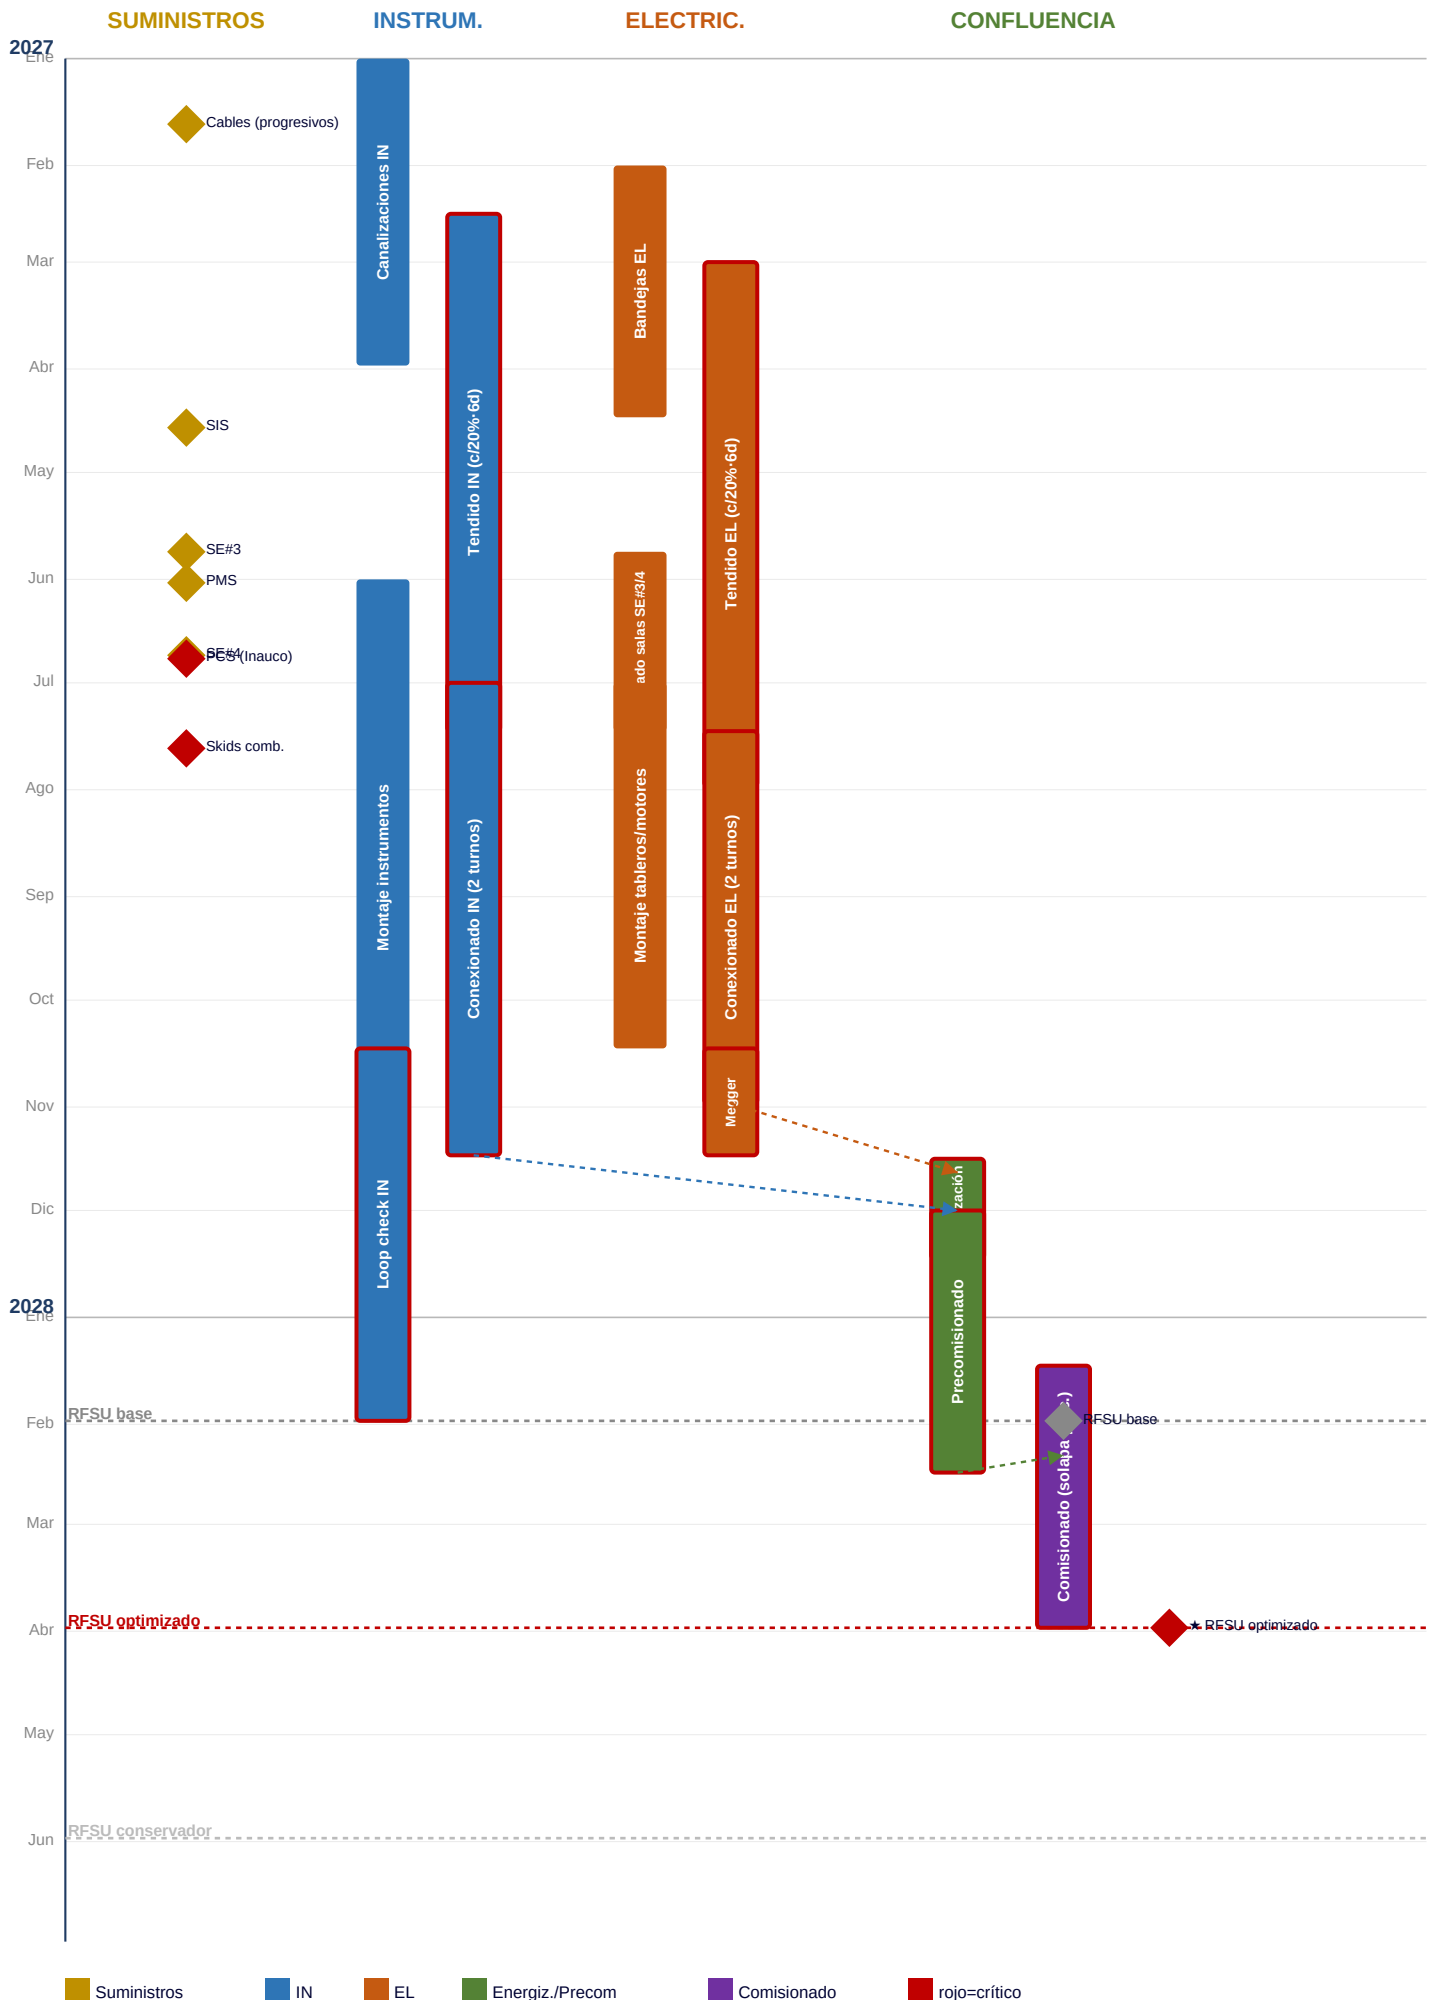

Palancas: cables progresivos · 6 d/sem · doble turno en conexionado de salas y Sala INS · solapamiento parcial precom-comisionado.

RFSU optimizado ≈ 31-MAR-28 (recupera ~2 meses vs conservador 31-MAY). Piso duro: PCS 24-jun y skids 20-jul-27. Preliminar para análisis.
