


FLUJO INTEGRADO DE PROVISIONES — CPF-2 La Calera II

Convergencia de PCS (Inauco), PSS/SIS (HIMA), Salas y PMS (ABB) hacia iFAT → Comisionado → RFSU

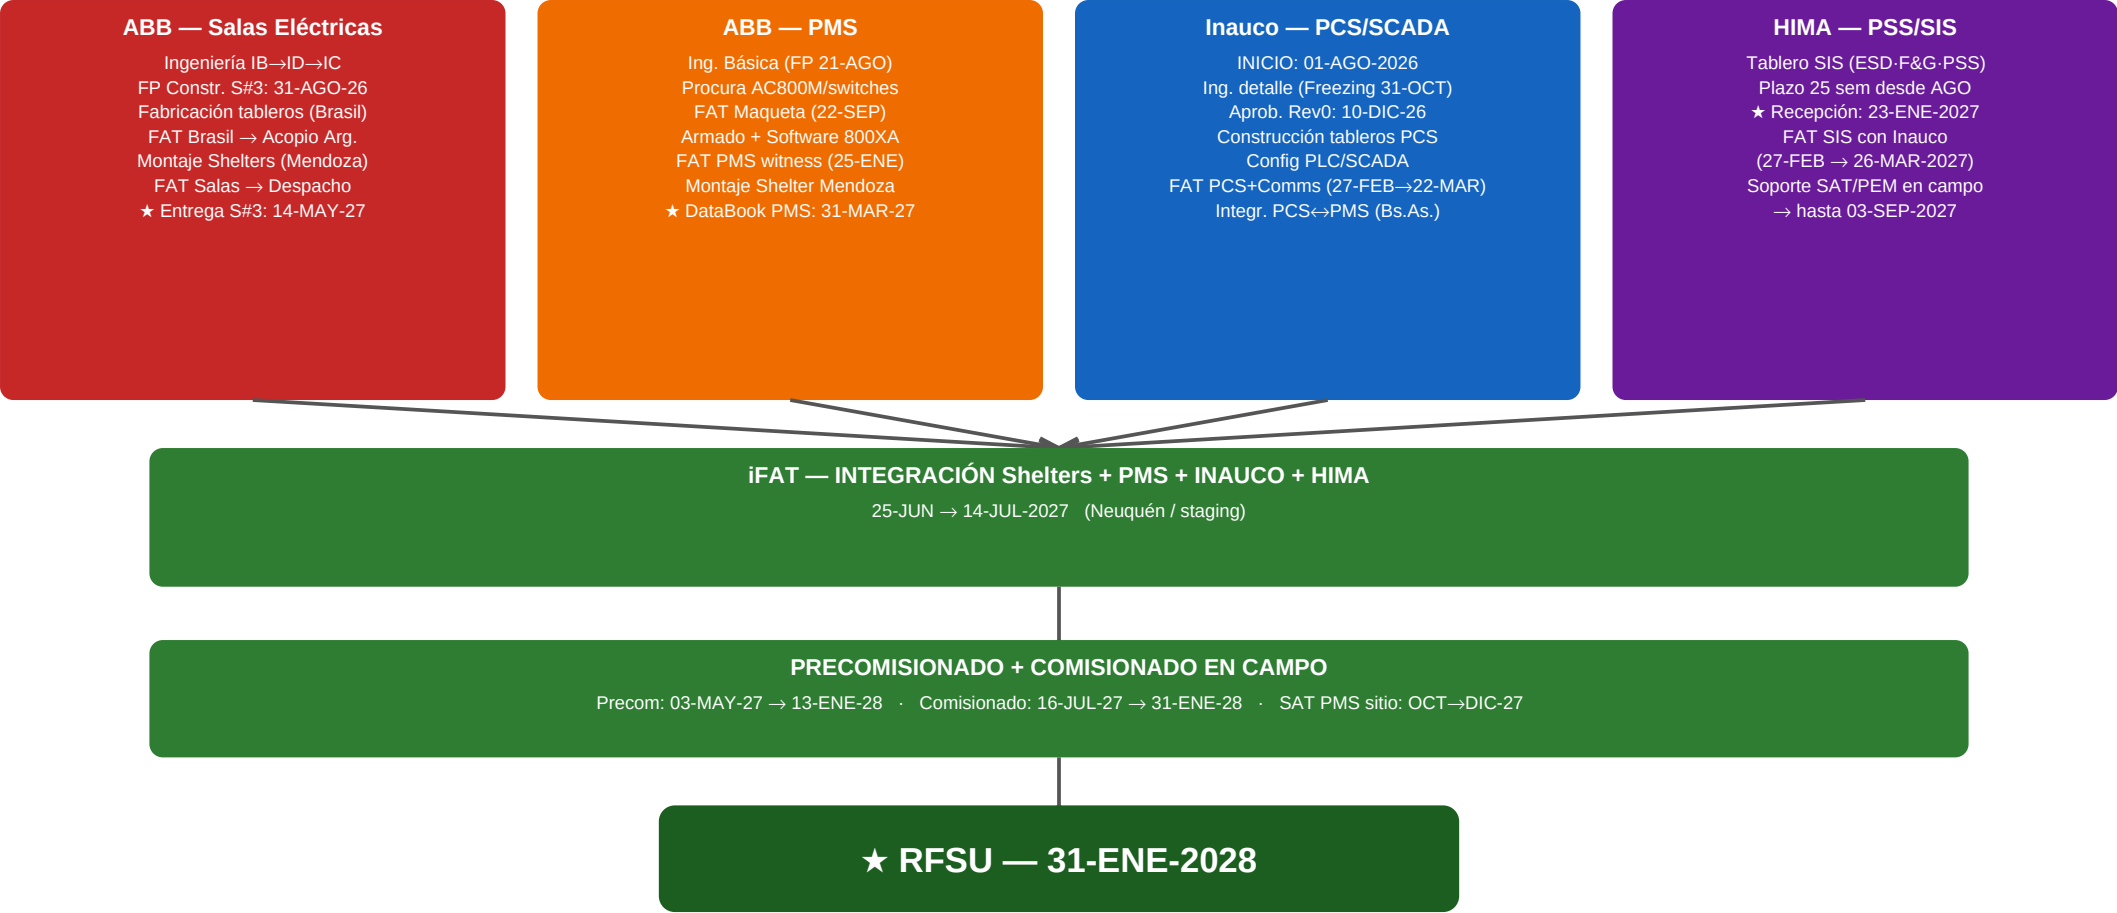

Ruta que gobierna la integración: Tablero HIMA (23-ENE) → FAT SIS (MAR) y Entrega Sala S#3 (14-MAY) → iFAT (JUL) → Comisionado → RFSU.

Cambios respecto de la hipótesis previa: Inauco arranca 01-AGO (no 01-JUL) y el tablero HIMA corre 25 semanas desde agosto; los cronogramas ABB son la Rev4 optimizada.
