


FLUJO INTEGRADO DE PROVISIONES — CPF-2 La Calera II · Rev2 · 2026-08-06

Convergencia de PCS (Inauco), PSS/SIS (HIMA), Salas y PMS (ABB) hacia iFAT → Comisionado → RFSU

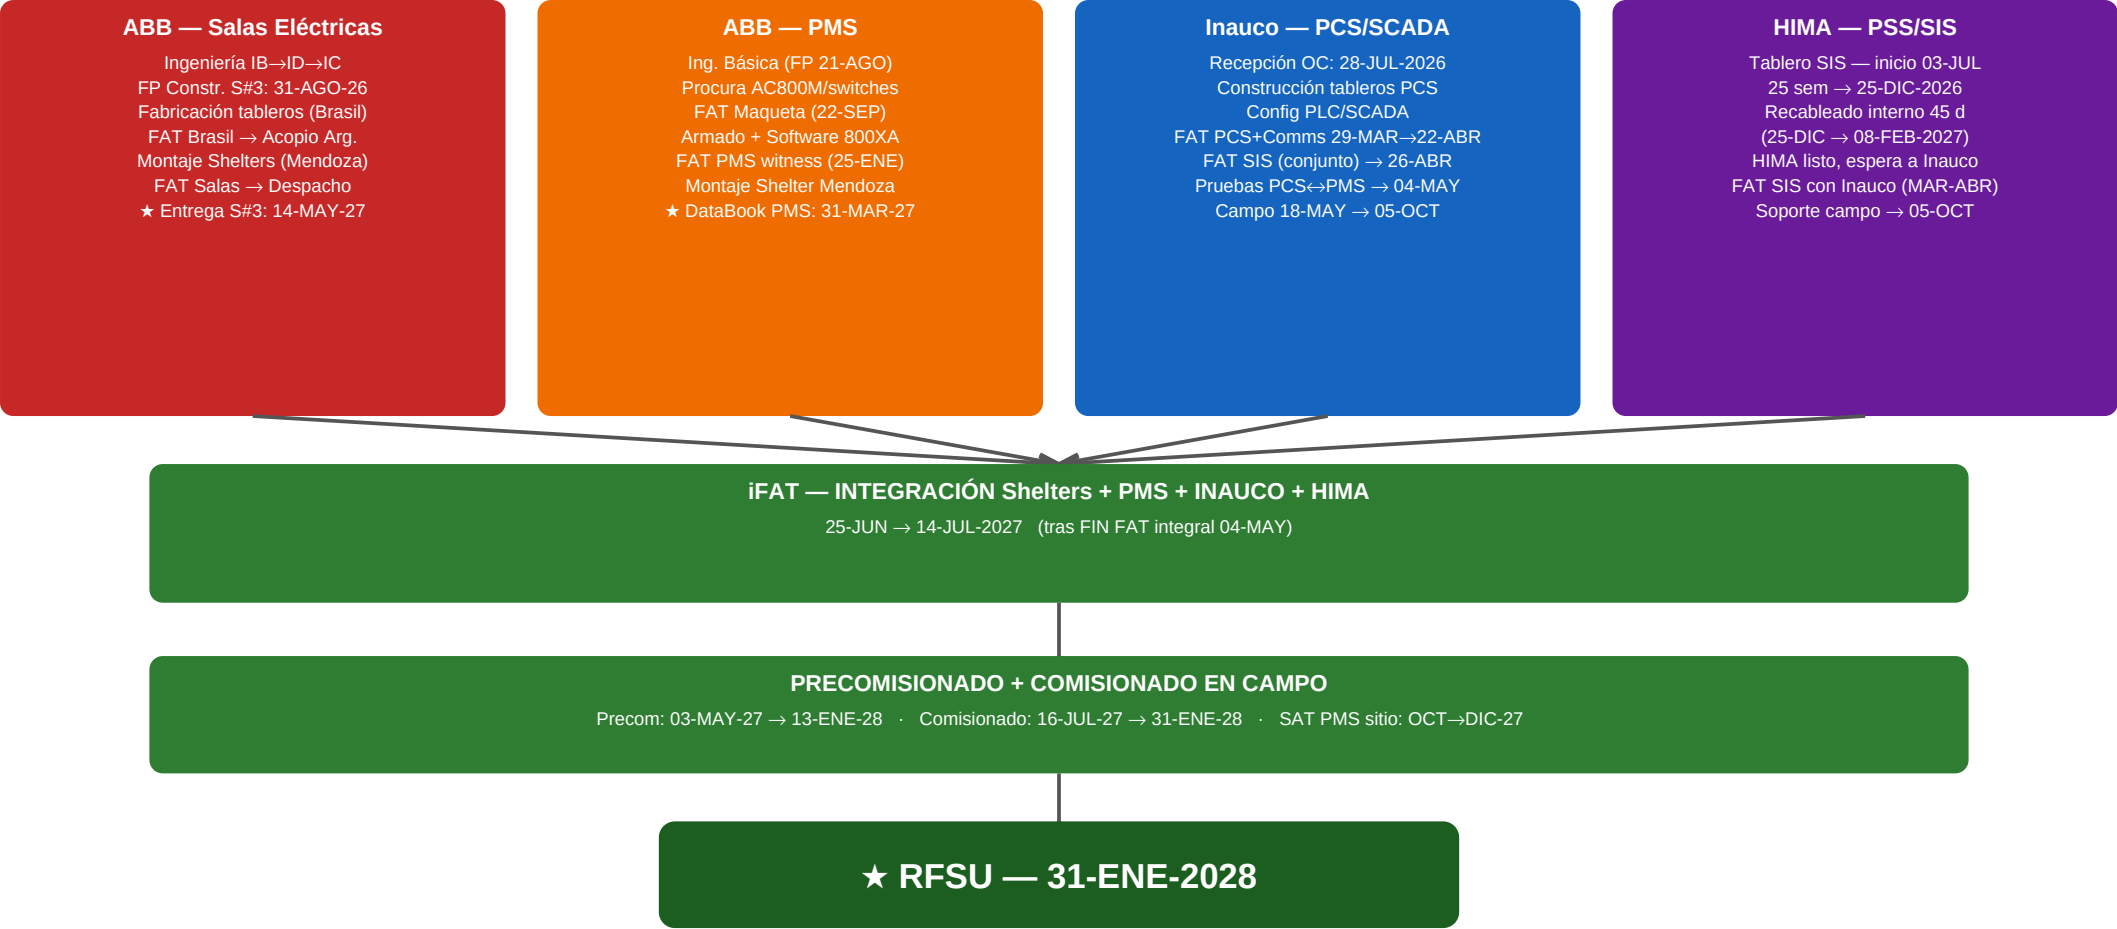

Ruta que gobierna la integración: FAT SIS/FIN FAT integral (04-MAY) y Entrega S#3 (14-MAY) → iFAT (JUL) → Comisionado → RFSU.  
Premisas: Inauco cronograma oficial 06-08-2026; HIMA inicio 03-JUL + 25 sem (tablero 25-DIC) + 45 d recableado; HIMA queda holgado y la FAT SIS pasa a gobernarla Inauco; PCS↔PMS dentro del período FAT (no crítico).
