


# FLUJO INTEGRADO DE PROVISIONES — CPF-2 La Calera II

Convergencia de PCS (Inauco), PSS/SIS (HIMA), Salas y PMS (ABB) hacia iFAT → Comisionado → RFSU

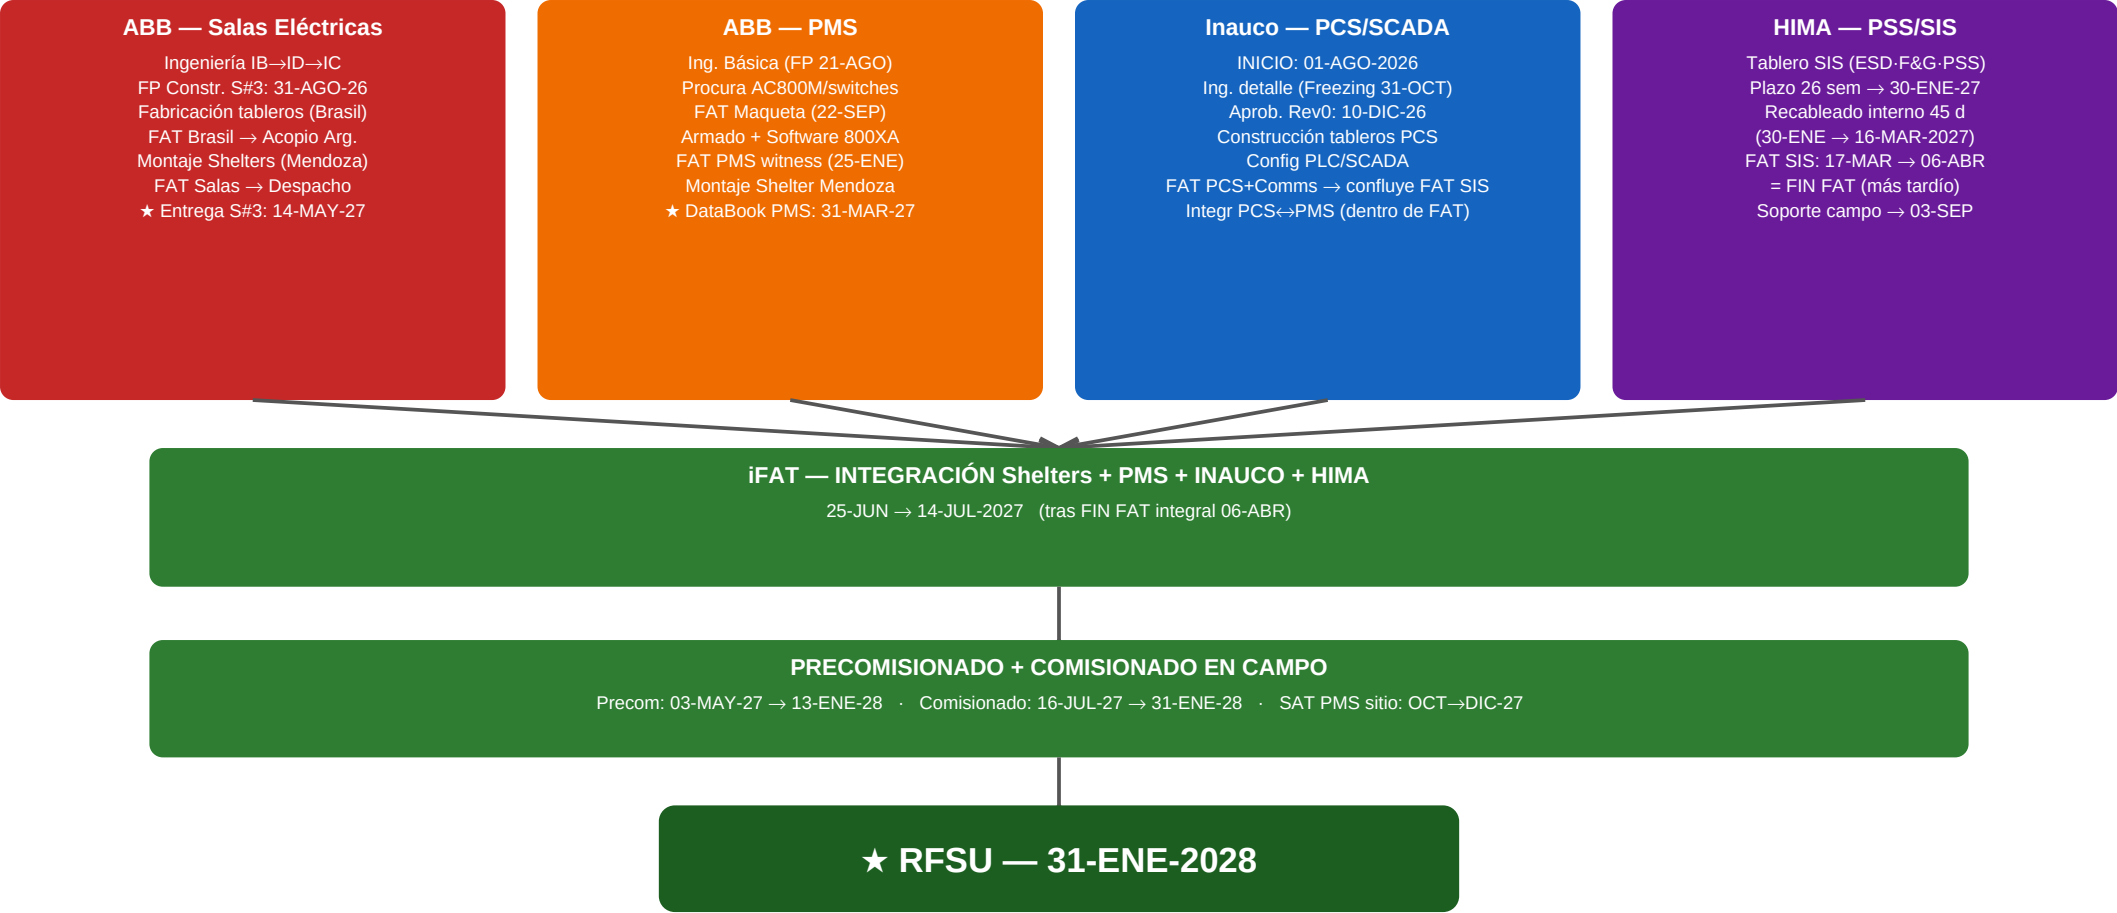

Ruta que gobierna la integración: Tablero HIMA (30-ENE) → Recableado 45 d (16-MAR) → FAT SIS / FIN FAT integral (06-ABR) y Entrega S#3 (14-MAY) → iFAT (JUL) → Comisionado → RFSU.  
Premisas: Inauco 01-AGO; tablero HIMA 26 sem; +45 d de recableado interno habilitan la FAT SIS; el FAT integral cierra con el sistema más tardío; la integración PCS↔PMS ocurre dentro del período FAT (no crítico).
